


RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		dez/22	
Unidade Beneficiada:	TIMBÓ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2018	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	573	Prazo de execução com prorrog.:	22/12/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	R\$13.011.133,16
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.130.214,49	Valor liberado de acréscimos:	R\$396.289,21
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.104.720,22	Valor descontado (supressões):	R\$1.104.720,22
% de aditivos de acréscimo:	6,56%	% de aditivos de supressão:	6,41%
Valor total final da obra:	R\$17.253.917,55	Valores totais liberados:	R\$12.302.702,15
Valores à liberar:	R\$4.951.215,40	% Executado (sobre o valor final):	71,30%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:

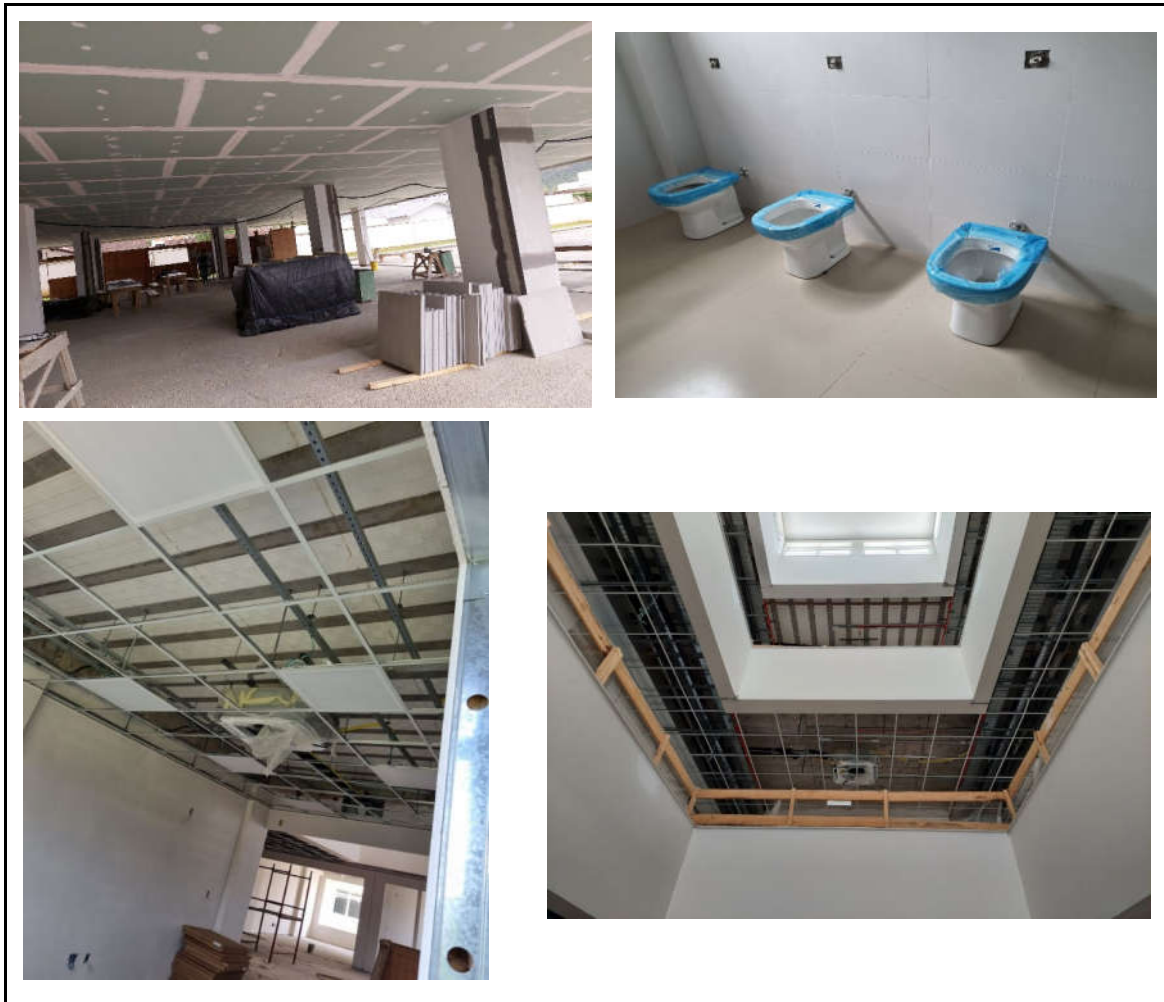

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	dez/22
--	---------------

Unidade Beneficiada:	LAGES	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	020/2020	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	08/09/2020	Empresa Responsável:	Salver Const. Incorp.
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	02/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	305	Prazo de execução com prorrog.:	03/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.213.805,64	Valor liberado do CFF:	R\$2.915.194,59
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$787.493,15	Valor liberado de acréscimos:	R\$451.897,31
Valor de aditivos de supressões:	R\$114.772,86	Valor descontado (supressões):	R\$114.481,94
% de aditivos de acréscimo:	24,50%	% de aditivos de supressão:	3,57%
Valor total final da obra:	R\$3.886.525,93	Valores totais liberados:	R\$3.252.609,96
Valores à liberar:	R\$633.915,97	% Executado (sobre o valor final):	83,69%
Área construída:	5.162,21 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		dez/22	
Unidade Beneficiada:	JOINVILLE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	006/2020	Reforma parcial (cobertura, brises, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	14/10/2020	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	420	Prazo de execução original:	08/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	316	Prazo de execução com prorrog.:	20/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$1.646.374,66	Valor liberado do CFF:	R\$1.637.140,12
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$221.286,10	Valor liberado de acréscimos:	R\$205.991,35
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	13,44%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.867.660,76	Valores totais liberados:	R\$1.843.131,47
Valores à liberar:	R\$24.529,29	% Executado (sobre o valor final):	98,69%
Área construída:	9.422,75 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	dez/22
--	---------------

Unidade Beneficiada:	HERVAL D'OESTE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	60/2021	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	08/07/2021	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	28/06/2023
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	26/09/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$11.465.196,19	Valor liberado do CFF:	R\$3.684.420,73
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$128.662,14	Valor liberado de acréscimos:	R\$128.662,14
Valor de aditivos de supressões:	R\$2.825,33	Valor descontado (supressões):	R\$2.825,53
% de aditivos de acréscimo:	1,12%	% de aditivos de supressão:	0,02%
Valor total final da obra:	R\$11.591.033,00	Valores totais liberados:	R\$3.810.257,34
Valores à liberar:	R\$7.780.775,66	% Executado (sobre o valor final):	32,87%
Área construída:	3390,81 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	dez/22
--	---------------

Unidade Beneficiada:	B. CAMBORIÚ - Vara Família	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	23/2021	Reforma Global	
Data da Ordem de Serviço:	03/09/2021	Empresa Responsável:	3D Const. Comércio Ltda
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	29/08/2022
Prorrogação de prazo (dias):	182	Prazo de execução com prorrog.:	27/02/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$4.874.210,15	Valor liberado do CFF:	R\$1.473.925,64
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$244.020,37	Valor liberado de acréscimos:	R\$179.904,29
Valor de aditivos de supressões:	R\$94.638,88	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	5,01%	% de aditivos de supressão:	1,94%
Valor total final da obra:	R\$5.023.591,64	Valores totais liberados:	R\$1.653.829,93
Valores à liberar:	R\$3.369.761,71	% Executado (sobre o valor final):	32,92%
Área construída:	1.702,64 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:

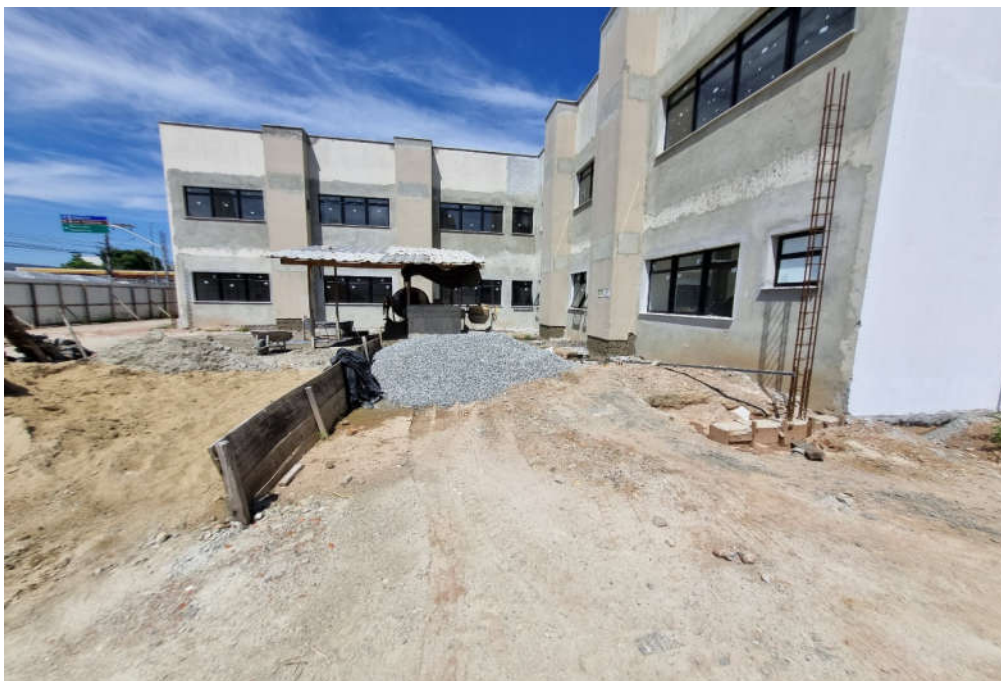

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	dez/22
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CAMPO ERÊ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	77/2021	Reforma Global e Ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	23/09/2021	Empresa Responsável:	Constr. Faon Ltda
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	17/12/2022
Prorrogação de prazo (dias):	44	Prazo de execução com prorrog.:	30/01/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$3.218.369,52	Valor liberado do CFF:	R\$584.636,13
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$48.229,25	Valor liberado de acréscimos:	R\$23.930,58
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	1,50%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$3.266.598,77	Valores totais liberados:	R\$608.566,71
Valores à liberar:	R\$2.658.032,06	% Executado (sobre o valor final):	18,63%
Área construída:	763,42 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		dez/22	
Unidade Beneficiada:	IMBITUBA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	002/2022	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	04/03/2022	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi
Prazo contratual (dias):	960	Prazo de execução original:	19/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	19/10/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$19.801.812,59	Valor liberado do CFF:	R\$2.114.761,72
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$110.692,46	Valor liberado de acréscimos:	R\$110.692,46
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,56%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$19.912.505,05	Valores totais liberados:	R\$2.225.454,18
Valores à liberar:	R\$17.687.050,87	% Executado (sobre o valor final):	11,18%
Área construída:	6.495,02 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	dez/22
--	---------------

Unidade Beneficiada:	MONDAÍ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	005/2022	Reforma Parcial	
Data da Ordem de Serviço:	17/03/2022	Empresa Responsável:	Construtora Bem Te Vi
Prazo contratual (dias):	300	Prazo de execução original:	11/01/2023
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	11/04/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$2.930.871,34	Valor liberado do CFF:	R\$1.614.848,26
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$76.780,38	Valor descontado (supressões):	R\$76.780,38
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	2,62%
Valor total final da obra:	R\$2.854.090,96	Valores totais liberados:	R\$1.538.067,88
Valores à liberar:	R\$1.316.023,08	% Executado (sobre o valor final):	53,89%
Área construída:	989,66 m ²	Desenvolvimento:	Em dia.


Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			dez/22
Unidade Beneficiada:	BLUMENAU	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	022/2022	Reforma para finalização do 3º e 4º pavimento e urbanização	
Data da Ordem de Serviço:	15/08/2022	Empresa Responsável:	J. M. Gato Const. Inc. Ltda
Prazo contratual (dias):	270	Prazo de execução original:	12/05/2023
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	12/05/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$5.269.376,46	Valor liberado do CFF:	R\$1.370.639,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$5.269.376,46	Valores totais liberados:	R\$1.370.639,00
Valores à liberar:	R\$3.898.737,46	% Executado (sobre o valor final):	26,01%
Área construída:	10121,23 m²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:

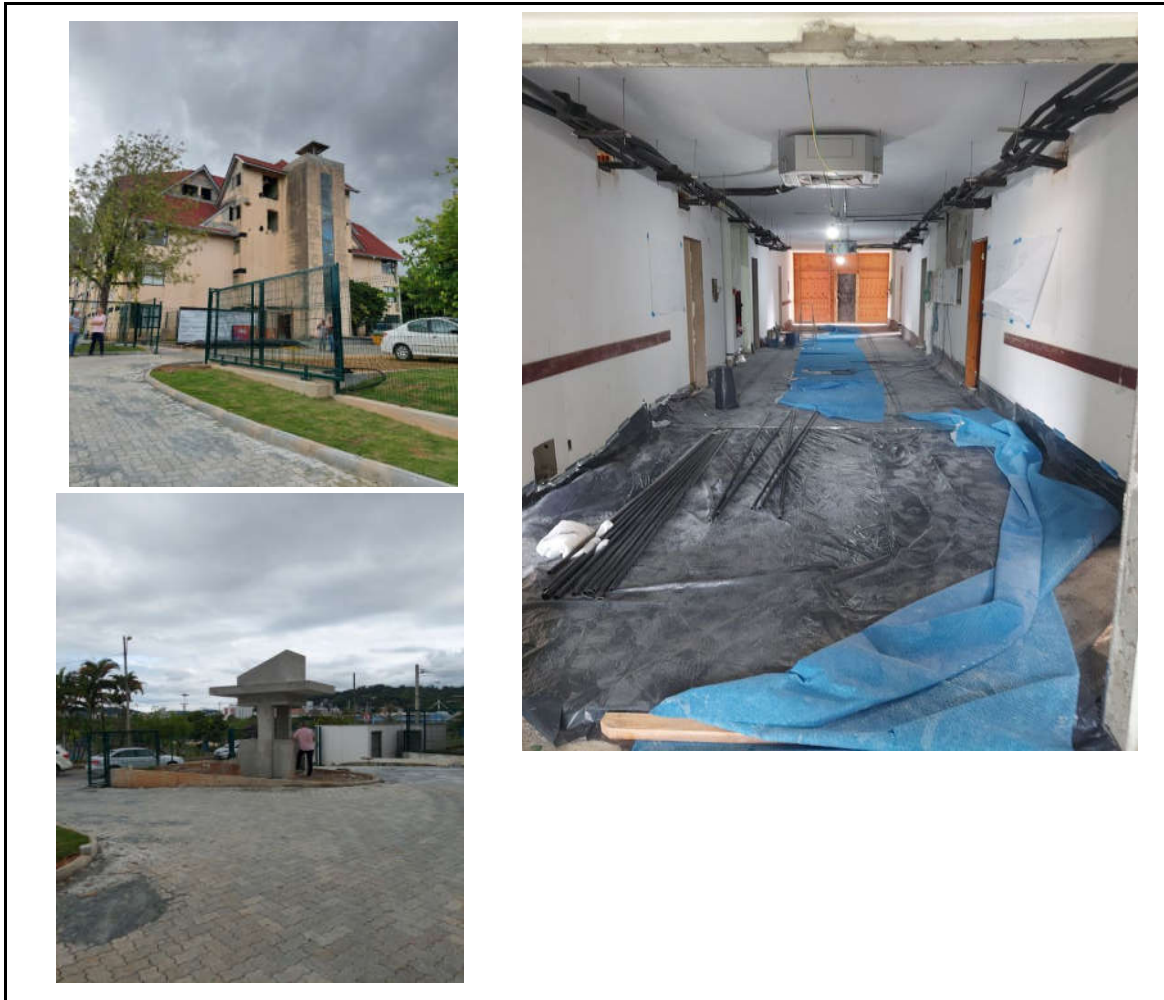

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	dez/22
--	---------------

Unidade Beneficiada:	RIO DO SUL	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	136/2018	Retomada da construção do novo prédio do Fórum	
Data de Início da Obra:	08/10/2018	Empresa Responsável:	Estrutura Engenharia
Prazo contratual (dias):	660	Prazo de execução original:	29/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	27/10/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$18.876.331,19	Valor liberado do CFF:	R\$18.876.331,19
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$3.576.672,85	Valor liberado de acréscimos:	R\$3.576.672,85
Valor de aditivos de supressões:	R\$3.035.722,36	Valor descontado (supressões):	R\$3.035.722,36
% de aditivos de acréscimo:	18,95%	% de aditivos de supressão:	16,08%
Valor total final da obra:	R\$19.417.281,68	Valores totais liberados:	R\$19.417.281,68
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	10.443,73 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 27/10/2020

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 27/10/2020.




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD dez/22

Unidade Beneficiada:	TUBARÃO	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	49/2021	Reforma parcial (Cercamento)	
Data da Ordem de Serviço:	24/06/2021	Empresa Responsável:	COSS ENGENHARIA
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	22/10/2021
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	21/12/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$492.559,80	Valor liberado do CFF:	R\$492.559,80
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.261,17	Valor liberado de acréscimos:	R\$2.261,17
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,46%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$494.820,97	Valores totais liberados:	R\$494.820,97
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	5213,70 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 22/06/2022

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 22/06/2022.

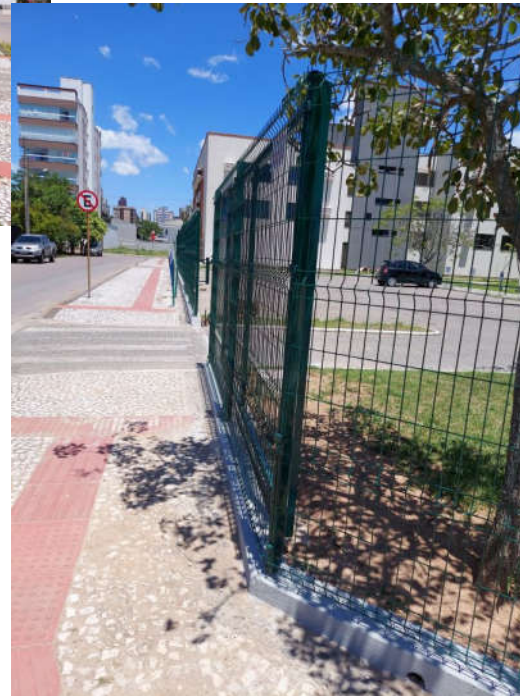


Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	dez/22
---	---------------

Unidade Beneficiada:	CAÇADOR	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	023/2020	Reforma parcial (acessibilidade, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	11/08/2020	Empresa Responsável:	Ciclo Engen. e Construção
Prazo contratual (dias):	300	Prazo de execução original:	07/06/2021
Prorrogação de prazo (dias):	242	Prazo de execução com prorrog.:	04/02/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$1.273.470,65	Valor liberado do CFF:	R\$1.273.470,65
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$273.780,87	Valor liberado de acréscimos:	R\$273.780,87
Valor de aditivos de supressões:	R\$146.616,38	Valor descontado (supressões):	R\$146.616,38
% de aditivos de acréscimo:	21,50%	% de aditivos de supressão:	11,51%
Valor total final da obra:	R\$1.400.635,14	Valores totais liberados:	R\$1.400.635,14
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1624,48 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 12/05/2022

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 12/05/2022 e definitivamente em 22/08/2022.

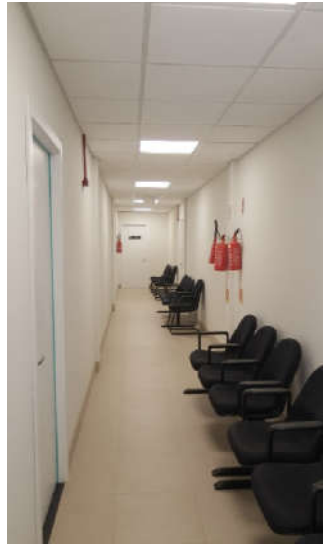

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2021	dez/22
---	---------------

Obras iniciadas: 3
 Obras concluídas (TRP): 3
 Obras concluídas com TRD: 1
 Obras paralisadas/rescindidas: 0
 Obras em andamento: 9
 Nº de obras no ano: 12

Valores Liberados:	
Janeiro	R\$ 70.506,19
Fevereiro	R\$ 988.727,93
Março	R\$ 226.519,69
Abril	R\$ 676.027,20
Maio	R\$ 498.069,00
Junho	R\$ 1.030.343,85
Julho	R\$ 1.379.983,17
Agosto	R\$ 869.057,58
Setembro	R\$ 920.301,04
Outubro	R\$ 2.399.553,45
Novembro	R\$ 2.754.954,43
Dezembro	R\$ 148.994,31
Total	R\$ 11.963.037,84



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Diogo Coelho Rocha

Fábio Rogério Haupenthal

Maíra Vítório Martinho

Matheus Erpen Benincá

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Data de atualização: 18/01/2023

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
