


| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | | | fev/23 | |
|---|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| Unidade Beneficiada: | TIMBÓ | Tipo de Obra: | | |
| Contrato nº: | 050/2018 | Construção do novo prédio do Fórum | | |
| Data da Ordem de Serviço: | 13/06/2018 | Empresa Responsável: | Endeal Eng e Construções | |
| Prazo contratual (dias): | 1080 | Prazo de execução original: | 28/05/2021 | |
| Prorrogação de prazo (dias): | 573 | Prazo de execução com prorrog.: | 22/12/2022 | |
| Valor do CFF original da obra: | R\$17.228.423,28 | Valor liberado do CFF: | R\$13.375.166,88 | |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$1.130.214,49 | Valor liberado de acréscimos: | R\$435.283,91 | |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$1.104.720,22 | Valor descontado (supressões): | R\$1.104.720,22 | |
| % de aditivos de acréscimo: | 6,56% | % de aditivos de supressão: | 6,41% | |
| Valor total final da obra: | R\$17.253.917,55 | Valores totais liberados: | R\$12.705.730,57 | |
| Valores à liberar: | R\$4.548.186,98 | % Executado (sobre o valor final): | 73,64% | |
| Área construída: | 6.857,59 m ² | Desenvolvimento: | Em atraso. | |

Situação da Obra:

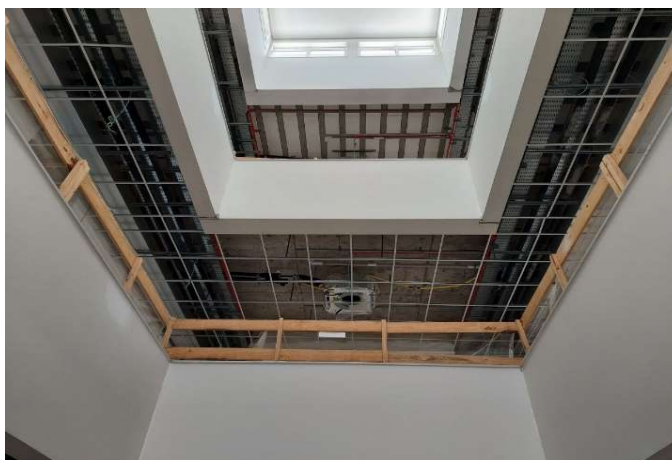


Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | fev/23 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| Unidade Beneficiada: | LAGES | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 020/2020 | Reforma parcial (cobertura, ppci, etc) | |
| Data da Ordem de Serviço: | 08/09/2020 | Empresa Responsável: | Salver Const. Incorp. |
| Prazo contratual (dias): | 450 | Prazo de execução original: | 02/12/2021 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 305 | Prazo de execução com prorrog.: | 03/10/2022 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$3.213.805,64 | Valor liberado do CFF: | R\$2.915.194,59 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$787.493,15 | Valor liberado de acréscimos: | R\$451.897,31 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$114.772,86 | Valor descontado (supressões): | R\$114.481,94 |
| % de aditivos de acréscimo: | 24,50% | % de aditivos de supressão: | 3,57% |
| Valor total final da obra: | R\$3.886.525,93 | Valores totais liberados: | R\$3.252.609,96 |
| Valores à liberar: | R\$633.915,97 | % Executado (sobre o valor final): | 83,69% |
| Área construída: | 5.162,21 m ² | Desenvolvimento: | Em atraso. |

Situação da Obra:

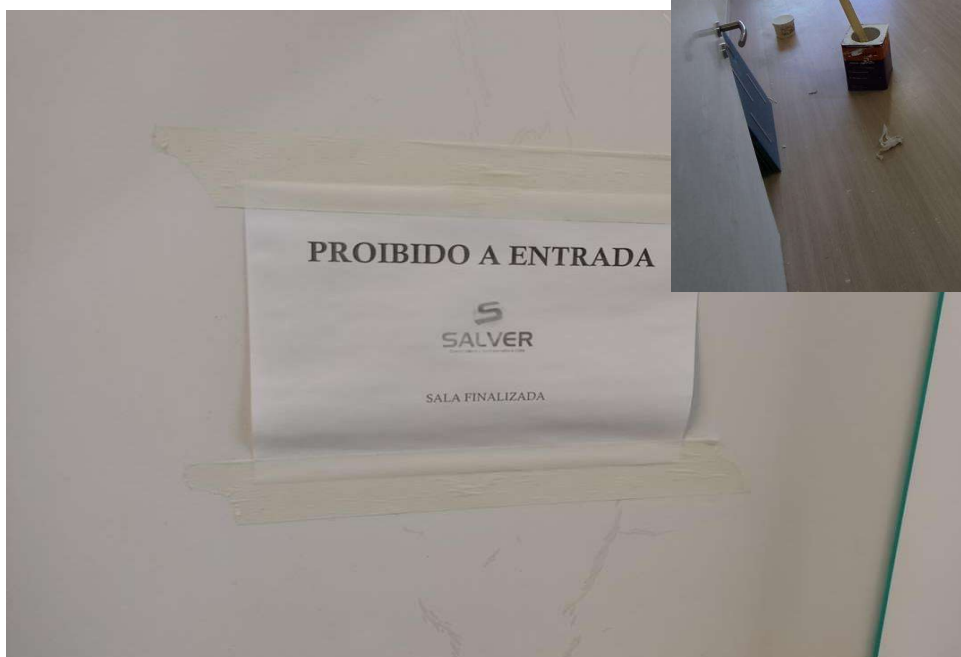

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | fev/23 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| Unidade Beneficiada: | JOINVILLE | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 006/2020 | Reforma parcial (cobertura, brises, etc) | |
| Data da Ordem de Serviço: | 14/10/2020 | Empresa Responsável: | Strehl Sol. em Engenharia |
| Prazo contratual (dias): | 420 | Prazo de execução original: | 08/12/2021 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 316 | Prazo de execução com prorrog.: | 20/10/2022 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$1.646.374,66 | Valor liberado do CFF: | R\$1.637.140,12 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$221.286,10 | Valor liberado de acréscimos: | R\$221.286,10 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 13,44% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$1.867.660,76 | Valores totais liberados: | R\$1.858.426,22 |
| Valores à liberar: | R\$9.234,54 | % Executado (sobre o valor final): | 99,51% |
| Área construída: | 9.422,75 m ² | Desenvolvimento: | Em atraso. |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | fev/23 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Unidade Beneficiada: | HERVAL D'OESTE | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 60/2021 | Construção do novo prédio do Fórum | |
| Data da Ordem de Serviço: | 08/07/2021 | Empresa Responsável: | Arruda Constr. de Obras |
| Prazo contratual (dias): | 720 | Prazo de execução original: | 28/06/2023 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 90 | Prazo de execução com prorrog.: | 26/09/2023 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$11.465.196,19 | Valor liberado do CFF: | R\$4.307.370,77 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$128.662,14 | Valor liberado de acréscimos: | R\$128.662,14 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$2.825,33 | Valor descontado (supressões): | R\$2.825,53 |
| % de aditivos de acréscimo: | 1,12% | % de aditivos de supressão: | 0,02% |
| Valor total final da obra: | R\$11.591.033,00 | Valores totais liberados: | R\$4.433.207,38 |
| Valores à liberar: | R\$7.157.825,62 | % Executado (sobre o valor final): | 38,25% |
| Área construída: | 3390,81 m ² | Desenvolvimento: | Em dia |

Situação da Obra:




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | fev/23 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Unidade Beneficiada: | B. CAMBORIÚ - Vara Família | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 23/2021 | Reforma Global | |
| Data da Ordem de Serviço: | 03/09/2021 | Empresa Responsável: | 3D Const. Comércio Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 360 | Prazo de execução original: | 29/08/2022 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 182 | Prazo de execução com prorrog.: | 27/02/2023 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$4.874.210,15 | Valor liberado do CFF: | R\$1.473.925,64 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$457.207,63 | Valor liberado de acréscimos: | R\$179.904,29 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$302.997,69 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 9,38% | % de aditivos de supressão: | 6,22% |
| Valor total final da obra: | R\$5.028.420,09 | Valores totais liberados: | R\$1.653.829,93 |
| Valores à liberar: | R\$3.374.590,16 | % Executado (sobre o valor final): | 32,89% |
| Área construída: | 1.702,64 m ² | Desenvolvimento: | Em atraso. |

Situação da Obra:

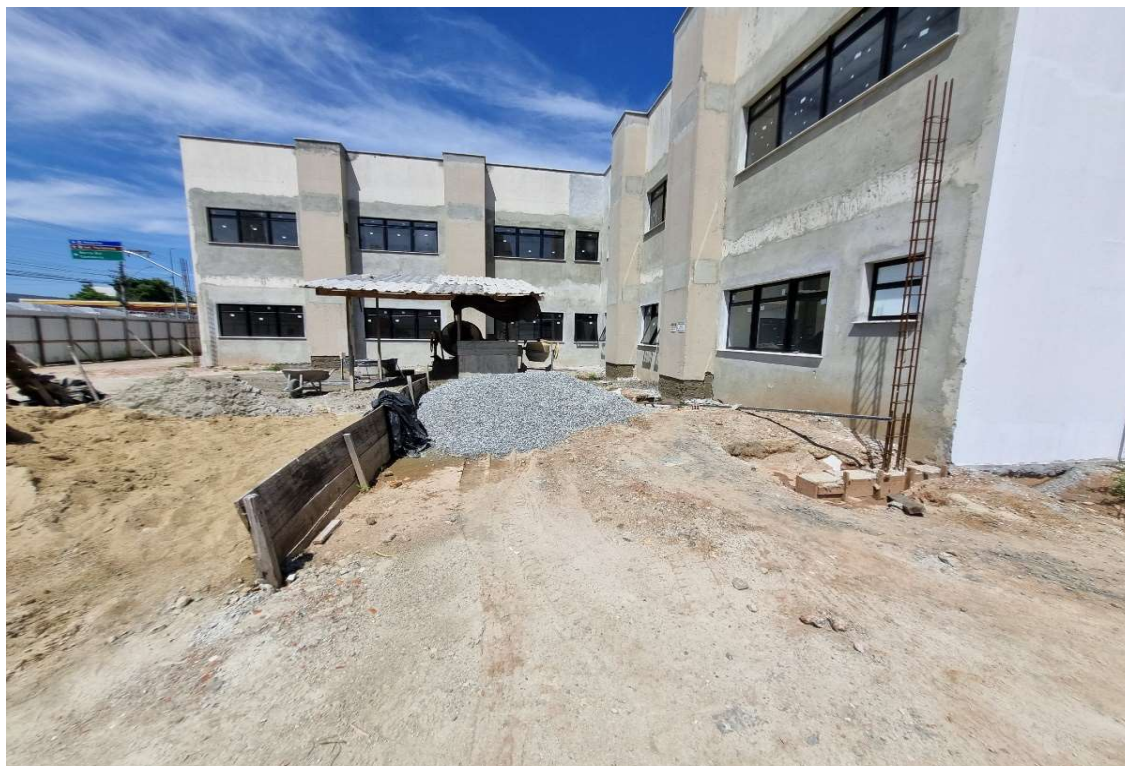

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | fev/23 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| Unidade Beneficiada: | CAMPO ERÊ | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 77/2021 | Reforma Global e Ampliação | |
| Data da Ordem de Serviço: | 23/09/2021 | Empresa Responsável: | Constr. Faon Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 450 | Prazo de execução original: | 17/12/2022 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 129 | Prazo de execução com prorrog.: | 25/04/2023 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$3.218.369,52 | Valor liberado do CFF: | R\$584.636,13 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$120.664,37 | Valor liberado de acréscimos: | R\$23.930,58 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$21.115,09 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 3,75% | % de aditivos de supressão: | 0,66% |
| Valor total final da obra: | R\$3.317.918,80 | Valores totais liberados: | R\$608.566,71 |
| Valores à liberar: | R\$2.709.352,09 | % Executado (sobre o valor final): | 18,34% |
| Área construída: | 763,42 m ² | Desenvolvimento: | Em atraso |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | | fev/23 | |
|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Unidade Beneficiada: | IMBITUBA | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 002/2022 | Construção do novo prédio do Fórum | |
| Data da Ordem de Serviço: | 04/03/2022 | Empresa Responsável: | Camilo & Ghisi |
| Prazo contratual (dias): | 960 | Prazo de execução original: | 19/10/2024 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrogação: | 19/10/2024 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$19.801.812,59 | Valor liberado do CFF: | R\$2.956.540,99 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$110.692,46 | Valor liberado de acréscimos: | R\$110.692,46 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,56% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$19.912.505,05 | Valores totais liberados: | R\$3.067.233,45 |
| Valores à liberar: | R\$16.845.271,60 | % Executado (sobre o valor final): | 15,40% |
| Área construída: | 6.495,02 m ² | Desenvolvimento: | Em dia |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | fev/23 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Unidade Beneficiada: | MONDAÍ | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 005/2022 | Reforma Parcial | |
| Data da Ordem de Serviço: | 17/03/2022 | Empresa Responsável: | Construtora Bem Te Vi |
| Prazo contratual (dias): | 300 | Prazo de execução original: | 11/01/2023 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 90 | Prazo de execução com prorrog.: | 11/04/2023 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$2.930.871,34 | Valor liberado do CFF: | R\$1.833.742,46 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$76.780,38 | Valor descontado (supressões): | R\$76.780,38 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 2,62% |
| Valor total final da obra: | R\$2.854.090,96 | Valores totais liberados: | R\$1.756.962,08 |
| Valores à liberar: | R\$1.097.128,88 | % Executado (sobre o valor final): | 61,56% |
| Área construída: | 989,66 m ² | Desenvolvimento: | Em dia. |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | fev/23 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| Unidade Beneficiada: | BLUMENAU | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 022/2022 | Reforma para finalização do 3º e 4º pavimento e urbanização | |
| Data da Ordem de Serviço: | 15/08/2022 | Empresa Responsável: | J. M. Gato Const. Inc. Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 270 | Prazo de execução original: | 12/05/2023 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 12/05/2023 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$5.269.376,46 | Valor liberado do CFF: | R\$2.682.751,29 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$5.269.376,46 | Valores totais liberados: | R\$2.682.751,29 |
| Valores à liberar: | R\$2.586.625,17 | % Executado (sobre o valor final): | 50,91% |
| Área construída: | 10121,23 m ² | Desenvolvimento: | Em dia |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | | | fev/23 |
|---|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Unidade Beneficiada: | LEBON RÉGIS | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 050/2022 | Reforma da Cobertura | |
| Data da Ordem de Serviço: | 30/01/2023 | Empresa Responsável: | Josiany Novacki Cleto Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 90 | Prazo de execução original: | 30/04/2023 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrogação: | 30/04/2023 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$598.000,00 | Valor liberado do CFF: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$598.000,00 | Valores totais liberados: | R\$0,00 |
| Valores à liberar: | R\$598.000,00 | % Executado (sobre o valor final): | 0,00% |
| Área construída: | 739,22 m ² | Desenvolvimento: | Em dia |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | fev/23 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Unidade Beneficiada: | SÃO LOURENÇO DO OESTE | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 054/2022 | Construção do novo prédio do Fórum | |
| Data da Ordem de Serviço: | 17/01/2023 | Empresa Responsável: | Josiany Novacki Cleto Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 780 | Prazo de execução original: | 07/03/2025 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 07/03/2025 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$17.217.900,00 | Valor liberado do CFF: | R\$293.554,83 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$17.217.900,00 | Valores totais liberados: | R\$293.554,83 |
| Valores à liberar: | R\$16.924.345,17 | % Executado (sobre o valor final): | 1,70% |
| Área construída: | 3.077,49 m ² | Desenvolvimento: | Em dia |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD | fev/23 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| Unidade Beneficiada: | RIO DO SUL | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 136/2018 | Retomada da construção do novo prédio do Fórum | |
| Data de Início da Obra: | 08/10/2018 | Empresa Responsável: | Estrutura Engenharia |
| Prazo contratual (dias): | 660 | Prazo de execução original: | 29/07/2020 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 90 | Prazo de execução com prorrog.: | 27/10/2020 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$18.876.331,19 | Valor liberado do CFF: | R\$18.876.331,19 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$3.576.672,85 | Valor liberado de acréscimos: | R\$3.576.672,85 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$3.035.722,36 | Valor descontado (supressões): | R\$3.035.722,36 |
| % de aditivos de acréscimo: | 18,95% | % de aditivos de supressão: | 16,08% |
| Valor total final da obra: | R\$19.417.281,68 | Valores totais liberados: | R\$19.417.281,68 |
| Valores à liberar: | R\$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |
| Área construída: | 10.443,73 m ² | Desenvolvimento: | Concluída em 27/10/2020 |

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 27/10/2020.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD | fev/23 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Unidade Beneficiada: | TUBARÃO | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 49/2021 | Reforma parcial (Cercamento) | |
| Data da Ordem de Serviço: | 24/06/2021 | Empresa Responsável: | COSS ENGENHARIA |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 22/10/2021 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 60 | Prazo de execução com prorrog.: | 21/12/2021 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$492.559,80 | Valor liberado do CFF: | R\$492.559,80 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$2.261,17 | Valor liberado de acréscimos: | R\$2.261,17 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,46% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$494.820,97 | Valores totais liberados: | R\$494.820,97 |
| Valores à liberar: | R\$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |
| Área construída: | 5213,70 m ² | Desenvolvimento: | Concluída em 22/06/2022 |

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 22/06/2022.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2023
fev/23

| | |
|--------------------------------|----|
| Obras iniciadas: | 2 |
| Obras concluídas (TRP): | 2 |
| Obras concluídas com TRD: | 0 |
| Obras paralisadas/rescindidas: | 0 |
| Obras em andamento: | 11 |
| Nº de obras no ano: | 13 |

| Valores Liberados: | | |
|--------------------|------------|---------------------|
| Janeiro | R\$ | 1.943.390,19 |
| Fevereiro | R\$ | 1.764.223,61 |
| Março | R\$ | - |
| Abril | R\$ | - |
| Maiο | R\$ | - |
| Junho | R\$ | - |
| Julho | R\$ | - |
| Agosto | R\$ | - |
| Setembro | R\$ | - |
| Outubro | R\$ | - |
| Novembro | R\$ | - |
| Dezembro | R\$ | - |
| Total | R\$ | 3.707.613,80 |



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva
Diogo Coelho Rocha
Fábio Rogério Haupenthal
Maíra Vitória Martinho
Matheus Erpen Benincá

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira
Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva
Data de atualização: 03/03/2023

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
