


RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		ago/23	
Unidade Beneficiada:	TIMBÓ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2018	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	763	Prazo de execução com prorrog.:	30/06/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	R\$14.962.557,46
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.130.214,49	Valor liberado de acréscimos:	R\$606.865,06
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.104.720,22	Valor descontado (supressões):	R\$1.104.720,22
% de aditivos de acréscimo:	6,56%	% de aditivos de supressão:	6,41%
Valor total final da obra:	R\$17.253.917,55	Valores totais liberados:	R\$14.464.702,30
Valores à liberar:	R\$2.789.215,25	% Executado (sobre o valor final):	83,83%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:

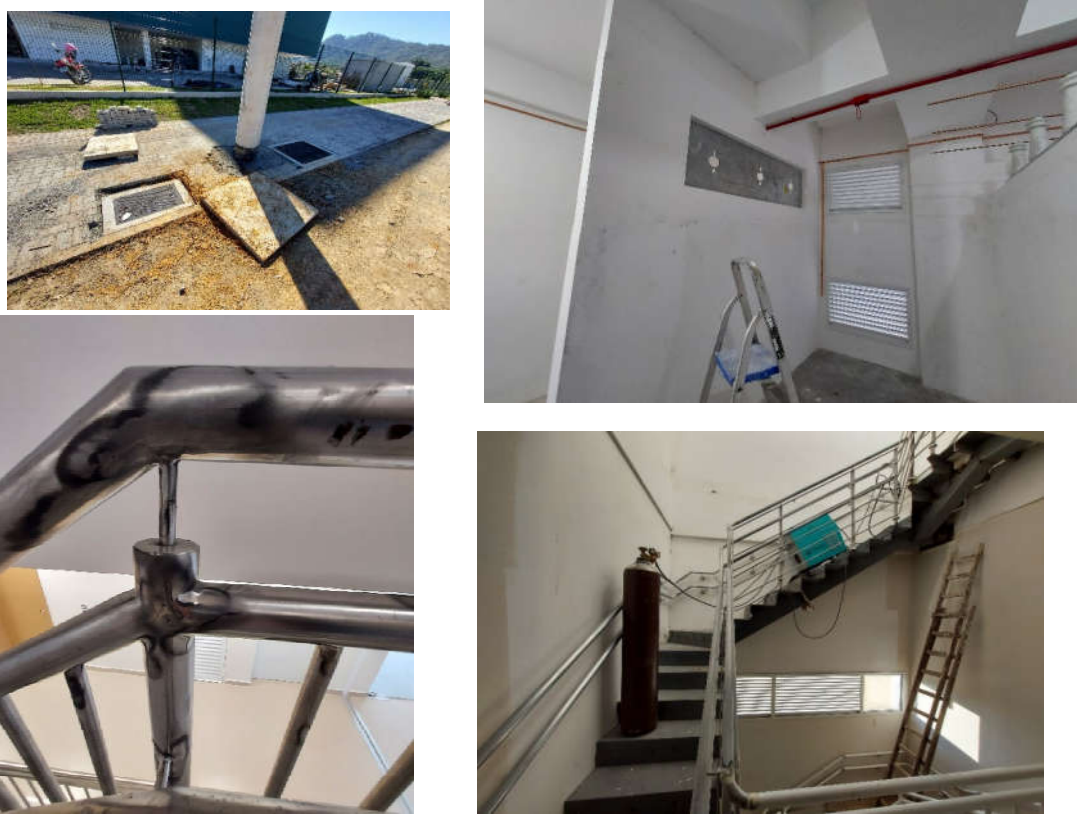

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:
<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbcCI6IjQ3NzYiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjojRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGllwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	ago/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	LAGES	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	020/2020	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	08/09/2020	Empresa Responsável:	Salver Const. Incorp.
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	02/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	305	Prazo de execução com prorrog.:	03/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.213.805,64	Valor liberado do CFF:	R\$3.140.762,37
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$787.493,15	Valor liberado de acréscimos:	R\$571.577,94
Valor de aditivos de supressões:	R\$114.772,86	Valor descontado (supressões):	R\$114.772,86
% de aditivos de acréscimo:	24,50%	% de aditivos de supressão:	3,57%
Valor total final da obra:	R\$3.886.525,93	Valores totais liberados:	R\$3.597.567,45
Valores à liberar:	R\$288.958,48	% Executado (sobre o valor final):	92,57%
Área construída:	5.162,21 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6ijU1OTEiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvljoiRyJlsmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwyl6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	ago/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	HERVAL D'OESTE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	60/2021	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	08/07/2021	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	28/06/2023
Prorrogação de prazo (dias):	180	Prazo de execução com prorrog.:	25/12/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$11.465.196,19	Valor liberado do CFF:	R\$6.994.077,46
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.640.856,95	Valor liberado de acréscimos:	R\$872.208,70
Valor de aditivos de supressões:	R\$991.141,68	Valor descontado (supressões):	R\$946.885,36
% de aditivos de acréscimo:	14,31%	% de aditivos de supressão:	8,64%
Valor total final da obra:	R\$12.114.911,46	Valores totais liberados:	R\$6.919.400,80
Valores à liberar:	R\$5.195.510,66	% Executado (sobre o valor final):	57,11%
Área construída:	3390,81 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCI6IiU2MzgiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGwbyl6IiAilClIb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>


Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	ago/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	B. CAMBORIÚ - Vara Família	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	23/2021	Reforma Global	
Data da Ordem de Serviço:	03/09/2021	Empresa Responsável:	3D Const. Comércio Ltda
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	29/08/2022
Prorrogação de prazo (dias):	182	Prazo de execução com prorrog.:	27/02/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$4.874.210,15	Valor liberado do CFF:	R\$1.473.925,64
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$457.207,63	Valor liberado de acréscimos:	R\$179.904,29
Valor de aditivos de supressões:	R\$302.997,69	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	9,38%	% de aditivos de supressão:	6,22%
Valor total final da obra:	R\$5.028.420,09	Valores totais liberados:	R\$1.653.829,93
Valores à liberar:	R\$3.374.590,16	% Executado (sobre o valor final):	32,89%
Área construída:	1.702,64 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:

Obra abandonada pela empresa. Encaminhado processo para rescisão contratual. Em elaboração levantamentos para retomada da obra através da contratação de outra empresa, o que deve ocorrer em até 180 dias.

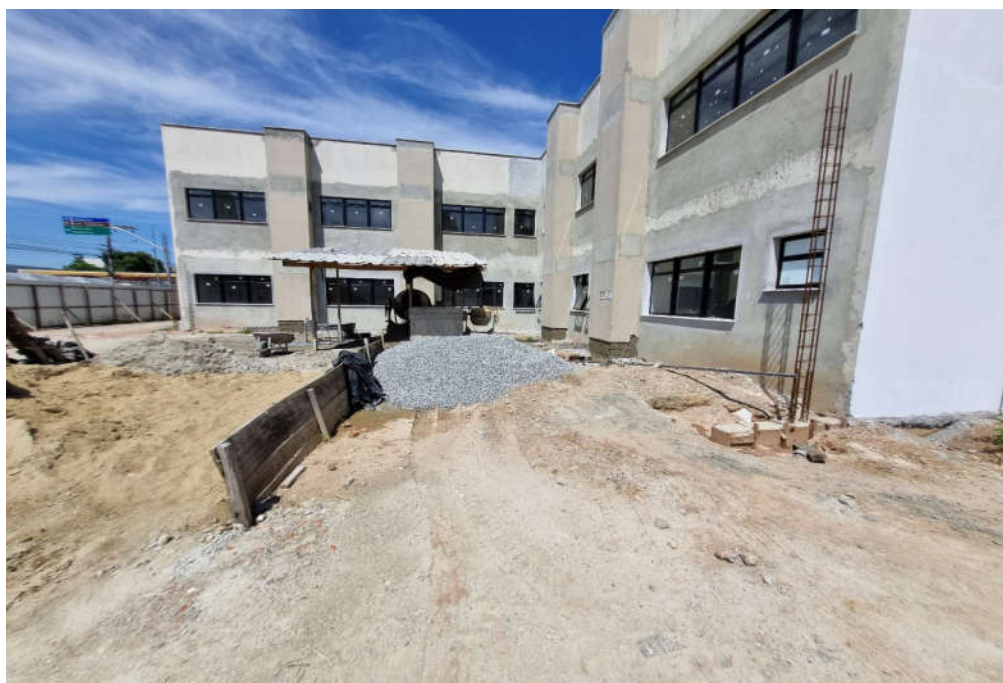

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCI6IjYwNzMiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIj0cnVlFQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	ago/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CAMPO ERÊ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	77/2021	Reforma Global e Ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	23/09/2021	Empresa Responsável:	Constr. Faon Ltda
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	17/12/2022
Prorrogação de prazo (dias):	279	Prazo de execução com prorrog.:	22/09/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$3.218.369,52	Valor liberado do CFF:	R\$1.267.384,37
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$143.678,24	Valor liberado de acréscimos:	R\$71.711,66
Valor de aditivos de supressões:	R\$71.590,84	Valor descontado (supressões):	R\$6.516,80
% de aditivos de acréscimo:	4,46%	% de aditivos de supressão:	2,22%
Valor total final da obra:	R\$3.290.456,92	Valores totais liberados:	R\$1.332.579,23
Valores à liberar:	R\$1.957.877,69	% Executado (sobre o valor final):	40,50%
Área construída:	763,42 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:




Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCI6IjU3NzMilCJOaXBvQXZhbGhY2FvljoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwyl6IiAilCltb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		ago/23	
Unidade Beneficiada:	IMBITUBA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	002/2022	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	04/03/2022	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi
Prazo contratual (dias):	960	Prazo de execução original:	19/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	19/10/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$19.801.812,59	Valor liberado do CFF:	R\$5.628.571,53
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$110.692,46	Valor liberado de acréscimos:	R\$110.692,46
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,56%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$19.912.505,05	Valores totais liberados:	R\$5.739.263,99
Valores à liberar:	R\$14.173.241,06	% Executado (sobre o valor final):	28,82%
Área construída:	6.495,02 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:

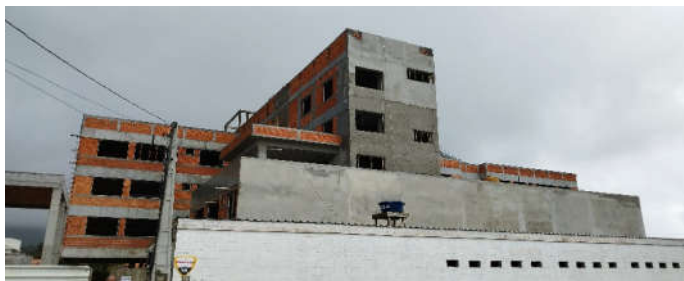

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbcGl6jU4NjYlLCJ0aXBvOXZhbGhY2FvljoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwyl6IlAilCjtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVifQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	ago/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	SÃO LOURENÇO DO OESTE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	054/2022	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	17/01/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	780	Prazo de execução original:	07/03/2025
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	07/03/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$17.217.900,00	Valor liberado do CFF:	R\$3.483.913,47
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$17.217.900,00	Valores totais liberados:	R\$3.483.913,47
Valores à liberar:	R\$13.733.986,53	% Executado (sobre o valor final):	20,23%
Área construída:	3.077,49 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCI6IiU5NTEiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjojRyVlSmFkbWluaXN0cmFjYVW8iOiIxliwidGlbwyl6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	ago/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	GARUVA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	003/2023	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	06/03/2023	Empresa Responsável:	Construtora Trífide Ltda
Prazo contratual (dias):	600	Prazo de execução original:	26/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	26/10/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$14.151.254,90	Valor liberado do CFF:	R\$3.294.759,04
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$14.151.254,90	Valores totais liberados:	R\$3.294.759,04
Valores à liberar:	R\$10.856.495,86	% Executado (sobre o valor final):	23,28%
Área construída:	2427,37 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbcCl6IjU5NTQlLCJ0aXBvQXZhbgGhY2FvIjoiRyYlsmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIiIiwidGlwbyl6IiAilCJtb3N0cmFmaW5rIjp0cnVlIQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	ago/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	ARAQUARI	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	17/2023	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	25/05/2023	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	900	Prazo de execução original:	10/11/2025
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	10/11/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$19.714.211,41	Valor liberado do CFF:	R\$585.634,86
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$784.258,88	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$641.070,48	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	3,98%	% de aditivos de supressão:	3,25%
Valor total final da obra:	R\$19.857.399,81	Valores totais liberados:	R\$585.634,86
Valores à liberar:	R\$19.271.764,95	% Executado (sobre o valor final):	2,95%
Área construída:	3840,29 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCI6IjYwNDYiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoiYXN0cmFjYXZlIiwidGwbyl6IiAilCI6Ij03N0cmFMaW5rIj03cnVlIj03>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	ago/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CAÇADOR	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	011/2023	Reforma parcial do Fórum - cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	12/06/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	240	Prazo de execução original:	07/02/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	07/02/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.677.737,20	Valor liberado do CFF:	R\$42.553,66
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.677.737,20	Valores totais liberados:	R\$42.553,66
Valores à liberar:	R\$1.635.183,54	% Executado (sobre o valor final):	2,54%
Área construída:	1624,48 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:


<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCI6IjYwMDMiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIj0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	ago/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	028/2023	Reforma parcial do Fórum - PPCI	
Data da Ordem de Serviço:	16/06/2023	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	14/09/2023
Prorrogação de prazo (dias):	15	Prazo de execução com prorrog.:	29/09/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$473.830,67	Valor liberado do CFF:	R\$96.512,95
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$32.828,91	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$4.849,43	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	6,93%	% de aditivos de supressão:	1,02%
Valor total final da obra:	R\$501.810,15	Valores totais liberados:	R\$96.512,95
Valores à liberar:	R\$405.297,20	% Executado (sobre o valor final):	19,23%
Área construída:	5.693,66 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:

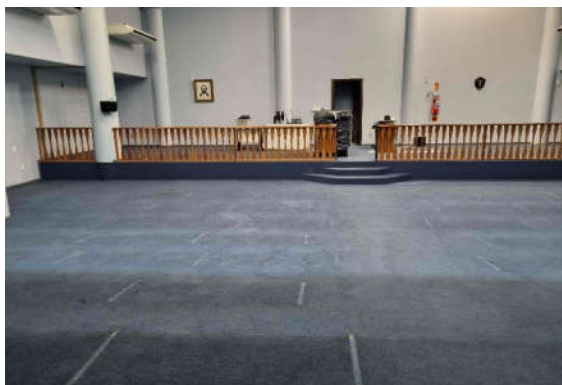

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbcCI6IjYwNzMiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjip0cnVlFQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	ago/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	ABELARDO LUZ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	027/2023	Construção do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	27/07/2023	Empresa Responsável:	Paleta Eng. e Constr. Ltda.
Prazo contratual (dias):	780	Prazo de execução original:	14/09/2025
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	14/09/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$17.365.186,51	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$17.365.186,51	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$17.365.186,51	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	3023,05 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzAilCj0aXBvQXZhbGhhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwbyI6IiAilCjtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	ago/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	S. AMARO DA IMPERATRIZ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	031/2023	Estabilização de talude	
Data da Ordem de Serviço:	12/07/2023	Empresa Responsável:	Freedom Eng. e Constr. Ltda.
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	08/01/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	08/01/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.817.542,87	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.817.542,87	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$1.817.542,87	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	761,25 m²	Desenvolvimento:	Paralisada

Situação da Obra:

Paralisada aguardando novo projeto em função de escorregamentos que alteraram a realidade de implantação da solução licitada.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzUilCj0aXBvQXZhbGhhY2FvIjojRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwyl6IiAilCjtb3N0cmFMaW5rljp0cnVfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	ago/23
---	---------------

Unidade Beneficiada:	RIO DO SUL	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	136/2018	Retomada da construção do novo prédio do Fórum	
Data de Início da Obra:	08/10/2018	Empresa Responsável:	Estrutura Engenharia
Prazo contratual (dias):	660	Prazo de execução original:	29/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	27/10/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$18.876.331,19	Valor liberado do CFF:	R\$18.876.331,19
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$3.576.672,85	Valor liberado de acréscimos:	R\$3.576.672,85
Valor de aditivos de supressões:	R\$3.035.722,36	Valor descontado (supressões):	R\$3.035.722,36
% de aditivos de acréscimo:	18,95%	% de aditivos de supressão:	16,08%
Valor total final da obra:	R\$19.417.281,68	Valores totais liberados:	R\$19.417.281,68
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	10.443,73 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 27/10/2020

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 27/10/2020.

Conforme decisão do SEI 0021619-44.2023.8.24.0710 o TRD foi emitido em 24/08/2023.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCI6ijUyNiQlClJ0aXBvQXZhbGliY2FvIjojRjYlsmFkbWluaXN0cmFjYyW8iOilxliwidGlbwylI6IIAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD **ago/23**

Unidade Beneficiada:	TUBARÃO	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	49/2021	Reforma parcial (Cercamento)	
Data da Ordem de Serviço:	24/06/2021	Empresa Responsável:	COSS ENGENHARIA
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	22/10/2021
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	21/12/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$492.559,80	Valor liberado do CFF:	R\$492.559,80
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.261,17	Valor liberado de acréscimos:	R\$2.261,17
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,46%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$494.820,97	Valores totais liberados:	R\$494.820,97
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	5213,70 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 22/06/2022

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 22/06/2022.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCI6IiU3NTUiLCJ0aXBvQXZhbGliY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIiwidGlwb3I6IiIiLCJ0aXN0cmFmaW51jp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD **ago/23**

Unidade Beneficiada:	LEBON RÉGIS	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2022	Reforma da Cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	30/01/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	30/04/2023
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrog.:	30/05/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$598.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$598.000,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$7.930,68	Valor liberado de acréscimos:	R\$7.930,68
Valor de aditivos de supressões:	R\$10.565,16	Valor descontado (supressões):	R\$10.565,16
% de aditivos de acréscimo:	1,33%	% de aditivos de supressão:	1,77%
Valor total final da obra:	R\$595.365,52	Valores totais liberados:	R\$595.365,52
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	739,22 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 09/07/2023

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 09/07/2022.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCI6IjYwMDgiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoiRylsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD **ago/23**

Unidade Beneficiada:	JOINVILLE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	006/2020	Reforma parcial (cobertura, brises, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	14/10/2020	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	420	Prazo de execução original:	08/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	316	Prazo de execução com prorrog.:	20/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$1.646.374,66	Valor liberado do CFF:	R\$1.637.140,12
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$221.286,10	Valor liberado de acréscimos:	R\$221.286,10
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	13,44%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.867.660,76	Valores totais liberados:	R\$1.858.426,22
Valores à liberar:	R\$9.234,54	% Executado (sobre o valor final):	99,51%
Área construída:	9.422,75 m²	Desenvolvimento:	Concluída em 28/07/2023

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 28/07/2023.



Informações, quantitativos, preços unitarios e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCI6IiU1NzgiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoRyIsImFkbWluaXN0cmFjYXW8iOiIxliwidGlbwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjpoOcnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD **ago/23**

Unidade Beneficiada:	MONDAÍ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	005/2022	Reforma Parcial	
Data da Ordem de Serviço:	17/03/2022	Empresa Responsável:	Construtora Bem Te Vi
Prazo contratual (dias):	300	Prazo de execução original:	11/01/2023
Prorrogação de prazo (dias):	180	Prazo de execução com prorrog.:	10/07/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$2.930.871,34	Valor liberado do CFF:	R\$2.930.871,34
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$263.336,90	Valor liberado de acréscimos:	R\$263.336,90
Valor de aditivos de supressões:	R\$87.078,63	Valor descontado (supressões):	R\$87.078,63
% de aditivos de acréscimo:	8,98%	% de aditivos de supressão:	2,97%
Valor total final da obra:	R\$3.107.129,61	Valores totais liberados:	R\$3.107.129,61
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	989,66 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 10/07/2023

Situação da Obra:

Recebida provisoriamente em 10/07/2023



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6iU4NDEiLCJ0aXBvQXZhbGhhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFiyW8iOiilxiwidGlbwyl6IiAilCJtb3N0cmFMaW5rljp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	ago/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	BLUMENAU	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	022/2022	Reforma para finalização do 3º e 4º pavimento e urbanização	
Data da Ordem de Serviço:	15/08/2022	Empresa Responsável:	J. M. Gato Const. Inc. Ltda
Prazo contratual (dias):	270	Prazo de execução original:	12/05/2023
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	11/07/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$5.269.376,46	Valor liberado do CFF:	R\$5.269.376,46
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$25.604,01	Valor liberado de acréscimos:	R\$25.604,01
Valor de aditivos de supressões:	R\$41.408,30	Valor descontado (supressões):	R\$41.408,30
% de aditivos de acréscimo:	0,49%	% de aditivos de supressão:	0,79%
Valor total final da obra:	R\$5.253.572,17	Valores totais liberados:	R\$5.253.572,17
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	10121,23 m²	Desenvolvimento:	Concluída em 18/08/2023

Situação da Obra:

Recebida provisoriamente em 18/08/2023.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6iU5NjAilCj0aXBvQXZhbGhY2FvIjo1RyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2023

ago/23

Obras iniciadas: 8
Obras concluídas (TRP): 5
Obras concluídas com TRD: 1
Obras em andamento: 13
Nº de obras no ano: 19

Valores Liberados:		
Janeiro	R\$	1.943.390,19
Fevereiro	R\$	2.085.345,04
Março	R\$	1.379.483,06
Abril	R\$	4.470.403,44
Maiο	R\$	1.990.412,09
Junho	R\$	4.325.481,75
Julho	R\$	4.058.006,14
Agosto	R\$	3.078.446,21
Setembro	R\$	-
Outubro	R\$	-
Novembro	R\$	-
Dezembro	R\$	-
Total	R\$	23.330.967,92



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Diogo Coelho Rocha

Fábio Rogério Haupenthal

Maíra Vítório Martinho

Matheus Erpen Benincá

Wilson Spernau Júnior

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Data de atualização: 08/09/2023

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
