


RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		jul/23	
Unidade Beneficiada:	TIMBÓ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2018	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	763	Prazo de execução com prorrog.:	30/06/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	R\$14.962.557,46
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.130.214,49	Valor liberado de acréscimos:	R\$606.865,06
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.104.720,22	Valor descontado (supressões):	R\$1.104.720,22
% de aditivos de acréscimo:	6,56%	% de aditivos de supressão:	6,41%
Valor total final da obra:	R\$17.253.917,55	Valores totais liberados:	R\$14.464.702,30
Valores à liberar:	R\$2.789.215,25	% Executado (sobre o valor final):	83,83%
Área construída:	6.857,59 m²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:

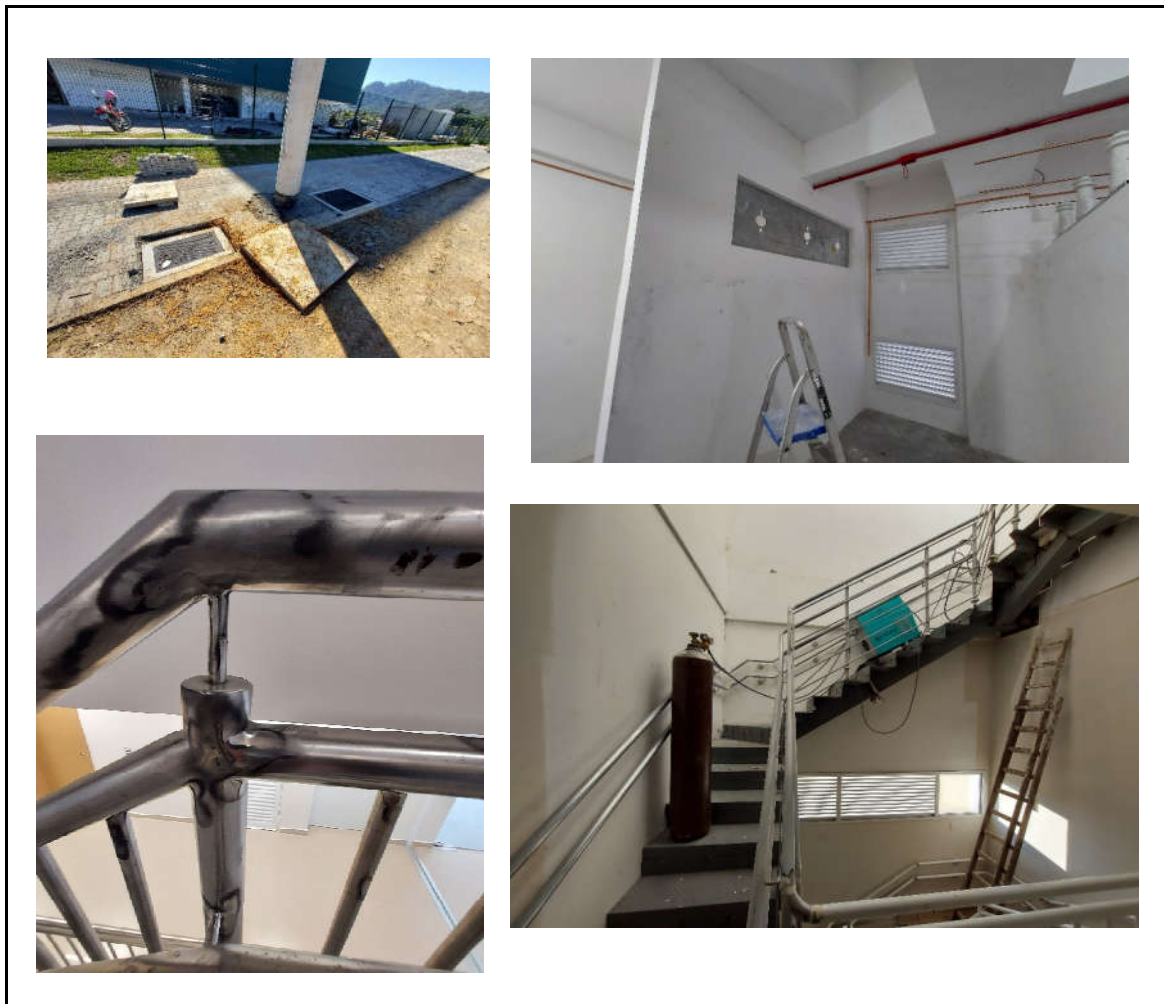

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jul/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	LAGES	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	020/2020	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	08/09/2020	Empresa Responsável:	Salver Const. Incorp.
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	02/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	305	Prazo de execução com prorrog.:	03/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.213.805,64	Valor liberado do CFF:	R\$3.140.762,37
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$787.493,15	Valor liberado de acréscimos:	R\$571.577,94
Valor de aditivos de supressões:	R\$114.772,86	Valor descontado (supressões):	R\$114.772,86
% de aditivos de acréscimo:	24,50%	% de aditivos de supressão:	3,57%
Valor total final da obra:	R\$3.886.525,93	Valores totais liberados:	R\$3.597.567,45
Valores à liberar:	R\$288.958,48	% Executado (sobre o valor final):	92,57%
Área construída:	5.162,21 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jul/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	JOINVILLE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	006/2020	Reforma parcial (cobertura, brises, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	14/10/2020	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	420	Prazo de execução original:	08/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	316	Prazo de execução com prorrog.:	20/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$1.646.374,66	Valor liberado do CFF:	R\$1.637.140,12
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$221.286,10	Valor liberado de acréscimos:	R\$221.286,10
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	13,44%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.867.660,76	Valores totais liberados:	R\$1.858.426,22
Valores à liberar:	R\$9.234,54	% Executado (sobre o valor final):	99,51%
Área construída:	9.422,75 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:

Aguardando a empresa finalizar correções para verificação da eficácia da estanqueidade.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jul/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	HERVAL D'OESTE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	60/2021	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	08/07/2021	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	28/06/2023
Prorrogação de prazo (dias):	180	Prazo de execução com prorrog.:	25/12/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$11.465.196,19	Valor liberado do CFF:	R\$6.994.077,46
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.640.856,95	Valor liberado de acréscimos:	R\$872.208,70
Valor de aditivos de supressões:	R\$991.141,68	Valor descontado (supressões):	R\$946.885,36
% de aditivos de acréscimo:	14,31%	% de aditivos de supressão:	8,64%
Valor total final da obra:	R\$12.114.911,46	Valores totais liberados:	R\$6.919.400,80
Valores à liberar:	R\$5.195.510,66	% Executado (sobre o valor final):	57,11%
Área construída:	3390,81 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jul/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	B. CAMBORIÚ - Vara Família	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	23/2021	Reforma Global	
Data da Ordem de Serviço:	03/09/2021	Empresa Responsável:	3D Const. Comércio Ltda
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	29/08/2022
Prorrogação de prazo (dias):	182	Prazo de execução com prorrog.:	27/02/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$4.874.210,15	Valor liberado do CFF:	R\$1.473.925,64
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$457.207,63	Valor liberado de acréscimos:	R\$179.904,29
Valor de aditivos de supressões:	R\$302.997,69	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	9,38%	% de aditivos de supressão:	6,22%
Valor total final da obra:	R\$5.028.420,09	Valores totais liberados:	R\$1.653.829,93
Valores à liberar:	R\$3.374.590,16	% Executado (sobre o valor final):	32,89%
Área construída:	1.702,64 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:

*Obra abandonada pela empresa. Encaminhado processo para rescisão contratual.
 Em elaboração levantamentos para retomada da obra através da contratação de outra empresa, o que deve ocorrer em até 180 dias.*

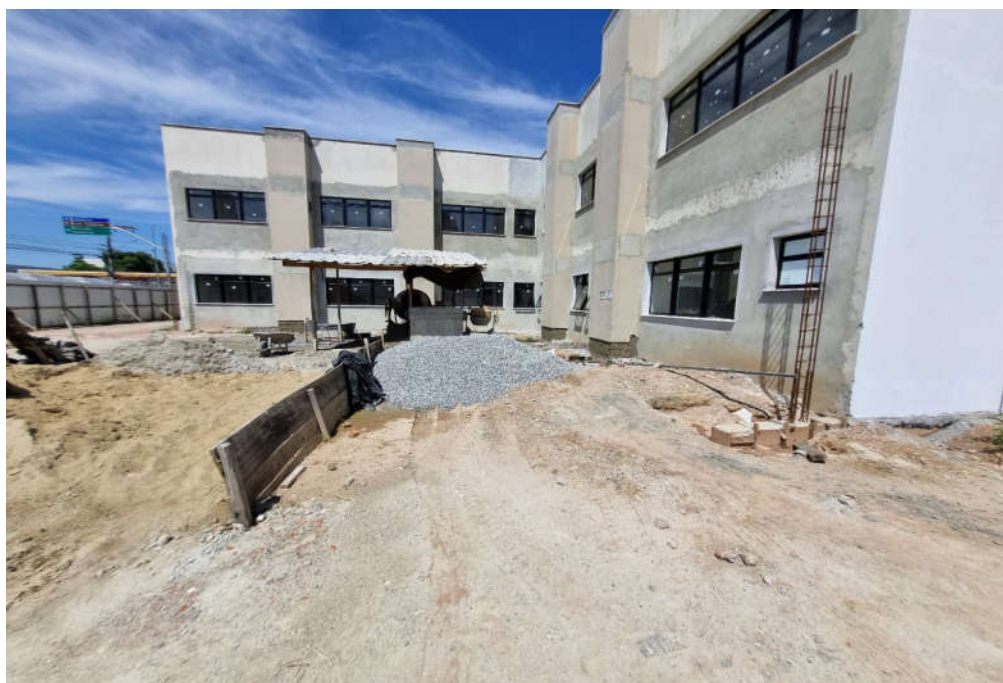


Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jul/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CAMPO ERÊ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	77/2021	Reforma Global e Ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	23/09/2021	Empresa Responsável:	Constr. Faon Ltda
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	17/12/2022
Prorrogação de prazo (dias):	249	Prazo de execução com prorrog.:	23/08/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$3.218.369,52	Valor liberado do CFF:	R\$1.100.995,96
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$143.678,24	Valor liberado de acréscimos:	R\$71.711,66
Valor de aditivos de supressões:	R\$71.590,84	Valor descontado (supressões):	R\$6.516,80
% de aditivos de acréscimo:	4,46%	% de aditivos de supressão:	2,22%
Valor total final da obra:	R\$3.290.456,92	Valores totais liberados:	R\$1.166.190,82
Valores à liberar:	R\$2.124.266,10	% Executado (sobre o valor final):	35,44%
Área construída:	763,42 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:

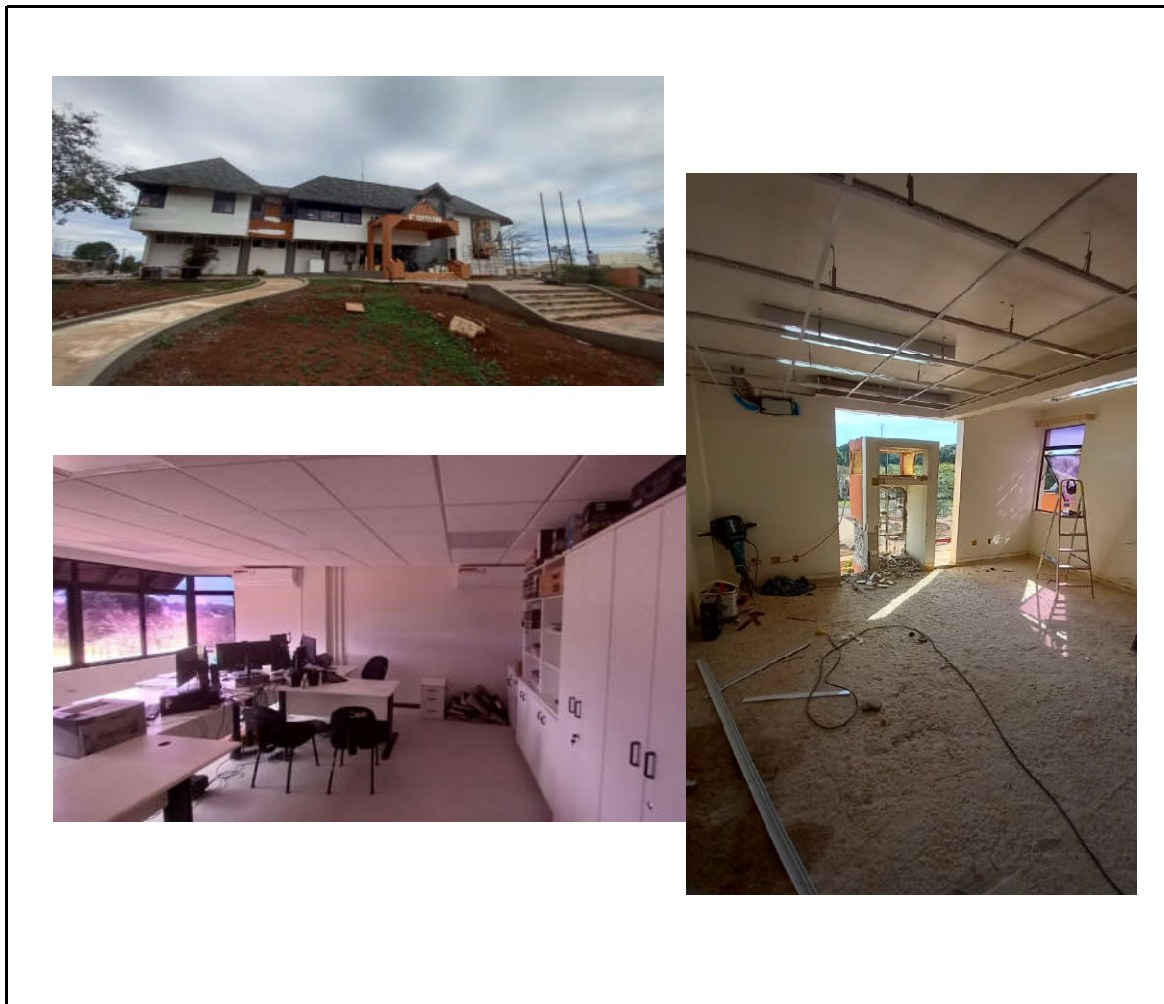

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		jul/23	
Unidade Beneficiada:	IMBITUBA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	002/2022	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	04/03/2022	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi
Prazo contratual (dias):	960	Prazo de execução original:	19/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	19/10/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$19.801.812,59	Valor liberado do CFF:	R\$4.951.585,36
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$110.692,46	Valor liberado de acréscimos:	R\$110.692,46
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,56%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$19.912.505,05	Valores totais liberados:	R\$5.062.277,82
Valores à liberar:	R\$14.850.227,23	% Executado (sobre o valor final):	25,42%
Área construída:	6.495,02 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jul/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	MONDAÍ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	005/2022	Reforma Parcial	
Data da Ordem de Serviço:	17/03/2022	Empresa Responsável:	Construtora Bem Te Vi
Prazo contratual (dias):	300	Prazo de execução original:	11/01/2023
Prorrogação de prazo (dias):	180	Prazo de execução com prorrog.:	10/07/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$2.930.871,34	Valor liberado do CFF:	R\$2.787.074,91
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$263.336,90	Valor liberado de acréscimos:	R\$263.336,90
Valor de aditivos de supressões:	R\$87.078,63	Valor descontado (supressões):	R\$76.780,38
% de aditivos de acréscimo:	8,98%	% de aditivos de supressão:	2,97%
Valor total final da obra:	R\$3.107.129,61	Valores totais liberados:	R\$2.973.631,43
Valores à liberar:	R\$133.498,18	% Executado (sobre o valor final):	95,70%
Área construída:	989,66 m ²	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:

Aguardando documentações.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jul/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	BLUMENAU	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	022/2022	Reforma para finalização do 3º e 4º pavimento e urbanização	
Data da Ordem de Serviço:	15/08/2022	Empresa Responsável:	J. M. Gato Const. Inc. Ltda
Prazo contratual (dias):	270	Prazo de execução original:	12/05/2023
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	11/07/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$5.269.376,46	Valor liberado do CFF:	R\$4.975.239,28
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$25.604,01	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$41.408,30	Valor descontado (supressões):	R\$41.408,30
% de aditivos de acréscimo:	0,49%	% de aditivos de supressão:	0,79%
Valor total final da obra:	R\$5.253.572,17	Valores totais liberados:	R\$4.933.830,98
Valores à liberar:	R\$319.741,19	% Executado (sobre o valor final):	93,91%
Área construída:	10121,23 m²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:

Aguardando vistoria.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jul/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	SÃO LOURENÇO DO OESTE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	054/2022	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	17/01/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	780	Prazo de execução original:	07/03/2025
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	07/03/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$17.217.900,00	Valor liberado do CFF:	R\$2.497.878,28
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$17.217.900,00	Valores totais liberados:	R\$2.497.878,28
Valores à liberar:	R\$14.720.021,72	% Executado (sobre o valor final):	14,51%
Área construída:	3.077,49 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		jul/23	
Unidade Beneficiada:	GARUVA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	003/2023	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	06/03/2023	Empresa Responsável:	Construtora Tríade Ltda
Prazo contratual (dias):	600	Prazo de execução original:	26/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	26/10/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$14.151.254,90	Valor liberado do CFF:	R\$2.306.314,13
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$14.151.254,90	Valores totais liberados:	R\$2.306.314,13
Valores à liberar:	R\$11.844.940,77	% Executado (sobre o valor final):	16,30%
Área construída:	2427,37 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jul/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	ARAQUARI	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	17/2023	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	25/05/2023	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	900	Prazo de execução original:	10/11/2025
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	10/11/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$19.714.211,41	Valor liberado do CFF:	R\$332.123,40
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$19.714.211,41	Valores totais liberados:	R\$332.123,40
Valores à liberar:	R\$19.382.088,01	% Executado (sobre o valor final):	1,68%
Área construída:	3840,29 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jul/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CAÇADOR	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	011/2023	Reforma parcial do Fórum - cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	12/06/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	240	Prazo de execução original:	07/02/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	07/02/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.677.737,20	Valor liberado do CFF:	R\$42.553,66
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.677.737,20	Valores totais liberados:	R\$42.553,66
Valores à liberar:	R\$1.635.183,54	% Executado (sobre o valor final):	2,54%
Área construída:	1624,48 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jul/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	028/2023	Reforma parcial do Fórum - PPCI	
Data da Ordem de Serviço:	16/06/2023	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	14/09/2023
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	14/09/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$473.830,67	Valor liberado do CFF:	R\$96.512,95
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$473.830,67	Valores totais liberados:	R\$96.512,95
Valores à liberar:	R\$377.317,72	% Executado (sobre o valor final):	20,37%
Área construída:	5.693,66 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:

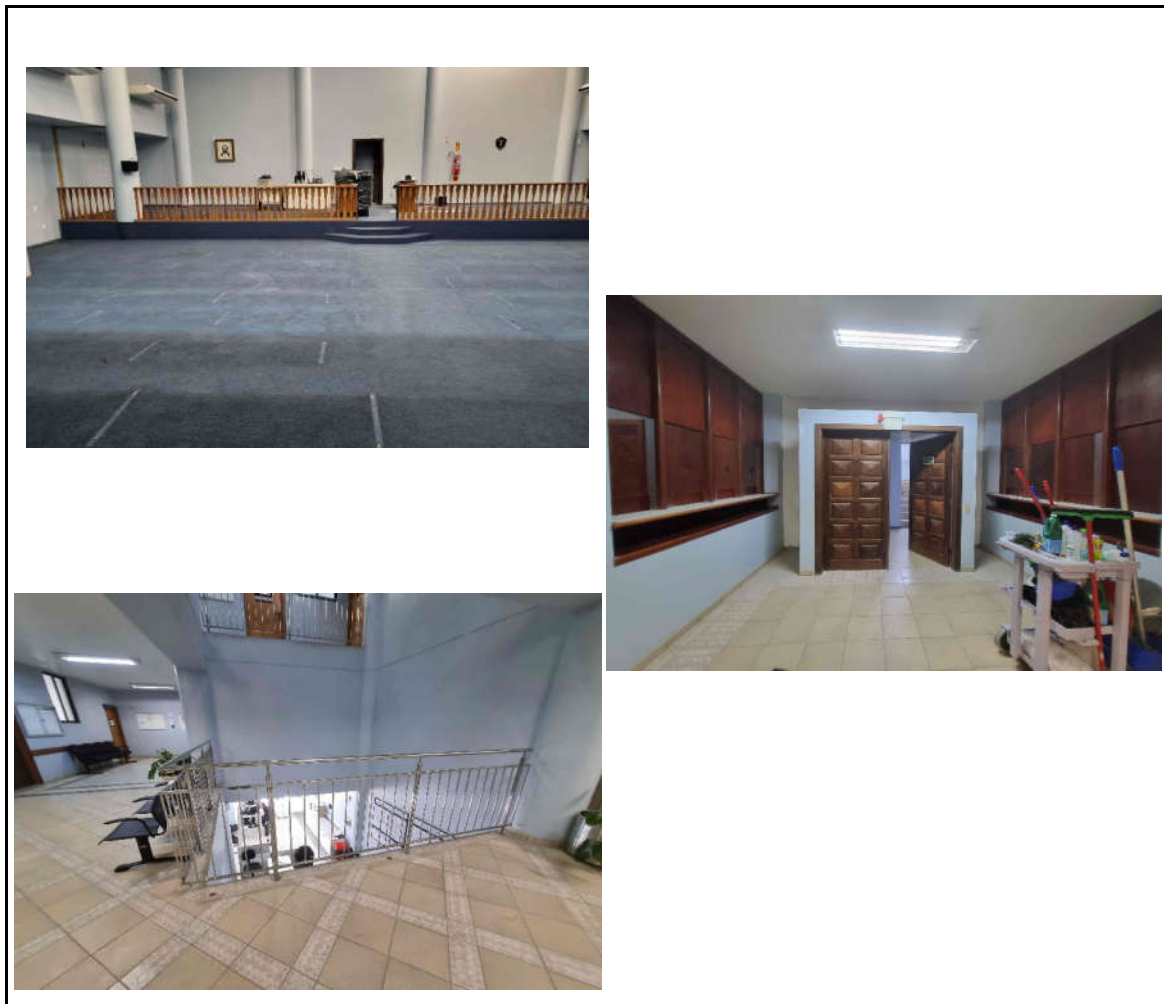

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jul/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	ABELARDO LUZ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	027/2023	Construção do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	27/07/2023	Empresa Responsável:	Paleta Eng. e Constr. Ltda.
Prazo contratual (dias):	780	Prazo de execução original:	14/09/2025
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	14/09/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$17.365.186,51	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$17.365.186,51	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$17.365.186,51	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	3023,05 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jul/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	S. AMARO DA IMPERATRIZ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	031/2023	Estabilização de talude	
Data da Ordem de Serviço:	12/07/2023	Empresa Responsável:	Freedom Eng. e Constr. Ltda.
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	08/01/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	08/01/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.817.542,87	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.817.542,87	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$1.817.542,87	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	761,25 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	jul/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	RIO DO SUL	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	136/2018	Retomada da construção do novo prédio do Fórum	
Data de Início da Obra:	08/10/2018	Empresa Responsável:	Estrutura Engenharia
Prazo contratual (dias):	660	Prazo de execução original:	29/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	27/10/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$18.876.331,19	Valor liberado do CFF:	R\$18.876.331,19
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$3.576.672,85	Valor liberado de acréscimos:	R\$3.576.672,85
Valor de aditivos de supressões:	R\$3.035.722,36	Valor descontado (supressões):	R\$3.035.722,36
% de aditivos de acréscimo:	18,95%	% de aditivos de supressão:	16,08%
Valor total final da obra:	R\$19.417.281,68	Valores totais liberados:	R\$19.417.281,68
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	10.443,73 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 27/10/2020

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 27/10/2020.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD **jul/23**

Unidade Beneficiada:	TUBARÃO	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	49/2021	Reforma parcial (Cercamento)	
Data da Ordem de Serviço:	24/06/2021	Empresa Responsável:	COSS ENGENHARIA
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	22/10/2021
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	21/12/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$492.559,80	Valor liberado do CFF:	R\$492.559,80
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.261,17	Valor liberado de acréscimos:	R\$2.261,17
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,46%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$494.820,97	Valores totais liberados:	R\$494.820,97
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	5213,70 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 22/06/2022

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 22/06/2022.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	jul/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	LEBON RÉGIS	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2022	Reforma da Cobertura	
Data do Ordem de Serviço:	30/01/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	30/04/2023
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrog.:	30/05/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$598.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$598.000,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$7.930,68	Valor liberado de acréscimos:	R\$7.930,68
Valor de aditivos de supressões:	R\$10.565,16	Valor descontado (supressões):	R\$10.565,16
% de aditivos de acréscimo:	1,33%	% de aditivos de supressão:	1,77%
Valor total final da obra:	R\$595.365,52	Valores totais liberados:	R\$595.365,52
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	739,22 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 09/07/2023

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 09/07/2022.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2023	jul/23
---	---------------

Obras iniciadas: 7
 Obras concluídas (TRP): 3
 Obras concluídas com TRD: 0
 Obras paralisadas/rescindidas: 0
 Obras em andamento: 16
 Nº de obras no ano: 19

Valores Liberados:		
Janeiro	R\$	1.943.390,19
Fevereiro	R\$	2.085.345,04
Março	R\$	1.379.483,06
Abril	R\$	4.470.403,44
Maiο	R\$	1.990.412,09
Junho	R\$	3.818.236,80
Julho	R\$	3.578.761,40
Agosto	R\$	-
Setembro	R\$	-
Outubro	R\$	-
Novembro	R\$	-
Dezembro	R\$	-
Total	R\$	19.266.032,02



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Diogo Coelho Rocha

Fábio Rogério Haupenthal

Maíra Vítório Martinho

Matheus Erpen Benincá

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Data de atualização: 09/08/2023

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
