


<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>nov/24</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>CAMPO ERÊ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>77/2021</b>	Reforma Global e Ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	23/09/2021	Empresa Responsável:	Constr. Faon Ltda
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	17/12/2022
Prorrogação de prazo (dias):	751	Prazo de execução com prorrog.:	06/01/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$3.218.369,52	Valor liberado do CFF:	R\$2.425.415,29
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$258.685,40	Valor liberado de acréscimos:	R\$163.115,06
Valor de aditivos de supressões:	R\$116.345,03	Valor descontado (supressões):	R\$75.066,01
% de aditivos de acréscimo:	8,04%	% de aditivos de supressão:	3,62%
Valor total final da obra:	R\$3.360.709,89	Valores totais liberados:	R\$2.513.464,34
Valores à liberar:	R\$847.245,55	% Executado (sobre o valor final):	74,79%
Área construída:	763,42 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:

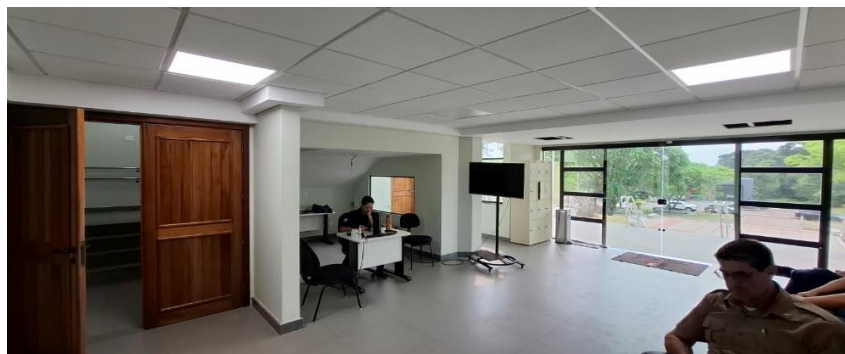

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6JlU3NzMiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoRyIsmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiixiwiidGlwbYl6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>nov/24</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>IMBITUBA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>002/2022</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	04/03/2022	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi
Prazo contratual (dias):	960	Prazo de execução original:	19/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	17/01/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$19.801.812,59	Valor liberado do CFF:	R\$18.697.464,61
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$4.307.527,11	Valor liberado de acréscimos:	R\$2.969.036,28
Valor de aditivos de supressões:	R\$3.375.518,14	Valor descontado (supressões):	R\$3.149.742,39
% de aditivos de acréscimo:	21,75%	% de aditivos de supressão:	17,05%
Valor total final da obra:	R\$20.733.821,56	Valores totais liberados:	R\$18.516.758,50
Valores à liberar:	R\$2.217.063,06	% Executado (sobre o valor final):	89,31%
Área construída:	6.495,02 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudWw1cm9Ub3RhbCI6JGU4NjYlLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoieRylsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwbyl6IiAilCjtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.



<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>nov/24</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>GARUVA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>003/2023</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	06/03/2023	Empresa Responsável:	Construtora Triade Ltda
Prazo contratual (dias):	600	Prazo de execução original:	26/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	25/12/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$14.151.254,90	Valor liberado do CFF:	R\$14.022.851,61
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$194.533,84	Valor liberado de acréscimos:	R\$194.533,84
Valor de aditivos de supressões:	R\$613.276,76	Valor descontado (supressões):	R\$613.276,76
% de aditivos de acréscimo:	1,37%	% de aditivos de supressão:	4,33%
Valor total final da obra:	R\$13.732.511,98	Valores totais liberados:	R\$13.604.108,69
Valores à liberar:	R\$128.403,29	% Executado (sobre o valor final):	99,06%
Área construída:	2427,37 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6JlU5NTQlLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoRylslmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IiIiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>nov/24</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>ARAQUARI</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>17/2023</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	25/05/2023	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	900	Prazo de execução original:	10/11/2025
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	09/01/2026
Valor do CFF original da obra:	R\$19.714.211,41	Valor liberado do CFF:	R\$8.335.168,89
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.081.643,92	Valor liberado de acréscimos:	R\$784.258,88
Valor de aditivos de supressões:	R\$763.701,90	Valor descontado (supressões):	R\$641.070,48
% de aditivos de acréscimo:	5,49%	% de aditivos de supressão:	3,87%
Valor total final da obra:	R\$20.032.153,43	Valores totais liberados:	R\$8.478.357,29
Valores à liberar:	R\$11.553.796,14	% Executado (sobre o valor final):	42,32%
Área construída:	3840,29 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNDYiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvljoiRylslmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlwbyl6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjpo0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			nov/24	
Unidade Beneficiada:	<b>ABELARDO LUZ</b>	Tipo de Obra:		
Contrato nº:	<b>027/2023</b>	Construção do Fórum		
Data da Ordem de Serviço:	27/07/2023	Empresa Responsável:	Paleta Eng. e Constr. Ltda.	
Prazo contratual (dias):	780	Prazo de execução original:	14/09/2025	
Prorrogação de prazo (dias):	162	Prazo de execução com prorrogação:	23/02/2026	
Valor do CFF original da obra:	R\$17.365.186,51	Valor liberado do CFF:	R\$2.145.104,60	
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$809.405,55	Valor liberado de acréscimos:	R\$686.602,81	
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.061.320,58	Valor descontado (supressões):	R\$1.061.320,58	
% de aditivos de acréscimo:	4,66%	% de aditivos de supressão:	6,11%	
Valor total final da obra:	R\$17.113.271,48	Valores totais liberados:	R\$1.770.386,83	
Valores à liberar:	R\$15.342.884,65	% Executado (sobre o valor final):	10,35%	
Área construída:	3023,05 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso	

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoieRylsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwbyl6lIAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjpo0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		nov/24	
Unidade Beneficiada:	<b>JOINVILLE</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>051/2023</b>	Reforma parcial (glazing)	
Data da Ordem de Serviço:	30/11/2023	Empresa Responsável:	Belart Tec. Em Constr. Ltda
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	29/03/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	29/03/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$240.412,50	Valor liberado do CFF:	R\$118.440,33
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$240.412,50	Valores totais liberados:	R\$118.440,33
Valores à liberar:	R\$121.972,17	% Executado (sobre o valor final):	49,27%
Área construída:	9.422,75 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:


<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCI6IjYxMDEiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoRylsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC</b>	<b>nov/24</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>BLUMENAU</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>005/2024</b>	Reforma Global	
Data da Ordem de Serviço:	09/05/2024	Empresa Responsável:	Implanta Const., Inc. e Serv.
Prazo contratual (dias):	900	Prazo de execução original:	26/10/2026
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	26/10/2026
Valor do CFF original da obra:	R\$20.740.327,86	Valor liberado do CFF:	R\$1.283.387,52
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$295.685,49	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	1,43%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$21.036.013,35	Valores totais liberados:	R\$1.283.387,52
Valores à liberar:	R\$19.752.625,83	% Executado (sobre o valor final):	6,10%
Área construída:	10121,23 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:

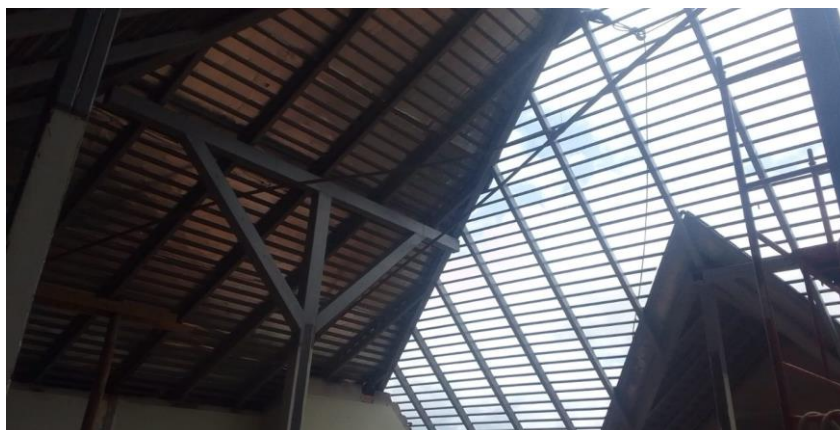

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTciLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoIYyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfiQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC</b>	<b>nov/24</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>CAMPOS NOVOS</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>007/2024</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	20/05/2024	Empresa Responsável:	Construcerto Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	05/05/2027
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	05/05/2027
Valor do CFF original da obra:	R\$22.152.400,78	Valor liberado do CFF:	R\$1.528.662,40
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$22.152.400,78	Valores totais liberados:	R\$1.528.662,40
Valores à liberar:	R\$20.623.738,38	% Executado (sobre o valor final):	6,90%
Área construída:	4352,72 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6JYxOTEILCJ0aXBvQXZhbGliY2FvljoiRylsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwbyl6IiAilCjtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>nov/24</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>SÃO JOSÉ - ANEXO</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>026/2024</b>	Reforma parcial (reforço estrutural e nova cobertura)	
Data da Ordem de Serviço:	10/06/2024	Empresa Responsável:	Berkana Engenharia
Prazo contratual (dias):	270	Prazo de execução original:	07/03/2025
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	07/03/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$2.999.975,08	Valor liberado do CFF:	R\$1.369.210,03
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$179.448,10	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$5.901,35	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	5,98%	% de aditivos de supressão:	0,20%
Valor total final da obra:	R\$3.173.521,83	Valores totais liberados:	R\$1.369.210,03
Valores à liberar:	R\$1.804.311,80	% Executado (sobre o valor final):	43,14%
Área construída:	5.753,64 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiixMjU5IiwiaWZlcmNpY2IvIjoiaWJyNCIsIm51bWVybnI6IjI2In0=>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.



<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC</b>	<b>nov/24</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>LAGUNA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>078/2024</b>	Reforma parcial - cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	25/10/2024	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Eng.
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	22/02/2025
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	22/02/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$856.839,36	Valor liberado do CFF:	R\$27.088,63
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$856.839,36	Valores totais liberados:	R\$27.088,63
Valores à liberar:	R\$829.750,73	% Executado (sobre o valor final):	3,16%
Área construída:	3028,36 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOilxMzM0liwiZXhlcmNpY2ljljoiMjAyNCIsIm51bWVYbyI6Ijc4In0=>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>nov/24</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>LEBON RÉGIS</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>050/2022</b>	Reforma da Cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	30/01/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	30/04/2023
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrogação:	30/05/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$598.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$598.000,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$7.930,68	Valor liberado de acréscimos:	R\$7.930,68
Valor de aditivos de supressões:	R\$10.565,16	Valor descontado (supressões):	R\$10.565,16
% de aditivos de acréscimo:	1,33%	% de aditivos de supressão:	1,77%
Valor total final da obra:	R\$595.365,52	Valores totais liberados:	R\$595.365,52
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	739,22 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 09/07/2023

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 09/07/2022 e definitivamente em 04/03/2023.*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCI6IjYwMDgiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvljoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlwbYl6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIip0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>nov/24</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>JOINVILLE</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>006/2020</b>	Reforma parcial (cobertura, brises, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	14/10/2020	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	420	Prazo de execução original:	08/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	316	Prazo de execução com prorrog.:	20/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$1.646.374,66	Valor liberado do CFF:	R\$1.646.374,66
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$221.286,10	Valor liberado de acréscimos:	R\$221.286,10
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	13,44%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.867.660,76	Valores totais liberados:	R\$1.867.660,76
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	9.422,75 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	<b>Concluída em 28/07/2023</b>

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 28/07/2023 e definitivamente em 23/05/2024.*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCl6lU1NzgiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiriYlslmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlwbyl6IIAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>nov/24</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>BLUMENAU</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>022/2022</b>	Reforma para finalização do 3º e 4º pavimento e urbanização	
Data da Ordem de Serviço:	15/08/2022	Empresa Responsável:	J. M. Gato Const. Inc. Ltda
Prazo contratual (dias):	270	Prazo de execução original:	12/05/2023
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	11/07/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$5.269.376,46	Valor liberado do CFF:	R\$5.269.376,46
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$25.604,01	Valor liberado de acréscimos:	R\$25.604,01
Valor de aditivos de supressões:	R\$41.408,30	Valor descontado (supressões):	R\$41.408,30
% de aditivos de acréscimo:	0,49%	% de aditivos de supressão:	0,79%
Valor total final da obra:	R\$5.253.572,17	Valores totais liberados:	R\$5.253.572,17
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	10121,23 m²	Desenvolvimento:	Concluída em 18/08/2023

Situação da Obra:

*Recebida provisoriamente em 18/08/2023 e definitivamente em 09/02/2022.*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6JlU5NjAilCj0aXBvQXZhbGliY2FvjoirYtIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwbyl6IiAilCjtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>nov/24</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>028/2023</b>	Reforma parcial do Fórum - PPCI	
Data da Ordem de Serviço:	16/06/2023	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	14/09/2023
Prorrogação de prazo (dias):	116	Prazo de execução com prorrog.:	08/01/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$473.830,67	Valor liberado do CFF:	R\$473.830,67
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$37.287,48	Valor liberado de acréscimos:	R\$37.287,48
Valor de aditivos de supressões:	R\$6.170,32	Valor descontado (supressões):	R\$6.170,32
% de aditivos de acréscimo:	7,87%	% de aditivos de supressão:	1,30%
Valor total final da obra:	R\$504.947,83	Valores totais liberados:	R\$504.947,83
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	5.693,66 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 12/12/2023

Situação da Obra:

*Recebida provisoriamente em 12/12/2023 e definitivamente em 11/04/2024*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzMiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvjoiriYlsmFkbWl1aXN0cmFjYW8iOiixiwiidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>


Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM RESCISÃO</b>	<b>nov/24</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>TIMBÓ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>050/2018</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	763	Prazo de execução com prorrog.:	30/06/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	R\$16.235.823,18
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.130.214,49	Valor liberado de acréscimos:	R\$984.080,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.104.720,22	Valor descontado (supressões):	R\$1.104.720,22
% de aditivos de acréscimo:	6,56%	% de aditivos de supressão:	6,41%
Valor total final da obra:	R\$17.253.917,55	Valores totais liberados:	R\$16.115.182,96
Valores à liberar:	R\$1.138.734,59	% Executado (sobre o valor final):	93,40%
Área construída:	6.857,59 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Paralisada

Situação da Obra:

*Obra paralisada. Em procedimentos de rescisão contratual. Fórum inaugurado com serviços complementares através dos contratos de manutenção.*

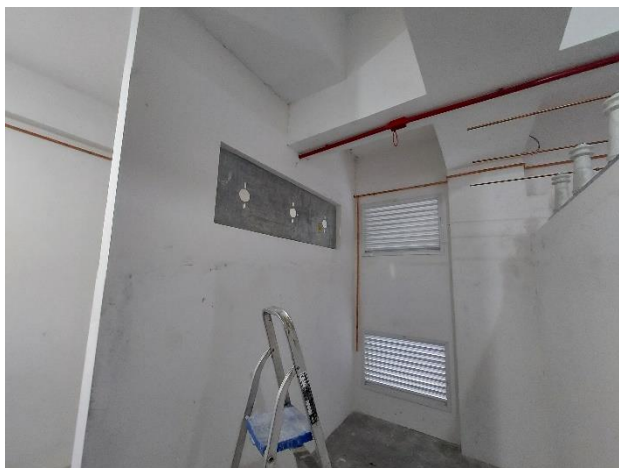

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCl6IjQ3NzYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoRylSlmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlwbyl6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO</b>	<b>nov/24</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>LAGES</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>020/2020</b>	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	08/09/2020	Empresa Responsável:	Salver Const. Incorp.
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	02/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	305	Prazo de execução com prorrog.:	03/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.213.805,64	Valor liberado do CFF:	R\$3.164.117,80
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$787.493,15	Valor liberado de acréscimos:	R\$766.193,87
Valor de aditivos de supressões:	R\$114.772,86	Valor descontado (supressões):	R\$114.772,86
% de aditivos de acréscimo:	24,50%	% de aditivos de supressão:	3,57%
Valor total final da obra:	R\$3.886.525,93	Valores totais liberados:	R\$3.815.538,81
Valores à liberar:	R\$70.987,12	% Executado (sobre o valor final):	98,17%
Área construída:	5.162,21 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Rescindida

Situação da Obra:

*Contrato rescindido em 30/01/2024.*

*Em elaboração levantamentos para conclusão dos serviços através dos contratos de manutenção.*

*Prazo estimado 120 dias.*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW11cm9UUb3RhbCl6lU1OTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiriYlslmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlwbyl6IIAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO**

**nov/24**

Unidade Beneficiada:	<b>B. CAMBORIÚ - Vara Família</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>23/2021</b>	Reforma Global	
Data da Ordem de Serviço:	03/09/2021	Empresa Responsável:	3D Const. Comércio Ltda
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	29/08/2022
Prorrogação de prazo (dias):	182	Prazo de execução com prorrog.:	27/02/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$4.874.210,15	Valor liberado do CFF:	R\$1.473.925,64
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$457.207,63	Valor liberado de acréscimos:	R\$179.904,29
Valor de aditivos de supressões:	R\$302.997,69	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	9,38%	% de aditivos de supressão:	6,22%
Valor total final da obra:	R\$5.028.420,09	Valores totais liberados:	R\$1.653.829,93
Valores à liberar:	R\$3.374.590,16	% Executado (sobre o valor final):	32,89%
Área construída:	1.702,64 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Rescindida

Situação da Obra:

*Contrato rescindido em 17/01/2024.*

*Em elaboração projetos para realização de licitação com prazo estimado de 120 dias.*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudWw1cm9Ub3RhbCI6JYwNzMiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoRyIstmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiixiwidGlwbyI6IiAilCJtb3N0cmFMaW5rlip0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO**

**nov/24**

Unidade Beneficiada:	<b>S. AMARO DA IMPERATRIZ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>031/2023</b>	Estabilização de talude	
Data da Ordem de Serviço:	12/07/2023	Empresa Responsável:	Freedom Eng. e Constr. Ltda.
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	08/01/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	08/01/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.817.542,87	Valor liberado do CFF:	R\$4.316,61
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.817.542,87	Valores totais liberados:	R\$4.316,61
Valores à liberar:	R\$1.813.226,26	% Executado (sobre o valor final):	0,24%
Área construída:	761,25 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Rescindido.

Situação da Obra:

*Contrato rescindido em função de novos deslizamentos que requereram alteração de projeto. SEI 0039602-56.2023.8.24.0710*

*Contrato para retomada já assinado. Eobra em andamento.*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW11cm9Ub3RhbnRlcjYwNzUilCj0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoRylsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiixliwidGlwbyl6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>nov/24</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>CAÇADOR</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>011/2023</b>	Reforma parcial do Fórum - cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	12/06/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	240	Prazo de execução original:	07/02/2024
Prorrogação de prazo (dias):	78	Prazo de execução com prorrog.:	25/04/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.677.737,20	Valor liberado do CFF:	R\$1.677.737,20
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$7.695,17	Valor liberado de acréscimos:	R\$7.695,17
Valor de aditivos de supressões:	R\$9.342,98	Valor descontado (supressões):	R\$9.342,98
% de aditivos de acréscimo:	0,46%	% de aditivos de supressão:	0,56%
Valor total final da obra:	R\$1.676.089,39	Valores totais liberados:	R\$1.676.089,39
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1624,48 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída

Situação da Obra:

*Recebida provisoriamente em 23/04/2024 e definitivamente em 12/07/2024.*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudWw1cm9Ub3RhbCI6JYwMDMiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvJoiRyVlslmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwbyl6IIAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>nov/24</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>SÃO JOSÉ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>052/2023</b>	Reforma parcial (FORRO EXTERNO)	
Data da Ordem de Serviço:	21/11/2023	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	19/04/2024
Prorrogação de prazo (dias):	17	Prazo de execução com prorrog.:	06/05/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$635.458,38	Valor liberado do CFF:	R\$635.458,38
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$536,05	Valor liberado de acréscimos:	R\$536,05
Valor de aditivos de supressões:	R\$64.282,65	Valor descontado (supressões):	R\$64.282,65
% de aditivos de acréscimo:	0,08%	% de aditivos de supressão:	10,12%
Valor total final da obra:	R\$571.711,78	Valores totais liberados:	R\$571.711,78
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	5.510,46 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Conclusa

Situação da Obra:

*Recebida provisoriamente em 06/05/2024 e definitivamente em 02/08/2024.*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudWw1cm9Ub3RhbCI6JYwNzgiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvJoiRylsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlwbyl6IIiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO</b>	<b>nov/24</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>LAGUNA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>041/2023</b>	Reforma parcial - cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	11/09/2023	Empresa Responsável:	MDS - Soluções e Constr.
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	08/02/2024
Prorrogação de prazo (dias):	75	Prazo de execução com prorrog.:	23/04/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.048.355,76	Valor liberado do CFF:	R\$91.965,10
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$95.462,68	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$59.380,17	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	9,11%	% de aditivos de supressão:	5,66%
Valor total final da obra:	R\$1.084.438,27	Valores totais liberados:	R\$91.965,10
Valores à liberar:	R\$992.473,17	% Executado (sobre o valor final):	8,48%
Área construída:	3028,36 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em rescisão

**Situação da Obra:**

*Obra paralisada desde 03/06/2024 conforme decisão no SEI 0006744-35.2024.8.24.0710 para rescisão contratual devido a problemas de responsabilidade da empresa executora da obra. Rescindida em 22/08/2024. Novo contrato já em andamento.*



**Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:**

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzIiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjo1RylsImFkbWluaXN0cmFjYXZlIiwidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>nov/24</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>HERVAL D'OESTE</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>60/2021</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	08/07/2021	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	28/06/2023
Prorrogação de prazo (dias):	347	Prazo de execução com prorrog.:	09/06/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$11.465.196,19	Valor liberado do CFF:	R\$11.465.196,19
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.118.323,79	Valor liberado de acréscimos:	R\$2.118.323,79
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.141.261,09	Valor descontado (supressões):	R\$1.141.261,09
% de aditivos de acréscimo:	18,48%	% de aditivos de supressão:	9,95%
Valor total final da obra:	R\$12.442.258,89	Valores totais liberados:	R\$12.442.258,89
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	3390,81 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 09/06/2024

Situação da Obra:

*Recebida provisoriamente em 09/06/2024 em 30/09/2024.*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudWw1cm9Ub3RhbCI6JlU2MzgiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiriYlslmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxiiwidGlwbyl6IIiAilCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.





<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD</b>	<b>nov/24</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>NORTE DA ILHA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>064/2023</b>	Reforma parcial	
Data da Ordem de Serviço:	20/11/2023	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	19/03/2024
Prorrogação de prazo (dias):	167	Prazo de execução com prorrog.:	02/09/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$2.063.996,46	Valor liberado do CFF:	R\$1.497.206,63
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$156.765,69	Valor liberado de acréscimos:	R\$156.765,69
Valor de aditivos de supressões:	R\$21.621,09	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	7,60%	% de aditivos de supressão:	1,05%
Valor total final da obra:	R\$2.199.141,06	Valores totais liberados:	R\$1.653.972,32
Valores à liberar:	R\$545.168,74	% Executado (sobre o valor final):	75,21%
Área construída:	1.982,34 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 02/09/2024

Situação da Obra:

*Recebida provisoriamente em 02/09/2024.*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxMzAilCj0aXBvQXZhbGhY2FvIjoRylslmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IiIiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD</b>	<b>nov/24</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>ITAPOÁ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>001/2024</b>	Reforma parcial e ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	08/04/2024	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	05/09/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	05/09/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.089.859,74	Valor liberado do CFF:	R\$1.089.859,74
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.089.859,74	Valores totais liberados:	R\$1.089.859,74
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	380,36 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 05/09/2024

Situação da Obra:

*Recebida provisoriamente em 05/09/2024.*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjliwZlXhlcmlNpY2lvi0iMjAyNCIsIm51bWVybWVlIjEifQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2024**

**nov/24**

Obras iniciadas: 8  
 Obras concluídas (TRP): 4  
 Obras concluídas com TRD: 6  
 Obras em andamento: 14  
 Nº de obras no ano: 28

Valores Liberados:		
Janeiro	R\$	3.402.113,97
Fevereiro	R\$	3.783.394,96
Março	R\$	2.719.315,03
Abril	R\$	4.950.403,84
Maiο	R\$	4.028.791,77
Junho	R\$	5.881.623,85
Julho	R\$	3.703.519,80
Agosto	R\$	7.457.676,28
Setembro	R\$	2.491.913,32
Outubro	R\$	4.759.611,37
Novembro	R\$	5.352.957,68
Dezembro	R\$	1.008.162,70
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>49.539.484,57</b>



Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras:

<https://tjciusbr0.sharepoint.com/sites/TransparnciaObras/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparnciaObras%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FOBRAS%20EM%20ANDAMENTO&p=true&ga=1>

Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

*André da Silva*

*Diogo Coelho Rocha*

*Fábio Rogério Haupenthal*

*Matheus Erpen Benincá*

*Wilson Spernau Júnior*

Engenheiros Eletricistas:

*Nilton Albieri Ferreira*

*Rodrigo André Machado*

Engenheiro Mecânico:

*Robson da Silva*

Arquiteto:

*João Marcos Corrêa*

**Data de atualização: 10/12/2024**

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
