

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	set/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CAMPO ERÊ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	77/2021	Reforma Global e Ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	23/09/2021	Empresa Responsável:	Constr. Faon Ltda
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	17/12/2022
Prorrogação de prazo (dias):	706	Prazo de execução com prorrog.:	22/11/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$3.218.369,52	Valor liberado do CFF:	R\$2.257.076,61
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$189.807,65	Valor liberado de acréscimos:	R\$115.882,47
Valor de aditivos de supressões:	R\$75.066,01	Valor descontado (supressões):	R\$75.066,01
% de aditivos de acréscimo:	5,90%	% de aditivos de supressão:	2,33%
Valor total final da obra:	R\$3.333.111,16	Valores totais liberados:	R\$2.297.893,07
Valores à liberar:	R\$1.035.218,09	% Executado (sobre o valor final):	68,94%
Área construída:	763,42 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudWw1cm9Ub3RhbCI6JlU3NzMiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvljoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiixIiwidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	set/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	IMBITUBA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	002/2022	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	04/03/2022	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi
Prazo contratual (dias):	960	Prazo de execução original:	19/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	17/01/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$19.801.812,59	Valor liberado do CFF:	R\$18.331.784,22
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$4.100.151,07	Valor liberado de acréscimos:	R\$1.849.435,46
Valor de aditivos de supressões:	R\$3.149.742,39	Valor descontado (supressões):	R\$2.932.933,49
% de aditivos de acréscimo:	20,71%	% de aditivos de supressão:	15,91%
Valor total final da obra:	R\$20.752.221,27	Valores totais liberados:	R\$17.248.286,19
Valores à liberar:	R\$3.503.935,08	% Executado (sobre o valor final):	83,12%
Área construída:	6.495,02 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6JGU4NjYlLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoieRylsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwylI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlFQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			set/24	
Unidade Beneficiada:	SÃO LOURENÇO DO OESTE	Tipo de Obra:		
Contrato nº:	054/2022	Construção do novo prédio do Fórum		
Data da Ordem de Serviço:	17/01/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda	
Prazo contratual (dias):	780	Prazo de execução original:	07/03/2025	
Prorrogação de prazo (dias):	15	Prazo de execução com prorrogação:	22/03/2025	
Valor do CFF original da obra:	R\$17.217.900,00	Valor liberado do CFF:	R\$10.102.216,61	
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$25.127,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$25.127,00	
Valor de aditivos de supressões:	-R\$162.075,13	Valor descontado (supressões):	R\$162.075,13	
% de aditivos de acréscimo:	0,15%	% de aditivos de supressão:	-0,94%	
Valor total final da obra:	R\$17.405.102,13	Valores totais liberados:	R\$9.965.268,48	
Valores à liberar:	R\$7.439.833,65	% Executado (sobre o valor final):	57,25%	
Área construída:	3.077,49 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso	

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCl6IjU5NTEiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoIYjI5MmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwbyl6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjpo0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	set/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	GARUVA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	003/2023	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	06/03/2023	Empresa Responsável:	Construtora Triade Ltda
Prazo contratual (dias):	600	Prazo de execução original:	26/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	25/12/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$14.151.254,90	Valor liberado do CFF:	R\$13.116.414,96
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$178.104,85	Valor liberado de acréscimos:	R\$178.104,85
Valor de aditivos de supressões:	R\$610.644,40	Valor descontado (supressões):	R\$610.644,40
% de aditivos de acréscimo:	1,26%	% de aditivos de supressão:	4,32%
Valor total final da obra:	R\$13.718.715,35	Valores totais liberados:	R\$12.683.875,41
Valores à liberar:	R\$1.034.839,94	% Executado (sobre o valor final):	92,46%
Área construída:	2427,37 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6JlU5NTQqLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvljoiRylsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlwbyl6IIAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlIQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	set/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	ARAQUARI	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	17/2023	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	25/05/2023	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	900	Prazo de execução original:	10/11/2025
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	09/01/2026
Valor do CFF original da obra:	R\$19.714.211,41	Valor liberado do CFF:	R\$6.719.288,85
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$958.914,39	Valor liberado de acréscimos:	R\$784.258,88
Valor de aditivos de supressões:	R\$680.530,93	Valor descontado (supressões):	R\$641.070,48
% de aditivos de acréscimo:	4,86%	% de aditivos de supressão:	3,45%
Valor total final da obra:	R\$19.992.594,87	Valores totais liberados:	R\$6.862.477,25
Valores à liberar:	R\$13.130.117,62	% Executado (sobre o valor final):	34,33%
Área construída:	3840,29 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudWw1cm9Ub3RhbCI6IjYwNDYiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvljoiRylsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwbyl6IIAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjpo0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			set/24	
Unidade Beneficiada:	ABELARDO LUZ	Tipo de Obra:		
Contrato nº:	027/2023	Construção do Fórum		
Data da Ordem de Serviço:	27/07/2023	Empresa Responsável:	Paleta Eng. e Constr. Ltda.	
Prazo contratual (dias):	780	Prazo de execução original:	14/09/2025	
Prorrogação de prazo (dias):	162	Prazo de execução com prorrog.:	23/02/2026	
Valor do CFF original da obra:	R\$17.365.186,51	Valor liberado do CFF:	R\$944.357,38	
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$809.405,55	Valor liberado de acréscimos:	R\$686.602,81	
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.061.320,58	Valor descontado (supressões):	R\$216.518,54	
% de aditivos de acréscimo:	4,66%	% de aditivos de supressão:	6,11%	
Valor total final da obra:	R\$17.113.271,48	Valores totais liberados:	R\$1.414.441,65	
Valores à liberar:	R\$15.698.829,83	% Executado (sobre o valor final):	8,27%	
Área construída:	3023,05 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso	

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoieRylsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwbyl6lIAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjpo0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		set/24	
Unidade Beneficiada:	JOINVILLE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	051/2023	Reforma parcial (glazing)	
Data da Ordem de Serviço:	30/11/2023	Empresa Responsável:	Belart Tec. Em Constr. Ltda
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	29/03/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	29/03/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$240.412,50	Valor liberado do CFF:	R\$16.375,22
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$240.412,50	Valores totais liberados:	R\$16.375,22
Valores à liberar:	R\$224.037,28	% Executado (sobre o valor final):	6,81%
Área construída:	9.422,75 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCI6IjYxMDEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoRylsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC			set/24
Unidade Beneficiada:	BLUMENAU	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	005/2024	Reforma Global	
Data da Ordem de Serviço:	09/05/2024	Empresa Responsável:	Implanta Const., Inc. e Serv.
Prazo contratual (dias):	900	Prazo de execução original:	26/10/2026
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	26/10/2026
Valor do CFF original da obra:	R\$20.740.327,86	Valor liberado do CFF:	R\$400.370,80
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$20.740.327,86	Valores totais liberados:	R\$400.370,80
Valores à liberar:	R\$20.339.957,06	% Executado (sobre o valor final):	1,93%
Área construída:	10121,23 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTciLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoIYyIsImFkbWluaXN0cmFjYyW8iOilxliwidGlwbyl6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC	set/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CAMPOS NOVOS	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	007/2024	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	20/05/2024	Empresa Responsável:	Construcerto Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	05/05/2027
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	05/05/2027
Valor do CFF original da obra:	R\$22.152.400,78	Valor liberado do CFF:	R\$396.581,12
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$22.152.400,78	Valores totais liberados:	R\$396.581,12
Valores à liberar:	R\$21.755.819,66	% Executado (sobre o valor final):	1,79%
Área construída:	4352,72 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW11cm9Ub3RhbCI6JYxOTEILCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjo1RylsImFkbWluaXN0cmFiyW8iOiIxliwidGlbwbyl6IiAilCjtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlFQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	set/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	S. AMARO DA IMPERATRIZ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	033/2024	Estabilização de talude	
Data da Ordem de Serviço:	28/06/2024	Empresa Responsável:	Freedom Eng. e Constr. Ltda.
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	23/06/2025
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	23/06/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$4.284.134,63	Valor liberado do CFF:	R\$498.700,21
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$4.284.134,63	Valores totais liberados:	R\$498.700,21
Valores à liberar:	R\$3.785.434,42	% Executado (sobre o valor final):	11,64%
Área construída:	761,25 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento.

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJZXF1ZW5jaWEiOiJY5liwiZlZlcmNoY2IvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybWVlIjoiMzInO=>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	set/24
---	---------------

Unidade Beneficiada:	LEBON RÉGIS	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2022	Reforma da Cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	30/01/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	30/04/2023
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrogação:	30/05/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$598.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$598.000,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$7.930,68	Valor liberado de acréscimos:	R\$7.930,68
Valor de aditivos de supressões:	R\$10.565,16	Valor descontado (supressões):	R\$10.565,16
% de aditivos de acréscimo:	1,33%	% de aditivos de supressão:	1,77%
Valor total final da obra:	R\$595.365,52	Valores totais liberados:	R\$595.365,52
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	739,22 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 09/07/2023

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 09/07/2022 e definitivamente em 04/03/2023.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCI6IjYwMDgiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvljoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwbyl6IIAiLCJtb3N0cmFMaW5rIip0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	set/24
---	---------------

Unidade Beneficiada:	JOINVILLE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	006/2020	Reforma parcial (cobertura, brises, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	14/10/2020	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	420	Prazo de execução original:	08/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	316	Prazo de execução com prorrog.:	20/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$1.646.374,66	Valor liberado do CFF:	R\$1.646.374,66
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$221.286,10	Valor liberado de acréscimos:	R\$221.286,10
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	13,44%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.867.660,76	Valores totais liberados:	R\$1.867.660,76
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	9.422,75 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 28/07/2023

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 28/07/2023 e definitivamente em 23/05/2024.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCl6lU1NzgiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiriYlslmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlwbyl6IIAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVifQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	set/24
---	---------------

Unidade Beneficiada:	BLUMENAU	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	022/2022	Reforma para finalização do 3º e 4º pavimento e urbanização	
Data da Ordem de Serviço:	15/08/2022	Empresa Responsável:	J. M. Gato Const. Inc. Ltda
Prazo contratual (dias):	270	Prazo de execução original:	12/05/2023
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	11/07/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$5.269.376,46	Valor liberado do CFF:	R\$5.269.376,46
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$25.604,01	Valor liberado de acréscimos:	R\$25.604,01
Valor de aditivos de supressões:	R\$41.408,30	Valor descontado (supressões):	R\$41.408,30
% de aditivos de acréscimo:	0,49%	% de aditivos de supressão:	0,79%
Valor total final da obra:	R\$5.253.572,17	Valores totais liberados:	R\$5.253.572,17
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	10121,23 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 18/08/2023

Situação da Obra:

Recebida provisoriamente em 18/08/2023 e definitivamente em 09/02/2022.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6JlU5NjAilCj0aXBvQXZhbGliY2FvjoirYtIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwbyl6IiAilCjtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>


Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA **set/24**

Unidade Beneficiada:	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	028/2023	Reforma parcial do Fórum - PPCI	
Data da Ordem de Serviço:	16/06/2023	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	14/09/2023
Prorrogação de prazo (dias):	116	Prazo de execução com prorrog.:	08/01/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$473.830,67	Valor liberado do CFF:	R\$473.830,67
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$37.287,48	Valor liberado de acréscimos:	R\$37.287,48
Valor de aditivos de supressões:	R\$6.170,32	Valor descontado (supressões):	R\$6.170,32
% de aditivos de acréscimo:	7,87%	% de aditivos de supressão:	1,30%
Valor total final da obra:	R\$504.947,83	Valores totais liberados:	R\$504.947,83
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	5.693,66 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 12/12/2023

Situação da Obra:

Recebida provisoriamente em 12/12/2023 e definitivamente em 11/04/2024

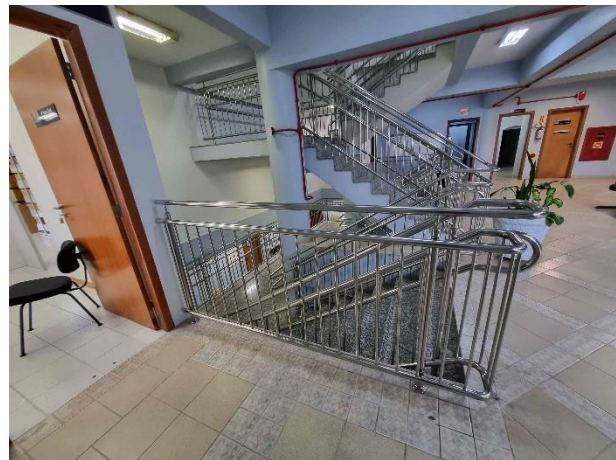

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzMiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvjoRyIsmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiixiwidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>


Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM RESCISÃO **set/24**

Unidade Beneficiada:	TIMBÓ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2018	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	763	Prazo de execução com prorrog.:	30/06/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	R\$16.235.823,18
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.130.214,49	Valor liberado de acréscimos:	R\$984.080,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.104.720,22	Valor descontado (supressões):	R\$1.104.720,22
% de aditivos de acréscimo:	6,56%	% de aditivos de supressão:	6,41%
Valor total final da obra:	R\$17.253.917,55	Valores totais liberados:	R\$16.115.182,96
Valores à liberar:	R\$1.138.734,59	% Executado (sobre o valor final):	93,40%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Paralisada

Situação da Obra:

Obra paralisada. Em procedimentos de rescisão contratual. Fórum inaugurado com serviços complementares através dos contratos de manutenção.

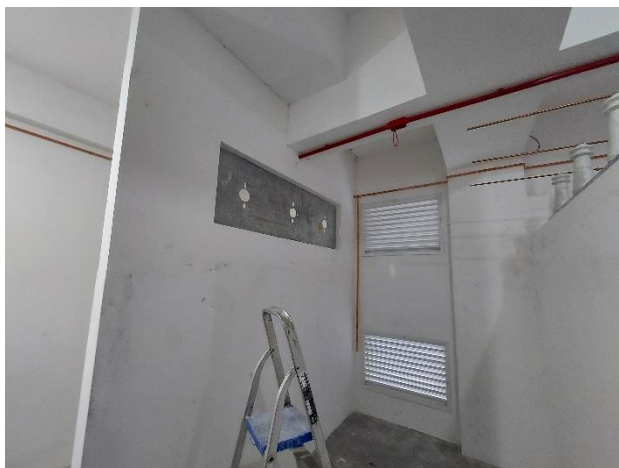

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCl6lQ3NzYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoRylSlmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlwbyl6lIAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO	set/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	LAGES	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	020/2020	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	08/09/2020	Empresa Responsável:	Salver Const. Incorp.
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	02/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	305	Prazo de execução com prorrog.:	03/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.213.805,64	Valor liberado do CFF:	R\$3.164.117,80
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$787.493,15	Valor liberado de acréscimos:	R\$766.193,87
Valor de aditivos de supressões:	R\$114.772,86	Valor descontado (supressões):	R\$114.772,86
% de aditivos de acréscimo:	24,50%	% de aditivos de supressão:	3,57%
Valor total final da obra:	R\$3.886.525,93	Valores totais liberados:	R\$3.815.538,81
Valores à liberar:	R\$70.987,12	% Executado (sobre o valor final):	98,17%
Área construída:	5.162,21 m ²	Desenvolvimento:	Rescindida

Situação da Obra:

Contrato rescindido em 30/01/2024.

Em elaboração levantamentos para conclusão dos serviços através dos contratos de manutenção.

Prazo estimado 120 dias.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW11cm9UUb3RhbCl6lU1OTEiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoiriYlslmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIiwidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO	set/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	B. CAMBORIÚ - Vara Família	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	23/2021	Reforma Global	
Data da Ordem de Serviço:	03/09/2021	Empresa Responsável:	3D Const. Comércio Ltda
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	29/08/2022
Prorrogação de prazo (dias):	182	Prazo de execução com prorrog.:	27/02/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$4.874.210,15	Valor liberado do CFF:	R\$1.473.925,64
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$457.207,63	Valor liberado de acréscimos:	R\$179.904,29
Valor de aditivos de supressões:	R\$302.997,69	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	9,38%	% de aditivos de supressão:	6,22%
Valor total final da obra:	R\$5.028.420,09	Valores totais liberados:	R\$1.653.829,93
Valores à liberar:	R\$3.374.590,16	% Executado (sobre o valor final):	32,89%
Área construída:	1.702,64 m ²	Desenvolvimento:	Rescindida

Situação da Obra:

Contrato rescindido em 17/01/2024.

Em elaboração projetos para realização de licitação com prazo estimado de 120 dias.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudWw1cm9Ub3RhbCI6JYwNzMiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoRyIstmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiixiwidGlwbYi6IiAilCJtb3N0cmFMaW5rlip0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO

set/24

Unidade Beneficiada:	S. AMARO DA IMPERATRIZ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	031/2023	Estabilização de talude	
Data da Ordem de Serviço:	12/07/2023	Empresa Responsável:	Freedom Eng. e Constr. Ltda.
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	08/01/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	08/01/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.817.542,87	Valor liberado do CFF:	R\$4.316,61
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.817.542,87	Valores totais liberados:	R\$4.316,61
Valores à liberar:	R\$1.813.226,26	% Executado (sobre o valor final):	0,24%
Área construída:	761,25 m ²	Desenvolvimento:	Rescindido.

Situação da Obra:

Contrato rescindido em função de novos deslizamentos que requereram alteração de projeto. SEI 0039602-56.2023.8.24.0710

Contrato para retomada já assinado. Aguardando Ordem de Serviço.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW11cm9Ub3RhbnRlcjYwNzUilCj0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIjSImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlwbyl6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	set/24
---	---------------

Unidade Beneficiada:	CAÇADOR	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	011/2023	Reforma parcial do Fórum - cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	12/06/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	240	Prazo de execução original:	07/02/2024
Prorrogação de prazo (dias):	78	Prazo de execução com prorrogação:	25/04/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.677.737,20	Valor liberado do CFF:	R\$1.677.737,20
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$7.695,17	Valor liberado de acréscimos:	R\$7.695,17
Valor de aditivos de supressões:	R\$9.342,98	Valor descontado (supressões):	R\$9.342,98
% de aditivos de acréscimo:	0,46%	% de aditivos de supressão:	0,56%
Valor total final da obra:	R\$1.676.089,39	Valores totais liberados:	R\$1.676.089,39
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1624,48 m ²	Desenvolvimento:	Concluída

Situação da Obra:

Recebida provisoriamente em 23/04/2024 e definitivamente em 12/07/2024.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudWw1cm9Ub3RhbCI6JYwMDMiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvJoiRyVlslmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwbyl6IIAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>


Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	set/24
---	---------------

Unidade Beneficiada:	SÃO JOSÉ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	052/2023	Reforma parcial (FORRO EXTERNO)	
Data da Ordem de Serviço:	21/11/2023	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	19/04/2024
Prorrogação de prazo (dias):	17	Prazo de execução com prorrog.:	06/05/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$635.458,38	Valor liberado do CFF:	R\$635.458,38
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$536,05	Valor liberado de acréscimos:	R\$536,05
Valor de aditivos de supressões:	R\$64.282,65	Valor descontado (supressões):	R\$64.282,65
% de aditivos de acréscimo:	0,08%	% de aditivos de supressão:	10,12%
Valor total final da obra:	R\$571.711,78	Valores totais liberados:	R\$571.711,78
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	5.510,46 m ²	Desenvolvimento:	Conclusa

Situação da Obra:

Recebida provisoriamente em 06/05/2024 e definitivamente em 02/08/2024.

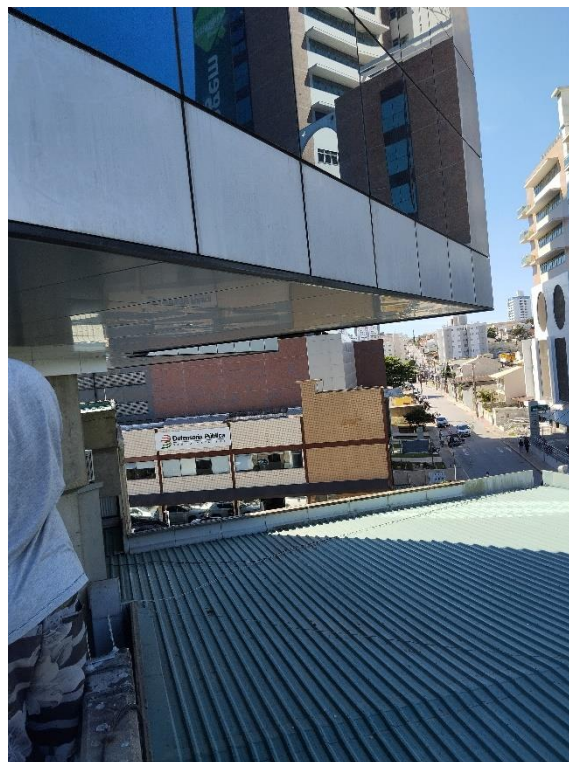

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudWw1cm9Ub3RhbCI6JYwNzgiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvljoiRylslmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlwbyl6IIiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO	set/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	LAGUNA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	041/2023	Reforma parcial - cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	11/09/2023	Empresa Responsável:	MDS - Soluções e Constr.
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	08/02/2024
Prorrogação de prazo (dias):	75	Prazo de execução com prorrog.:	23/04/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.048.355,76	Valor liberado do CFF:	R\$91.965,10
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$95.462,68	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$59.380,17	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	9,11%	% de aditivos de supressão:	5,66%
Valor total final da obra:	R\$1.084.438,27	Valores totais liberados:	R\$91.965,10
Valores à liberar:	R\$992.473,17	% Executado (sobre o valor final):	8,48%
Área construída:	3028,36 m ²	Desenvolvimento:	Em rescisão

Situação da Obra:

Obra paralisada desde 03/06/2024 conforme decisão no SEI 0006744-35.2024.8.24.0710 para rescisão contratual devido a problemas de responsabilidade da empresa executora da obra. Tomando-se as providências para medição final e verificação dos remanescentes para contratação da 2ª colocada do certame licitatório para conclusão da obra. Prazo estimado para retomada em 90 dias. Rescindida em 22/08/2024.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzIiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoIYyIsImFkbWwuaXN0cmFjYyW8iOixliwidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlFQ==>


Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	set/24
---	---------------

Unidade Beneficiada:	HERVAL D'OESTE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	60/2021	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	08/07/2021	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	28/06/2023
Prorrogação de prazo (dias):	347	Prazo de execução com prorrog.:	09/06/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$11.465.196,19	Valor liberado do CFF:	R\$11.465.196,19
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.118.323,79	Valor liberado de acréscimos:	R\$2.118.323,79
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.141.261,09	Valor descontado (supressões):	R\$1.141.261,09
% de aditivos de acréscimo:	18,48%	% de aditivos de supressão:	9,95%
Valor total final da obra:	R\$12.442.258,89	Valores totais liberados:	R\$12.442.258,89
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	3390,81 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 09/06/2024

Situação da Obra:

Recebida provisoriamente em 09/06/2024 em 30/09/2024.

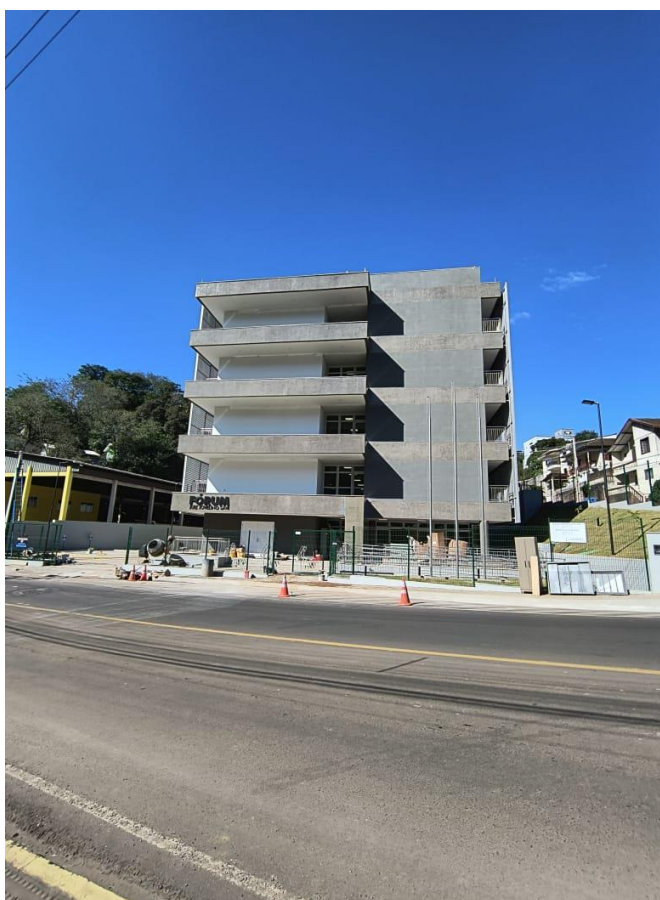

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudWw1cm9Ub3RhbCI6JlU2MzgiLCJ0aXBvQXZhbGhhY2FvIjoiriYlslmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxiiwidGlwbyl6IIiAilCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	set/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	JARAGUÁ DO SUL	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	006/2024	Reforma parcial - Adequação da rede de efluentes sanitários	
Data da Ordem de Serviço:	21/03/2024	Empresa Responsável:	B4 Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	60	Prazo de execução original:	20/05/2024
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrog.:	19/06/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$171.809,31	Valor liberado do CFF:	R\$171.809,31
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$171.809,31	Valores totais liberados:	R\$171.809,31
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	2.688,94 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 19/06/2024

Situação da Obra:

Recebida provisoriamente em 19/06/2024.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXZlZW5jaWEiOiIxMjMxIiwiaXZlcmNpY2VlIjoiaWVNCiIsIm51bWVybVl6IjYifQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD
set/24

Unidade Beneficiada:	SÃO JOSÉ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	008/2024	Reforma parcial (PPCI)	
Data da Ordem de Serviço:	12/04/2024	Empresa Responsável:	Strehl Sol em Engenharia
Prazo contratual (dias):	60	Prazo de execução original:	11/06/2024
Prorrogação de prazo (dias):	45	Prazo de execução com prorrogação:	26/07/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$253.378,62	Valor liberado do CFF:	R\$253.378,62
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$540,96	Valor liberado de acréscimos:	R\$540,96
Valor de aditivos de supressões:	R\$3.584,76	Valor descontado (supressões):	R\$3.584,76
% de aditivos de acréscimo:	0,21%	% de aditivos de supressão:	1,41%
Valor total final da obra:	R\$250.334,82	Valores totais liberados:	R\$250.334,82
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	5.510,46 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 19/07/2024

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 19/07/2024.


Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjZlZiZlcmNpY2l1joiMjAyNCIsIm51bWVybVl6IjgifQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	set/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	NORTE DA ILHA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	064/2023	Reforma parcial	
Data da Ordem de Serviço:	20/11/2023	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	19/03/2024
Prorrogação de prazo (dias):	167	Prazo de execução com prorrog.:	02/09/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$2.063.996,46	Valor liberado do CFF:	R\$1.497.206,63
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$156.765,69	Valor liberado de acréscimos:	R\$156.765,69
Valor de aditivos de supressões:	R\$21.621,09	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	7,60%	% de aditivos de supressão:	1,05%
Valor total final da obra:	R\$2.199.141,06	Valores totais liberados:	R\$1.653.972,32
Valores à liberar:	R\$545.168,74	% Executado (sobre o valor final):	75,21%
Área construída:	1.982,34 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 02/09/2024

Situação da Obra:

Recebida provisoriamente em 02/09/2024.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudWw1cm9Ub3RhbCI6JYxMzAilCj0aXBvQXZhbGlhY2FvJoiRylslmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxiiwidGlwbyl6IIAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	set/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	ITAPOÁ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	001/2024	Reforma parcial e ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	08/04/2024	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	05/09/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	05/09/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.089.859,74	Valor liberado do CFF:	R\$1.089.859,74
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.089.859,74	Valores totais liberados:	R\$1.089.859,74
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	380,36 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 05/09/2024

Situação da Obra:

Recebida provisoriamente em 05/09/2024.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjliwZlXhlcmlNpY2lvi0iMjAyNCIsIm51bWVybWVlIjEifQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2023	set/24
---	---------------

Obras iniciadas: 7
 Obras concluídas (TRP): 4
 Obras concluídas com TRD: 5
 Obras em andamento: 13
 Nº de obras no ano: 27

Valores Liberados:		
Janeiro	R\$	3.402.113,97
Fevereiro	R\$	3.783.394,96
Março	R\$	2.719.315,03
Abril	R\$	4.950.403,84
Maiο	R\$	4.028.791,77
Junho	R\$	5.881.623,85
Julho	R\$	3.703.519,80
Agosto	R\$	7.457.676,28
Setembro	R\$	1.566.254,10
Outubro	R\$	-
Novembro	R\$	-
Dezembro	R\$	-
Total	R\$	37.493.093,60



Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras:
<https://tjciusbr0.sharepoint.com/sites/TransparnciaObras/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparnciaObras%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FOBRAS%20EM%20ANDAMENTO&p=true&ga=1>

Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Diogo Coelho Rocha

Fábio Rogério Haupenthal

Matheus Erpen Benincá

Wilson Spornau Júnior

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Arquiteto:

João Marcos Corrêa

Data de atualização: 08/10/2024

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
