


RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mai/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	HERVAL D'OESTE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	60/2021	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	08/07/2021	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	28/06/2023
Prorrogação de prazo (dias):	347	Prazo de execução com prorrog.:	09/06/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$11.465.196,19	Valor liberado do CFF:	R\$10.506.910,56
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.118.323,79	Valor liberado de acréscimos:	R\$1.367.436,94
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.141.261,09	Valor descontado (supressões):	R\$986.238,72
% de aditivos de acréscimo:	18,48%	% de aditivos de supressão:	9,95%
Valor total final da obra:	R\$12.442.258,89	Valores totais liberados:	R\$10.888.108,78
Valores à liberar:	R\$1.554.150,11	% Executado (sobre o valor final):	87,51%
Área construída:	3390,81 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:

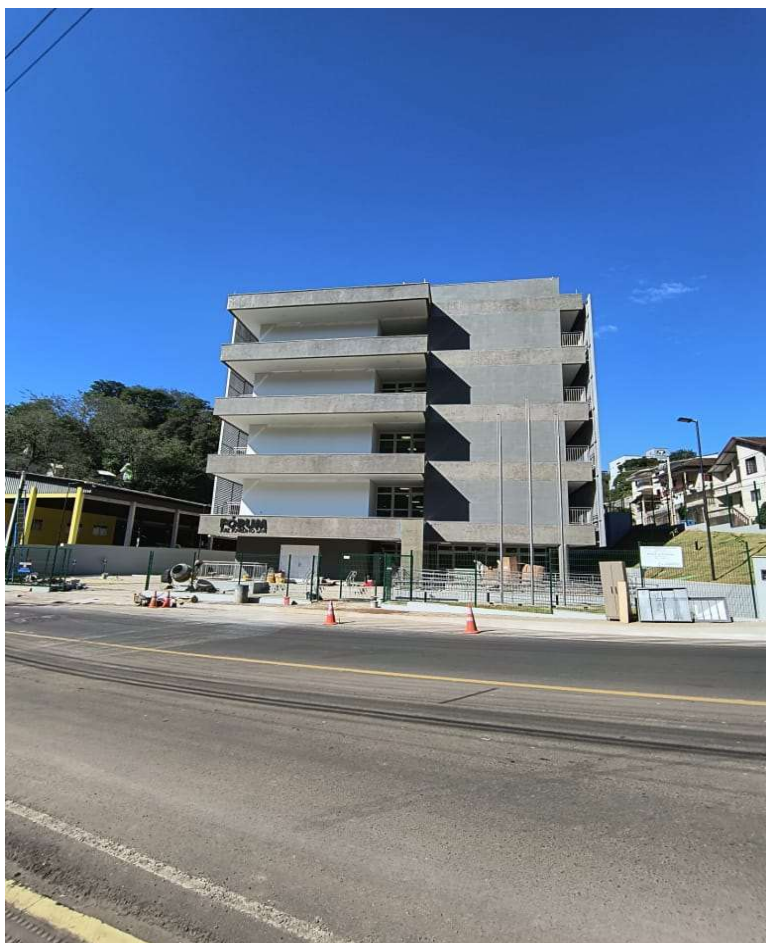

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tjsc.jus.br/transparencia/portal/#/consultar/licitacao/detalhes/licitacao/epuWV1LcmfUj3z91b0C0E1L2Mqg1Cm5Y8c0V2h0c0v7Fzj0e0h0mF3k0W0a0DmF7Y0B0i0x0w0d0w060AlCf0k3N0cmF0M0W0c0p0c0v0D0u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mai/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	IMBITUBA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	002/2022	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	04/03/2022	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi
Prazo contratual (dias):	960	Prazo de execução original:	19/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	19/10/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$19.801.812,59	Valor liberado do CFF:	R\$14.354.867,72
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.434.523,04	Valor liberado de acréscimos:	R\$421.838,97
Valor de aditivos de supressões:	R\$2.428.949,78	Valor descontado (supressões):	R\$1.720.098,76
% de aditivos de acréscimo:	12,29%	% de aditivos de supressão:	12,27%
Valor total final da obra:	R\$19.807.385,85	Valores totais liberados:	R\$13.056.607,93
Valores à liberar:	R\$6.750.777,92	% Executado (sobre o valor final):	65,92%
Área construída:	6.495,02 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

https://tjsc.tjma.jf.br/transparencia/jornal/consultar/obras/Sma/hu/licitacao/vydw11omfub3h0e0S04N/MLCDBXW0X2bGK727vjoR0cmP4wUuaNDcmf1TW80hWdG0wYv5d4L_CrB3NDcmfAMW5jG0v0W0

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mai/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	LAGUNA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	041/2023	Reforma parcial - cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	11/09/2023	Empresa Responsável:	MDS - Soluções e Constr.
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	08/02/2024
Prorrogação de prazo (dias):	75	Prazo de execução com prorrog.:	23/04/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.048.355,76	Valor liberado do CFF:	R\$91.965,10
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$95.462,68	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$59.380,17	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	9,11%	% de aditivos de supressão:	5,66%
Valor total final da obra:	R\$1.084.438,27	Valores totais liberados:	R\$91.965,10
Valores à liberar:	R\$992.473,17	% Executado (sobre o valor final):	8,48%
Área construída:	3028,36 m ²	Desenvolvimento:	Em rescisão

Situação da Obra:

Obra paralisada desde 03/06/2024 conforme decisão no SEI 0006744-35.2024.8.24.0710 para rescisão contratual devido a problemas de responsabilidade da empresa executora da obra. Tomando-se as providências para medição final e verificação dos remanescentes para contratação da 2ª colocada do certame licitatório para conclusão da obra. Prazo estimado para retomada em 90 dias.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsc.transparencia.portal.br/consultar/licitacao/detalhes/licitacao/rujuW3kmtU33h3b0G61e7a9z3LCPAYBv072b2G8Y7Zfje0h3m336waxXN0cmfYVW8Dk3id3G4by6EALC3D33M0cmfMxW53e0cnV9D3>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mai/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	NORTE DA ILHA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	064/2023	Reforma parcial	
Data da Ordem de Serviço:	20/11/2023	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	19/03/2024
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrogação:	17/06/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$2.063.996,46	Valor liberado do CFF:	R\$846.101,61
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$11.482,96	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,56%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$2.075.479,42	Valores totais liberados:	R\$846.101,61
Valores à liberar:	R\$1.229.377,81	% Executado (sobre o valor final):	40,77%
Área construída:	1.982,34 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/E/consultas/licitacao/detalhes/licitacao/evluW31cm9U338N6C9IVAMzAI:CF0aX8wQZ2hg8V2Fuj0jRy0mF43WUuXN0cmFWW8D0ixWdS6Wey6i6IAi:Cb31N0cmFAuW5rjg0civFDu>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mai/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	ITAPOÁ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	001/2024	Reforma parcial e ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	08/04/2024	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	05/09/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	05/09/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.089.859,74	Valor liberado do CFF:	R\$44.248,25
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.089.859,74	Valores totais liberados:	R\$44.248,25
Valores à liberar:	R\$1.045.611,49	% Executado (sobre o valor final):	4,06%
Área construída:	380,36 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjpc.tjma.jus.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJ0ZXF1ZS5uWE0hMzE1eTR0cm9pZ2U0a0RyYkRCQm51b29Wjy6SEEDQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mai/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	SÃO JOSÉ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	008/2024	Reforma parcial (FORRO EXTERNO)	
Data da Ordem de Serviço:	12/04/2024	Empresa Responsável:	Strehl Sol em Engenharia
Prazo contratual (dias):	60	Prazo de execução original:	11/06/2024
Prorrogação de prazo (dias):	45	Prazo de execução com prorrog.:	26/07/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$253.378,62	Valor liberado do CFF:	R\$84.851,41
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$253.378,62	Valores totais liberados:	R\$84.851,41
Valores à liberar:	R\$168.527,21	% Executado (sobre o valor final):	33,49%
Área construída:	5.510,46 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/traamaisrencia/portal/#/consultarContrato/consultarContrato/aviz2F32W5uW52DhMM4uW203om3m23uopM4uW03om314uW04u6g6Q2u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDA	mai/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	LAGES	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	020/2020	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	08/09/2020	Empresa Responsável:	Salver Const. Incorp.
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	02/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	305	Prazo de execução com prorrog.:	03/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.213.805,64	Valor liberado do CFF:	R\$3.164.117,80
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$787.493,15	Valor liberado de acréscimos:	R\$766.193,87
Valor de aditivos de supressões:	R\$114.772,86	Valor descontado (supressões):	R\$114.772,86
% de aditivos de acréscimo:	24,50%	% de aditivos de supressão:	3,57%
Valor total final da obra:	R\$3.886.525,93	Valores totais liberados:	R\$3.815.538,81
Valores à liberar:	R\$70.987,12	% Executado (sobre o valor final):	98,17%
Área construída:	5.162,21 m ²	Desenvolvimento:	Rescindida

Situação da Obra:

Contrato rescindido em 30/01/2024.

Em elaboração levantamentos para conclusão dos serviços através dos contratos de manutenção.

Prazo estimado 120 dias.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultarlicitacao/detalheslicitacao/epuWV1Lm6tUj381b0C0E1110TE1C70u38-CV726C0Y772j0u8-d0mE30W1uXN0mF7W80i1x0u1d0wbyd0i1C7m1N0mFMAW3r1p0c0v02u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

