
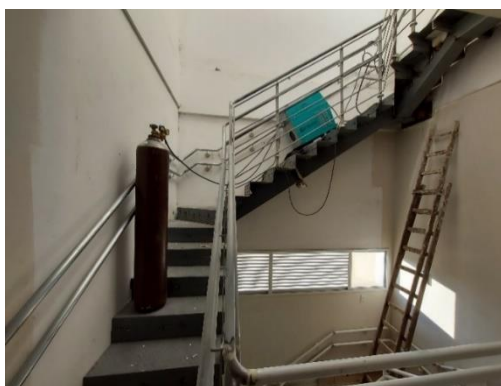


**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC - 2024**

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM RESCISÃO		ago/24	
Unidade Beneficiada:	<b>TIMBÓ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>050/2018</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	<b>763</b>	Prazo de execução com prorrog.:	30/06/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	<b>R\$16.235.823,18</b>
Valor de aditivos de acréscimo:	<b>R\$1.130.214,49</b>	Valor liberado de acréscimos:	<b>R\$984.080,00</b>
Valor de aditivos de supressões:	<b>R\$1.104.720,22</b>	Valor descontado (supressões):	<b>R\$1.104.720,22</b>
% de aditivos de acréscimo:	6,56%	% de aditivos de supressão:	6,41%
Valor total final da obra:	R\$17.253.917,55	Valores totais liberados:	<b>R\$16.115.182,96</b>
Valores à liberar:	R\$1.138.734,59	% Executado (sobre o valor final):	93,40%
Área construída:	6.857,59 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	<b>Paralisada</b>

Situação da Obra:

*Obra paralisada. Em procedimentos de rescisão contratual. Fórum inaugurado com serviços complementares através dos contratos de manutenção.*

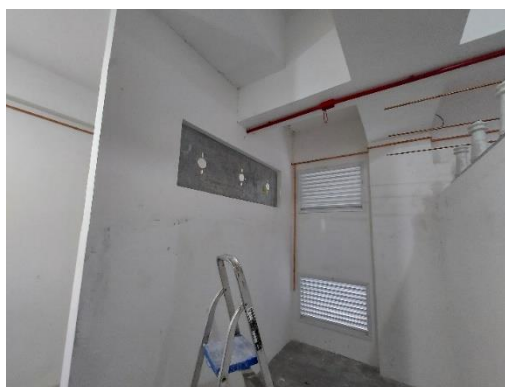

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/E/consultas/licitacao/detalhes/licitacao/evoluW11cmR1U3R9N6C9GQ3N2Y1C0X9XQZ7hG8V2F6j0qly0mF8W1uXN0XmFYW8G0i0w0i0L0C0R31N0cmF0uW50g0v0R0u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.







