



**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO** **jul/24**

Unidade Beneficiada:	<b>LAGES</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>020/2020</b>	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	08/09/2020	Empresa Responsável:	Salver Const. Incorp.
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	02/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	305	Prazo de execução com prorrog.:	03/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.213.805,64	Valor liberado do CFF:	R\$3.164.117,80
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$787.493,15	Valor liberado de acréscimos:	R\$766.193,87
Valor de aditivos de supressões:	R\$114.772,86	Valor descontado (supressões):	R\$114.772,86
% de aditivos de acréscimo:	24,50%	% de aditivos de supressão:	3,57%
Valor total final da obra:	R\$3.886.525,93	Valores totais liberados:	R\$3.815.538,81
Valores à liberar:	R\$70.987,12	% Executado (sobre o valor final):	98,17%
Área construída:	5.162,21 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Rescindida

Situação da Obra:

*Contrato rescindido em 30/01/2024.*

*Em elaboração levantamentos para conclusão dos serviços através dos contratos de manutenção.*

*Prazo estimado 120 dias.*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultarlicitacao/detalheslicitacao/epuW1LcmfuJb381b0C0E1110TE1C70u38-CV72G0Y772j0u8-d0mE30W-uXN0mF7W8i0i1x0i1d0wbyd0i0i1C7m1N0mFMAW3rj000v002u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.


<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO</b>	<b>jul/24</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>B. CAMBORIÚ - Vara Família</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>23/2021</b>	Reforma Global	
Data da Ordem de Serviço:	03/09/2021	Empresa Responsável:	3D Const. Comércio Ltda
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	29/08/2022
Prorrogação de prazo (dias):	182	Prazo de execução com prorrog.:	27/02/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$4.874.210,15	Valor liberado do CFF:	R\$1.473.925,64
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$457.207,63	Valor liberado de acréscimos:	R\$179.904,29
Valor de aditivos de supressões:	R\$302.997,69	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	9,38%	% de aditivos de supressão:	6,22%
Valor total final da obra:	R\$5.028.420,09	Valores totais liberados:	R\$1.653.829,93
Valores à liberar:	R\$3.374.590,16	% Executado (sobre o valor final):	32,89%
Área construída:	1.702,64 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Rescindida

Situação da Obra:

*Contrato rescindido em 17/01/2024.*

*Em elaboração projetos para realização de licitação com prazo estimado de 120 dias.*

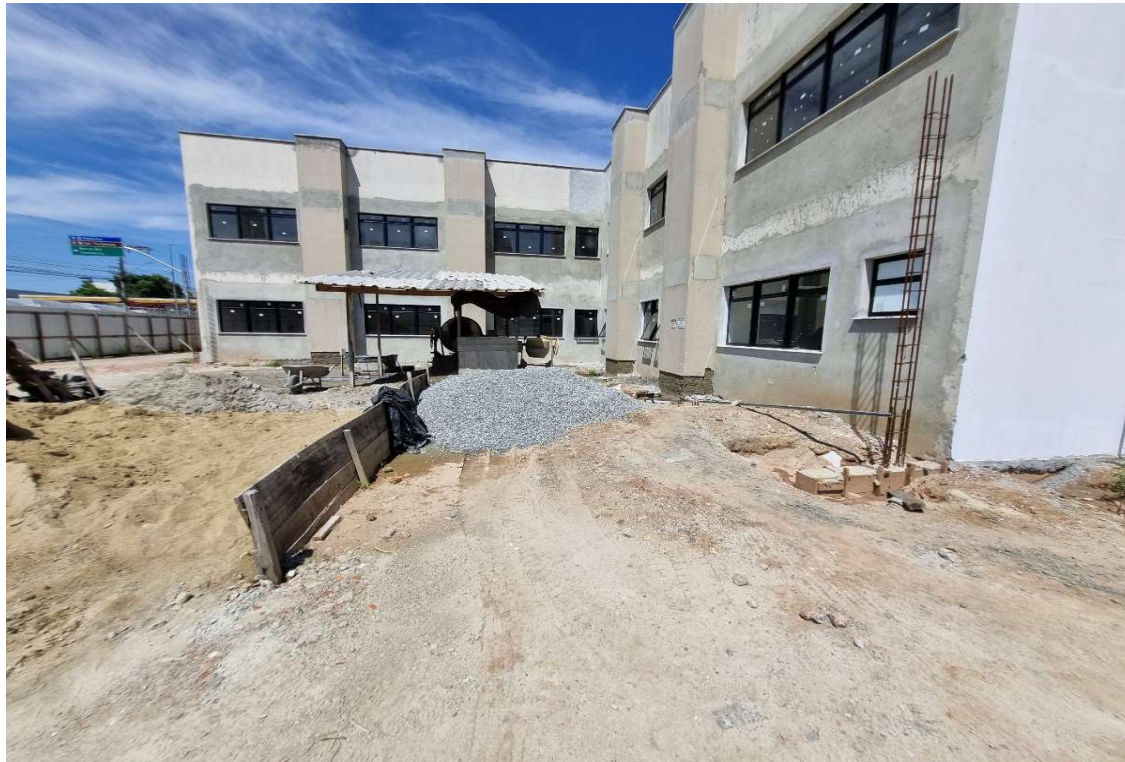

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsc.thema.inf.br/bramemrcia/portal/#/consultar/obras/geral/licitacao/evu0w11cm0b303b03lme0zMi1C0w8b0V0b0b0725j0b0j0f03k0w000mFY0B0D0w0d0b0j0l0j0Cmb300m0M0W0g000v0D0u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.



