
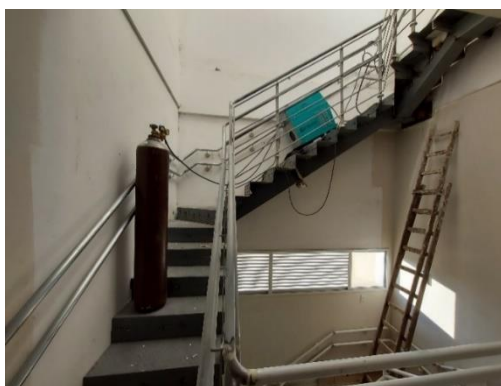


RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC - 2024

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM RESCISÃO		jul/24	
Unidade Beneficiada:	TIMBÓ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2018	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	763	Prazo de execução com prorrog.:	30/06/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	R\$16.235.823,18
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.130.214,49	Valor liberado de acréscimos:	R\$984.080,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.104.720,22	Valor descontado (supressões):	R\$1.104.720,22
% de aditivos de acréscimo:	6,56%	% de aditivos de supressão:	6,41%
Valor total final da obra:	R\$17.253.917,55	Valores totais liberados:	R\$16.115.182,96
Valores à liberar:	R\$1.138.734,59	% Executado (sobre o valor final):	93,40%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Paralisada

Situação da Obra:

Obra paralisada. Em procedimentos de rescisão contratual. Fórum inaugurado com serviços complementares através dos contratos de manutenção.

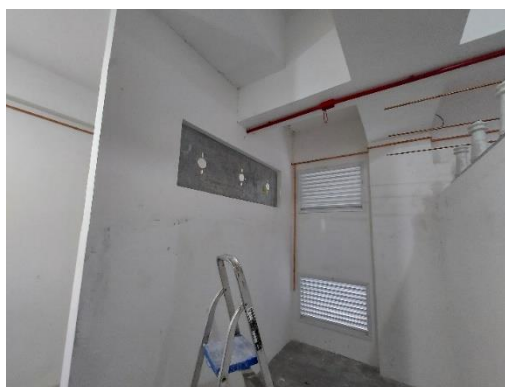

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbnCI6IjQ3NzYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjo1RyIjSlmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO

jul/24

Unidade Beneficiada:	LAGES	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	020/2020	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	08/09/2020	Empresa Responsável:	Salver Const. Incorp.
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	02/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	305	Prazo de execução com prorrog.:	03/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.213.805,64	Valor liberado do CFF:	R\$3.164.117,80
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$787.493,15	Valor liberado de acréscimos:	R\$766.193,87
Valor de aditivos de supressões:	R\$114.772,86	Valor descontado (supressões):	R\$114.772,86
% de aditivos de acréscimo:	24,50%	% de aditivos de supressão:	3,57%
Valor total final da obra:	R\$3.886.525,93	Valores totais liberados:	R\$3.815.538,81
Valores à liberar:	R\$70.987,12	% Executado (sobre o valor final):	98,17%
Área construída:	5.162,21 m ²	Desenvolvimento:	Rescindida

Situação da Obra:

Contrato rescindido em 30/01/2024.

Em elaboração levantamentos para conclusão dos serviços através dos contratos de manutenção.

Prazo estimado 120 dias.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW11cm9UUb3RhbCl6IjU1OTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiriYlslmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO

jul/24

Unidade Beneficiada:	B. CAMBORIÚ - Vara Família	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	23/2021	Reforma Global	
Data da Ordem de Serviço:	03/09/2021	Empresa Responsável:	3D Const. Comércio Ltda
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	29/08/2022
Prorrogação de prazo (dias):	182	Prazo de execução com prorrog.:	27/02/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$4.874.210,15	Valor liberado do CFF:	R\$1.473.925,64
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$457.207,63	Valor liberado de acréscimos:	R\$179.904,29
Valor de aditivos de supressões:	R\$302.997,69	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	9,38%	% de aditivos de supressão:	6,22%
Valor total final da obra:	R\$5.028.420,09	Valores totais liberados:	R\$1.653.829,93
Valores à liberar:	R\$3.374.590,16	% Executado (sobre o valor final):	32,89%
Área construída:	1.702,64 m ²	Desenvolvimento:	Rescindida

Situação da Obra:

Contrato rescindido em 17/01/2024.

Em elaboração projetos para realização de licitação com prazo estimado de 120 dias.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudWw1cm9Ub3RhbCI6JYwNzMiLCJ0aXBvQXZhbGhhY2FvIjoRyIstmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiixiwidGlwbyI6IiAilCJtb3N0cmFMaW5rlip0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO

jul/24

Unidade Beneficiada:	S. AMARO DA IMPERATRIZ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	031/2023	Estabilização de talude	
Data da Ordem de Serviço:	12/07/2023	Empresa Responsável:	Freedom Eng. e Constr. Ltda.
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	08/01/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	08/01/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.817.542,87	Valor liberado do CFF:	R\$4.316,61
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.817.542,87	Valores totais liberados:	R\$4.316,61
Valores à liberar:	R\$1.813.226,26	% Executado (sobre o valor final):	0,24%
Área construída:	761,25 m ²	Desenvolvimento:	Rescindido.

Situação da Obra:

Contrato rescindido em função de novos deslizamentos que requereram alteração de projeto. SEI 0039602-56.2023.8.24.0710

Contrato para retomada já assinado. Novo contrato 33/2024 já em andamento.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbnRlcjYwNzUuLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoRylsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlwbyl6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISAÇÃO	jul/24
---	---------------

Unidade Beneficiada:	LAGUNA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	041/2023	Reforma parcial - cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	11/09/2023	Empresa Responsável:	MDS - Soluções e Constr.
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	08/02/2024
Prorrogação de prazo (dias):	75	Prazo de execução com prorrog.:	23/04/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.048.355,76	Valor liberado do CFF:	R\$91.965,10
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$95.462,68	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$59.380,17	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	9,11%	% de aditivos de supressão:	5,66%
Valor total final da obra:	R\$1.084.438,27	Valores totais liberados:	R\$91.965,10
Valores à liberar:	R\$992.473,17	% Executado (sobre o valor final):	8,48%
Área construída:	3028,36 m ²	Desenvolvimento:	Em rescisão

Situação da Obra:

Obra paralisada desde 03/06/2024 conforme decisão no SEI 0006744-35.2024.8.24.0710 para rescisão contratual devido a problemas de responsabilidade da empresa executora da obra. Tomando-se as providências para medição final e verificação dos remanescentes para contratação da 2ª colocada do certame licitatório para conclusão da obra. Prazo estimado para retomada em 90 dias.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzIiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjo1RylsImFkbWluaXN0cmFjYXZlIiwidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
