

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			dez/19
Unidade Beneficiada:	<b>TIMBÓ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>050/2018</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	28/05/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	R\$6.771.746,08
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$17.228.423,28	Valores totais liberados:	R\$6.771.746,08
Valores à liberar:	R\$10.456.677,20	% Executado (sobre o valor final):	39,31%
Área construída:	6.857,59 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			dez/19
Unidade Beneficiada:	<b>RIO DO SUL</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>136/2018</b>	Retomada da construção do novo prédio do Fórum	
Data de Início da Obra:	08/10/2018	Empresa Responsável:	Estrutura Engenharia
Prazo contratual (dias):	660	Prazo de execução original:	29/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	29/07/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$18.876.331,19	Valor liberado do CFF:	R\$8.213.684,38
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.005.233,37	Valor liberado de acréscimos:	R\$631.187,15
Valor de aditivos de supressões:	R\$635.252,90	Valor descontado (supressões):	R\$111.286,32
% de aditivos de acréscimo:	5,33%	% de aditivos de supressão:	3,37%
Valor total final da obra:	R\$19.246.311,66	Valores totais liberados:	R\$8.733.585,21
Valores à liberar:	R\$10.512.726,45	% Executado (sobre o valor final):	45,38%
Área construída:	10.443,73 m²	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			dez/19	
Unidade Beneficiada:	<b>BLUMENAU - F. UNIVER.</b>	Tipo de Obra:		
Contrato nº:	<b>190/2018</b>	Reforma e Ampliação		
Data da Ordem de Serviço:	12/12/2018	Empresa Responsável:	Açu Constr. e Incorpor.	
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	07/12/2019	
Prorrogação de prazo (dias):	120	Prazo de execução com prorrog.:	05/04/2020	
Valor do CFF original da obra:	R\$1.100.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$1.090.739,63	
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$182.538,10	Valor liberado de acréscimos:	R\$178.166,34	
Valor de aditivos de supressões:	R\$21.552,45	Valor descontado (supressões):	R\$21.552,45	
% de aditivos de acréscimo:	16,59%	% de aditivos de supressão:	1,96%	
Valor total final da obra:	R\$1.260.985,65	Valores totais liberados:	R\$1.247.353,52	
Valores à liberar:	R\$13.632,13	% Executado (sobre o valor final):	98,92%	
Área construída:	2916,00 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.	

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			dez/19
Unidade Beneficiada:	<b>ANCHIETA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>210/2018</b>	Reforma e ampliação (acessibilidade e cercamento)	
Data da Ordem de Serviço:	29/01/2019	Empresa Responsável:	Tratare Construções
Prazo contratual (dias):	240	Prazo de execução original:	26/09/2019
Prorrogação de prazo (dias):	150	Prazo de execução com prorrog.:	23/02/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$672.041,16	Valor liberado do CFF:	R\$561.545,28
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$42.013,16	Valor liberado de acréscimos:	R\$42.013,16
Valor de aditivos de supressões:	R\$2.952,42	Valor descontado (supressões):	R\$2.952,42
% de aditivos de acréscimo:	6,25%	% de aditivos de supressão:	0,44%
Valor total final da obra:	R\$711.101,90	Valores totais liberados:	R\$600.606,02
Valores à liberar:	R\$110.495,88	% Executado (sobre o valor final):	84,46%
Área construída:	392,60 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>dez/19</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>BLUMENAU</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>55/2019</b>	Reforma global e ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	25/04/2019	Empresa Responsável:	Head Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	1200	Prazo de execução original:	07/08/2022
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	07/08/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$13.931.394,83	Valor liberado do CFF:	R\$943.270,58
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$90.859,76	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$20.130,85	Valor descontado (supressões):	R\$3.246,74
% de aditivos de acréscimo:	0,65%	% de aditivos de supressão:	0,14%
Valor total final da obra:	R\$14.002.123,74	Valores totais liberados:	R\$940.023,84
Valores à liberar:	R\$13.062.099,90	% Executado (sobre o valor final):	6,71%
Área construída:	10121,23 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>dez/19</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>PONTE SERRADA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>51/2019</b>	Reforma e ampliação para acessibilidade	
Data da Ordem de Serviço:	25/04/2019	Empresa Responsável:	Lupa Construções Ltda
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	22/10/2019
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	20/01/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$594.252,14	Valor liberado do CFF:	R\$545.582,25
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$64.104,40	Valor liberado de acréscimos:	R\$14.494,64
Valor de aditivos de supressões:	R\$33.173,83	Valor descontado (supressões):	R\$33.173,83
% de aditivos de acréscimo:	10,79%	% de aditivos de supressão:	5,58%
Valor total final da obra:	R\$625.182,71	Valores totais liberados:	R\$526.903,06
Valores à liberar:	R\$98.279,65	% Executado (sobre o valor final):	84,28%
Área construída:	340,00 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:

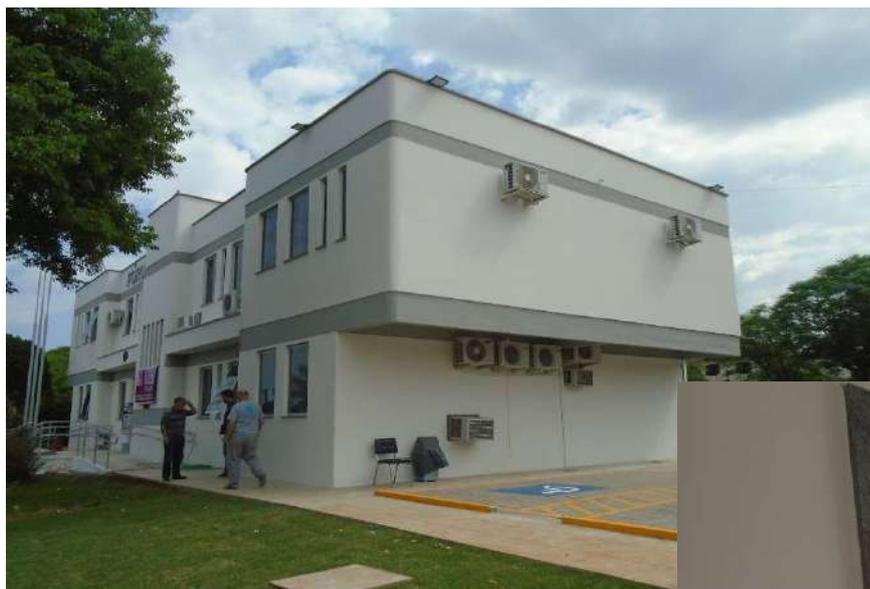

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>dez/19</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>CANOINHAS</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>105/2019</b>	Complementação do sistema de calefação	
Data da Ordem de Serviço:	05/07/2019	Empresa Responsável:	Giacomet Termo Metalúrgica
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	01/01/2020
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	01/03/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$721.943,23	Valor liberado do CFF:	R\$480.259,42
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$721.943,23	Valores totais liberados:	R\$480.259,42
Valores à liberar:	R\$241.683,81	% Executado (sobre o valor final):	66,52%
Área construída:	7.549,47 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			dez/19
Unidade Beneficiada:	<b>CRICIÚMA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>110/2019</b>	Reforma para adequação do preventivo contra incêndios	
Data da Ordem de Serviço:	02/07/2019	Empresa Responsável:	Viadupla Construções
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	30/10/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	30/10/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$574.735,82	Valor liberado do CFF:	R\$230.836,38
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$574.735,82	Valores totais liberados:	R\$230.836,38
Valores à liberar:	R\$343.899,44	% Executado (sobre o valor final):	40,16%
Área construída:	7.480,84 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>dez/19</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>FRAIBURGO</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>111/2019</b>	Reforma da cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	11/07/2019	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	08/11/2019
Prorrogação de prazo (dias):	120	Prazo de execução com prorrogação:	07/03/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$376.739,26	Valor liberado do CFF:	R\$346.828,04
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$49.456,13	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	13,13%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$426.195,39	Valores totais liberados:	R\$346.828,04
Valores à liberar:	R\$79.367,35	% Executado (sobre o valor final):	81,38%
Área construída:	1.421,32 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>dez/19</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>ITUPORANGA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>118/2019</b>	Reforma para adequação do preventivo contra incêndios	
Data da Ordem de Serviço:	10/07/2019	Empresa Responsável:	Projepower Constr. Empr.
Prazo contratual (dias):	60	Prazo de execução original:	08/09/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	08/09/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$74.431,77	Valor liberado do CFF:	R\$74.431,77
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$4.335,85	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	5,83%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$78.767,62	Valores totais liberados:	R\$74.431,77
Valores à liberar:	R\$4.335,85	% Executado (sobre o valor final):	94,50%
Área construída:	809,91 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra: Existe aditivo de serviços em tramitação



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>dez/19</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>ITAJAÍ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>115/2019</b>	Fornecimento e instalação de novos elevadores	
Data da Ordem de Serviço:	29/07/2019	Empresa Responsável:	Systec Serv. Man. Elev. Ltda
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	23/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	23/07/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$477.738,65	Valor liberado do CFF:	R\$174.457,39
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$477.738,65	Valores totais liberados:	R\$174.457,39
Valores à liberar:	R\$303.281,26	% Executado (sobre o valor final):	36,52%
Área construída:	7.480,84 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>dez/19</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>CONCÓRDIA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>160/2018</b>	Reforma dos brises da fachada da edificação	
Data da Ordem de Serviço:	24/07/2019	Empresa Responsável:	AZ Construções
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	21/12/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	21/12/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$276.770,81	Valor liberado do CFF:	R\$276.770,81
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$132.938,43	Valor liberado de acréscimos:	R\$15.999,81
Valor de aditivos de supressões:	R\$33.806,83	Valor descontado (supressões):	R\$26.503,90
% de aditivos de acréscimo:	48,03%	% de aditivos de supressão:	12,21%
Valor total final da obra:	R\$375.902,41	Valores totais liberados:	R\$266.266,72
Valores à liberar:	R\$109.635,69	% Executado (sobre o valor final):	70,83%
Área construída:	5.363,53 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>dez/19</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>INDAIAL</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>145/2019</b>	Reforma da cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	11/09/2019	Empresa Responsável:	Bortolon Arq. E Incorp. Ltda
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	09/01/2020
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrog.:	08/02/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$286.883,22	Valor liberado do CFF:	R\$235.267,92
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$286.883,22	Valores totais liberados:	R\$235.267,92
Valores à liberar:	R\$51.615,30	% Executado (sobre o valor final):	82,01%
Área construída:	1.370,67 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			dez/19
Unidade Beneficiada:	<b>IMBITUBA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>131/2019</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	17/10/2019	Empresa Responsável:	Head Engenharia Ltda EPP
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	01/10/2022
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	01/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$21.598.789,41	Valor liberado do CFF:	R\$128.873,96
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$21.598.789,41	Valores totais liberados:	R\$128.873,96
Valores à liberar:	R\$21.469.915,45	% Executado (sobre o valor final):	0,60%
Área construída:	6.857,59 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>dez/19</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>IBIRAMA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>169/2019</b>	Reforma da cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	18/11/2019	Empresa Responsável:	SCHAFFER & PIAZZA
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	17/03/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	17/03/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$334.932,79	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$334.932,79	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$334.932,79	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	1360,37 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>dez/19</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>SEARA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>142/2019</b>	Reforma parcial	
Data da Ordem de Serviço:	03/12/2019	Empresa Responsável:	Lupa Construções Ltda
Prazo contratual (dias):	240	Prazo de execução original:	30/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	30/07/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$859.714,26	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$859.714,26	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$859.714,26	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	1016,84 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>dez/19</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>CAPITAL - RID SILVA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>147/2019</b>	Instalação de plataforma elevatória	
Data da Ordem de Serviço:	09/12/2019	Empresa Responsável:	Lupa Construções Ltda
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	07/05/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	07/05/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$100.093,58	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$100.093,58	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$100.093,58	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	1016,84 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:

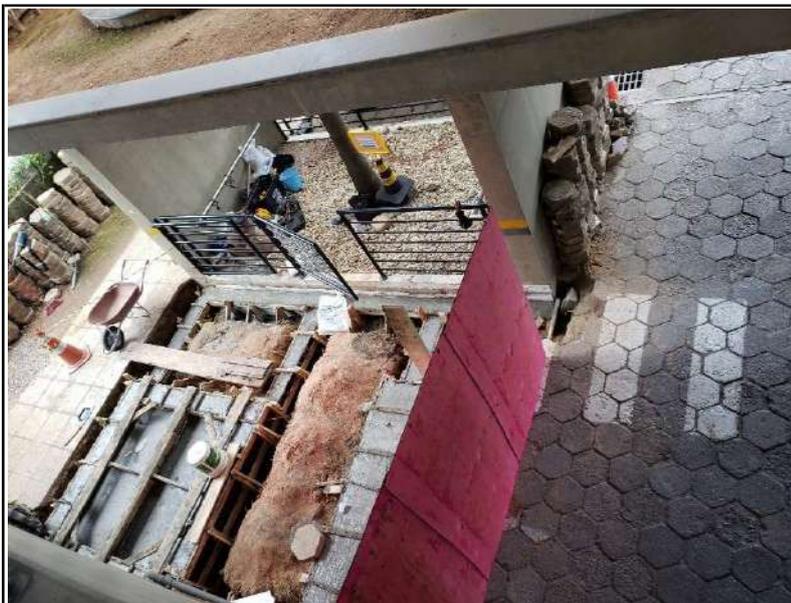

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA** **dez/19**

Unidade Beneficiada:	<b>NAVEGANTES</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>060/2014</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	08/05/2014	Empresa Responsável:	Concretel Construções
Prazo contratual (dias):	900	Prazo de execução original:	24/10/2016
Prorrogação de prazo (dias):	343	Prazo de execução com prorrogação:	02/10/2017
Valor do CFF original da obra:	R\$16.324.488,52	Valor liberado do CFF:	R\$15.132.538,91
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.374.367,71	Valor liberado de acréscimos:	R\$1.324.747,06
Valor de aditivos de supressões:	R\$446.134,44	Valor descontado (supressões):	R\$446.134,44
% de aditivos de acréscimo:	8,42%	% de aditivos de supressão:	2,73%
Valor total final da obra:	R\$17.252.721,79	Valores totais liberados:	R\$16.011.151,53
Valores à liberar:	R\$1.241.570,26	% Executado (sobre o valor final):	92,80%
Área construída:	6.857,59 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Obra rescindida

Situação da Obra:

*A empresa Concretel paralisou a obra por duas vezes sem comunicação prévia ao TJSC.*

*Em 02/08/2018 foi entregue à empresa Concretel a Ordem de Paralisação emitida pela Presidência do TJSC.*

*O contrato foi rescindido em 14/01/2019.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>dez/19</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>ARQ. CENTRAL - ARIRIÚ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>082/2015</b>	Reforma global do prédio do Arquivo Central - Aririú - Palhoça	
Data da Ordem de Serviço:	30/06/2015	Empresa Responsável:	Concretil Construções
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	24/06/2016
Prorrogação de prazo (dias):	451	Prazo de execução com prorrog.:	18/09/2017
Valor do CFF original da obra:	R\$14.516.133,80	Valor liberado do CFF:	R\$14.516.133,80
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.338.940,99	Valor liberado de acréscimos:	R\$2.338.940,99
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.624.480,32	Valor descontado (supressões):	R\$1.624.480,32
% de aditivos de acréscimo:	16,11%	% de aditivos de supressão:	11,19%
Valor total final da obra:	R\$15.230.594,47	Valores totais liberados:	R\$15.230.594,47
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	8.851,78 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 10/07/2018

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 10/07/2018 e definitivamente em 13/05/2019.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>dez/19</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>ITAJAÍ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>207/2017</b>	Reforma do prédio do Fórum - escadria e átrio do Salão do Júri	
Data da Ordem de Serviço:	14/02/2018	Empresa Responsável:	Raccio Eng. E Construções
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	15/05/2018
Prorrogação de prazo (dias):	50	Prazo de execução com prorrog.:	04/07/2018
Valor do CFF original da obra:	R\$218.759,25	Valor liberado do CFF:	R\$218.759,25
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$218.759,25	Valores totais liberados:	R\$218.759,25
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	7.480,84 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 30/08/2018

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 30/08/2018 e difinitivamente em 03/05/2019.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>dez/19</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>LAGUNA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>032/2018</b>	Reforma parcial do prédio do Fórum (porta giratória e PPCI)	
Data da Ordem de Serviço:	22/03/2018	Empresa Responsável:	Basecom Const. Cívica
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	20/06/2018
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	18/09/2018
Valor do CFF original da obra:	R\$123.157,43	Valor liberado do CFF:	R\$123.157,43
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.554,51	Valor liberado de acréscimos:	R\$2.554,51
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	2,07%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$125.711,94	Valores totais liberados:	R\$125.711,94
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	3.028,36 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 06/11/2018

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 06/11/2018 e definitivamente em 29/01/2019.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>dez/19</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>TJSC</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>105/2018</b>	Nova iluminação do estacionamento coberto das Torres I e II	
Data da Ordem de Serviço:	28/08/2018	Empresa Responsável:	Solar Eng. E Projetos
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	26/11/2018
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	26/11/2018
Valor do CFF original da obra:	R\$66.380,01	Valor liberado do CFF:	R\$66.380,01
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$66.380,01	Valores totais liberados:	R\$66.380,01
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	26.717,00 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 19/11/2018

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 19/11/2018 e definitivamente em 03/06/2019.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>dez/19</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>ALMOX. CENT. E GRÁF.</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>Empenho 2018NE004703</b>	Instalação do sistema de alarme de intrusão	
Data da Ordem de Serviço:	29/10/2018	Empresa Responsável:	Estratégia IT
Prazo contratual (dias):	45	Prazo de execução original:	13/12/2018
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	13/12/2018
Valor do CFF original da obra:	R\$57.499,23	Valor liberado do CFF:	R\$57.499,23
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$57.499,23	Valores totais liberados:	R\$57.499,23
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	4.109,52 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 14/11/2018

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 14/11/2018 e definitivamente em 15/02/2019.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>dez/19</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>JOAÇABA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>059/2018</b>	Reforma parcial (esquadrias)	
Data da Ordem de Serviço:	16/05/2018	Empresa Responsável:	AZ Construções
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	12/11/2018
Prorrogação de prazo (dias):	45	Prazo de execução com prorrog.:	27/12/2018
Valor do CFF original da obra:	R\$246.908,22	Valor liberado do CFF:	R\$246.908,22
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$28.686,34	Valor liberado de acréscimos:	R\$28.686,34
Valor de aditivos de supressões:	R\$14.207,70	Valor descontado (supressões):	R\$14.207,70
% de aditivos de acréscimo:	11,62%	% de aditivos de supressão:	5,75%
Valor total final da obra:	R\$261.386,86	Valores totais liberados:	R\$261.386,86
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	2.624,08 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 27/12/2018

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 27/12/2018 e definitivamente em 18/05/2019.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>dez/19</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>TIJUCAS</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>064/2018</b>	Reforma parcial (cercamento e urbanização)	
Data da Ordem de Serviço:	21/05/2018	Empresa Responsável:	Berkana Prest. Serv. e Com.
Prazo contratual (dias):	210	Prazo de execução original:	17/12/2018
Prorrogação de prazo (dias):	75	Prazo de execução com prorrog.:	02/03/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$340.391,93	Valor liberado do CFF:	R\$340.391,93
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$39.164,85	Valor liberado de acréscimos:	R\$39.164,85
Valor de aditivos de supressões:	R\$16.009,99	Valor descontado (supressões):	R\$16.009,99
% de aditivos de acréscimo:	11,51%	% de aditivos de supressão:	4,70%
Valor total final da obra:	R\$363.546,79	Valores totais liberados:	R\$363.546,79
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	924,46 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 28/02/2019

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 28/02/2019 e definitivamente em 27/05/2019.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>dez/19</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>CHAPECÓ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>158/2018</b>	Ampliação da climatização tipo VRV do prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	31/10/2018	Empresa Responsável:	Termale Eng. E Climatização
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	28/02/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	28/02/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$351.299,09	Valor liberado do CFF:	R\$351.299,09
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$351.299,09	Valores totais liberados:	R\$351.299,09
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	7.737,00 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 28/02/2019

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 28/02/2019 e definitivamente em 21/05/2019.*



*Fiscalização com auxílio de profissionais da DMCO*

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>dez/19</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>JOINVILLE - F. Fazendário</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>29/2019</b>	Ligação da rede de esgoto	
Data da Ordem de Serviço:	14/03/2019	Empresa Responsável:	AZ Construções
Prazo contratual (dias):	30	Prazo de execução original:	13/04/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	13/04/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$67.258,14	Valor liberado do CFF:	R\$67.258,14
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$67.258,14	Valores totais liberados:	R\$67.258,14
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	xxx m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 12/04/2019

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 12/04/2019 e definitivamente em 11/07/2019.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>dez/19</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>IBIRAMA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>194/2018</b>	Reforma: contenção de taludes	
Data da Ordem de Serviço:	09/01/2019	Empresa Responsável:	JC Constr. E Pavimentações
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	09/04/2019
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	08/06/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$201.551,84	Valor liberado do CFF:	R\$201.551,84
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$21.947,71	Valor liberado de acréscimos:	R\$21.947,71
Valor de aditivos de supressões:	R\$3.490,20	Valor descontado (supressões):	R\$3.490,20
% de aditivos de acréscimo:	10,89%	% de aditivos de supressão:	1,73%
Valor total final da obra:	R\$220.009,35	Valores totais liberados:	R\$220.009,35
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1360,37 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 08/06/2019

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 08/06/2019 e definitivamente em 08/11/2019.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>dez/19</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>INDAIAL</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>54/2019</b>	Ligação da rede de esgoto	
Data da Ordem de Serviço:	21/03/2019	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	30	Prazo de execução original:	20/04/2019
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	19/06/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$43.602,06	Valor liberado do CFF:	R\$43.602,06
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$822,58	Valor liberado de acréscimos:	R\$822,58
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	1,89%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$44.424,64	Valores totais liberados:	R\$44.424,64
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1360,37 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 19/06/2019

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 19/06/2019 e definitivamente em 29/10/2019*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>dez/19</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>TUBARÃO</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>137/2017</b>	Reforma global do prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	04/09/2017	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi
Prazo contratual (dias):	540	Prazo de execução original:	26/02/2019
Prorrogação de prazo (dias):	150	Prazo de execução com prorrog.:	26/07/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$2.958.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$2.958.000,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$785.948,69	Valor liberado de acréscimos:	R\$785.948,69
Valor de aditivos de supressões:	R\$241.349,13	Valor descontado (supressões):	R\$241.349,13
% de aditivos de acréscimo:	26,57%	% de aditivos de supressão:	8,16%
Valor total final da obra:	R\$3.502.599,56	Valores totais liberados:	R\$3.502.599,56
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	5.213,66 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 10/07/2019

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 10/07/2019 e definitivamente em 08/10/2019*




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: OBRA CONCLUÍDA</b>	<b>dez/19</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>Torre I - Torre II</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>196/2018</b>	Reforma das passarelas de ligação	
Data da Ordem de Serviço:	07/01/2019	Empresa Responsável:	Construtora De Angelo
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	06/07/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	06/07/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$628.683,81	Valor liberado do CFF:	R\$84.303,37
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$628.683,81	Valores totais liberados:	R\$84.303,37
Valores à liberar:	R\$544.380,44	% Executado (sobre o valor final):	13,41%
Área construída:	26717,00 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Rescindida

Situação da Obra:

*Obra rescindida, visto que a empresa Tecon, responsável pela construção da Torre II assumiu os serviços em função de patologias construtivas encontradas após o início da obra. Obra concluída pela empresa Tecon em setembro de 2019.*

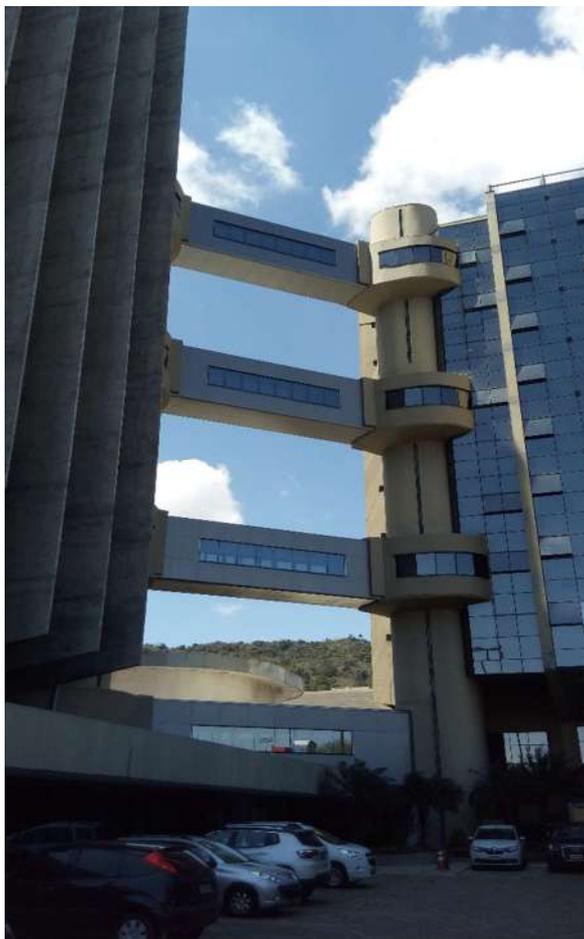

*Fiscalização com auxílio de profissionais da DMTJ*

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD</b>	<b>dez/19</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>TJSC - Torre II</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>180/2018</b>	Reforma da Torre II para remoção de brises, etc	
Data da Ordem de Serviço:	20/12/2018	Empresa Responsável:	Gefisa Const Incorpor Ltda
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	19/05/2019
Prorrogação de prazo (dias):	120	Prazo de execução com prorrog.:	16/09/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$862.332,64	Valor liberado do CFF:	R\$862.332,64
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$862.332,64	Valores totais liberados:	R\$862.332,64
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	13.100,00 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Recebida provisoriamente

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 28/10/2019*



*Fiscalização com auxílio de profissionais da DMTJ*

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD</b>	<b>dez/19</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>76/2019</b>	Construção de muro de contenção e cercamento	
Data da Ordem de Serviço:	24/04/2019	Empresa Responsável:	Formatto Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	21/10/2019
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	20/12/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$680.144,59	Valor liberado do CFF:	R\$680.144,59
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$7.968,28	Valor liberado de acréscimos:	R\$7.968,28
Valor de aditivos de supressões:	R\$5.946,33	Valor descontado (supressões):	R\$5.946,33
% de aditivos de acréscimo:	1,17%	% de aditivos de supressão:	0,87%
Valor total final da obra:	R\$682.166,54	Valores totais liberados:	R\$682.166,54
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	5693,66 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 02/12/2019

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 02/12/2019.*



*Fiscalização com auxílio de profissionais da DPRO*

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD</b>	<b>dez/19</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>NAVEGANTES</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>098/2019</b>	Conclusão da obra do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	16/05/2019	Empresa Responsável:	JM Gato Constr. Incorp. Ltda
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	12/11/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	12/11/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$2.160.205,26	Valor liberado do CFF:	R\$2.160.205,26
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$2.160.205,26	Valores totais liberados:	R\$2.160.205,26
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	6.857,59 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 12/11/2019

Situação da Obra:

*O Contrato 098/2019 trata da conclusão da obra de construção do novo Fórum de Navegantes que foi iniciada pela empresa Concretel Construções através do Contrato 060/2014 (rescindido). Obra recebida provisoriamente em 12/11/2019.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2019**
**dez/19**

Obras iniciadas:	20
Obras concluídas (TRP):	3
Obras concluídas com TRD:	13
Obras paralisadas/rescindidas:	1
Obras em andamento:	17
Nº de obras no ano:	34

Valores Liberados:		
Janeiro	R\$	1.078.472,28
Fevereiro	R\$	1.153.428,32
Março	R\$	1.343.153,96
Abril	R\$	1.026.901,50
Maió	R\$	1.763.025,74
Junho	R\$	2.169.752,87
Julho	R\$	2.604.457,20
Agosto	R\$	3.062.188,12
Setembro	R\$	2.591.636,09
Outubro	R\$	2.831.439,69
Novembro	R\$	3.384.650,47
Dezembro	R\$	1.089.741,29
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>24.098.847,53</b>



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

*André da Silva*

*Cristiane Batista Tatavitto*

*Diogo Coelho Rocha*

*Herlei José Cantú*

*Rafael Gonzaga Lima*

*Wilson Spornau Júnior*

Engenheiros Eletricistas:

*Nilton Albieri Ferreira*

*Rodrigo André Machado*

Engenheiro Mecânico:

*Robson da Silva*

**Data de atualização:** 10/01/2020

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
