

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		jun/20	
Unidade Beneficiada:	TIMBÓ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2018	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	28/05/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	R\$7.916.233,71
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$157.059,61	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$165.713,66	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,91%	% de aditivos de supressão:	0,96%
Valor total final da obra:	R\$17.219.769,23	Valores totais liberados:	R\$7.916.233,71
Valores à liberar:	R\$9.303.535,52	% Executado (sobre o valor final):	45,97%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		jun/20	
Unidade Beneficiada:	RIO DO SUL	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	136/2018	Retomada da construção do novo prédio do Fórum	
Data de Início da Obra:	08/10/2018	Empresa Responsável:	Estrutura Engenharia
Prazo contratual (dias):	660	Prazo de execução original:	29/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	29/07/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$18.876.331,19	Valor liberado do CFF:	R\$16.275.970,58
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$3.324.560,32	Valor liberado de acréscimos:	R\$1.954.686,25
Valor de aditivos de supressões:	R\$2.707.312,81	Valor descontado (supressões):	R\$2.707.312,81
% de aditivos de acréscimo:	17,61%	% de aditivos de supressão:	14,34%
Valor total final da obra:	R\$19.493.578,70	Valores totais liberados:	R\$15.523.344,02
Valores à liberar:	R\$3.970.234,68	% Executado (sobre o valor final):	79,63%
Área construída:	10.443,73 m ²	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		jun/20	
Unidade Beneficiada:	ANCHIETA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	210/2018	Reforma e ampliação (acessibilidade e cercamento)	
Data da Ordem de Serviço:	29/01/2019	Empresa Responsável:	Tratare Construções
Prazo contratual (dias):	240	Prazo de execução original:	26/09/2019
Prorrogação de prazo (dias):	178	Prazo de execução com prorrog.:	22/03/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$672.041,16	Valor liberado do CFF:	R\$569.902,96
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$100.723,47	Valor liberado de acréscimos:	R\$99.957,78
Valor de aditivos de supressões:	R\$85.082,41	Valor descontado (supressões):	R\$5.865,51
% de aditivos de acréscimo:	14,99%	% de aditivos de supressão:	12,66%
Valor total final da obra:	R\$687.682,22	Valores totais liberados:	R\$663.995,23
Valores à liberar:	R\$23.686,99	% Executado (sobre o valor final):	96,56%
Área construída:	392,60 m ²	Desenvolvimento:	Aguardando documentação.

Situação da Obra:


Obra concluída e aguardando documentação para emissão do Termo de Recebimento Provisório.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		jun/20	
Unidade Beneficiada:	BLUMENAU	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	55/2019	Reforma global e ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	25/04/2019	Empresa Responsável:	Head Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	1200	Prazo de execução original:	07/08/2022
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	07/08/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$13.931.394,83	Valor liberado do CFF:	R\$1.257.938,31
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$191.167,43	Valor liberado de acréscimos:	R\$64.421,20
Valor de aditivos de supressões:	R\$74.761,33	Valor descontado (supressões):	R\$3.246,74
% de aditivos de acréscimo:	1,37%	% de aditivos de supressão:	0,54%
Valor total final da obra:	R\$14.047.800,93	Valores totais liberados:	R\$1.319.112,77
Valores à liberar:	R\$12.728.688,16	% Executado (sobre o valor final):	9,39%
Área construída:	10121,23 m²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:

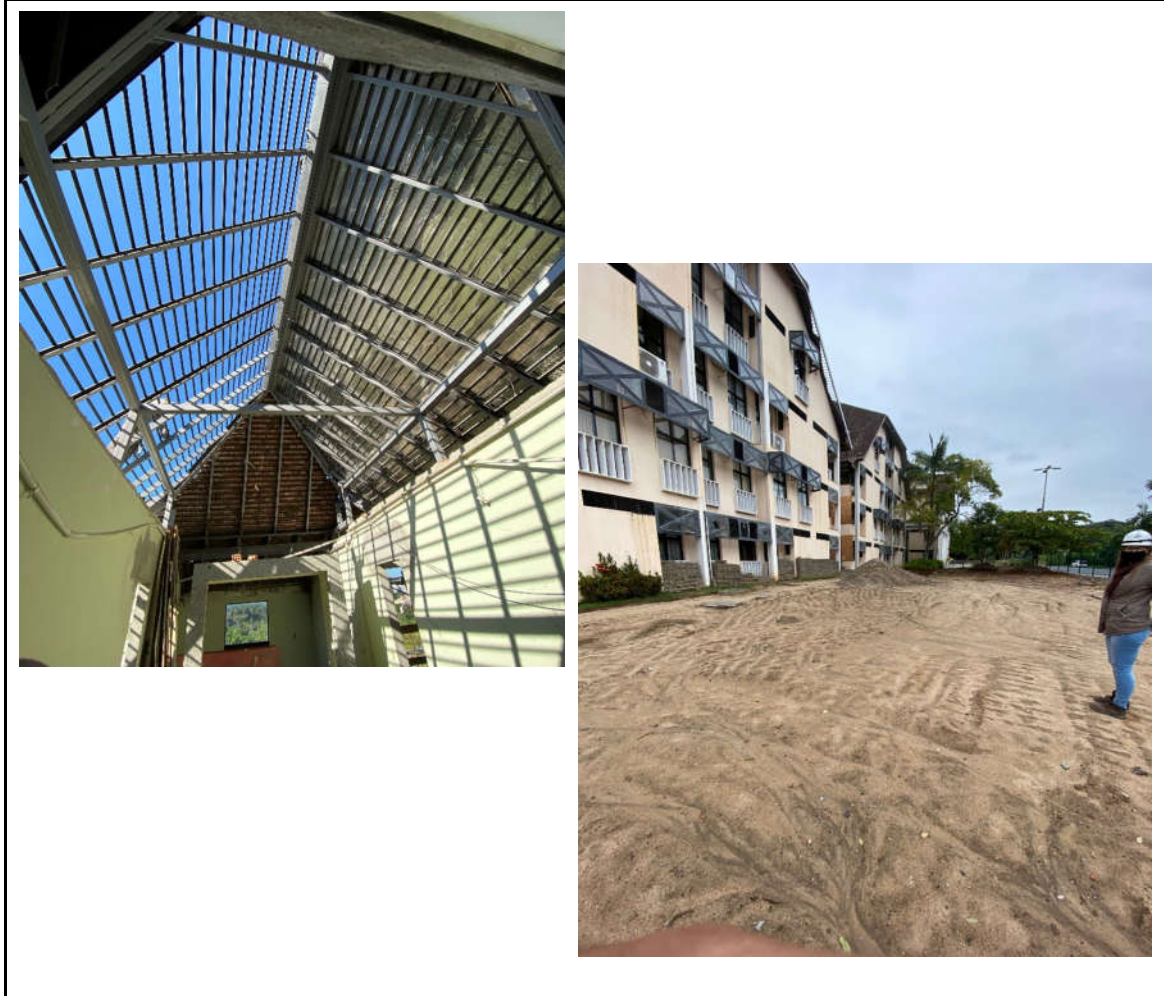

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jun/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CANOINHAS	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	105/2019	Complementação do sistema de calefação	
Data da Ordem de Serviço:	05/07/2019	Empresa Responsável:	Giacomet Termo Metalúrgica
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	01/01/2020
Prorrogação de prazo (dias):	180	Prazo de execução com prorrog.:	29/06/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$721.943,23	Valor liberado do CFF:	R\$637.987,19
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$87.676,83	Valor liberado de acréscimos:	R\$87.676,83
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	12,14%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$809.620,06	Valores totais liberados:	R\$725.664,02
Valores à liberar:	R\$83.956,04	% Executado (sobre o valor final):	89,63%
Área construída:	7.549,47 m ²	Desenvolvimento:	Aguardando documentação.

Situação da Obra:

Obra concluída e aguardando documentação para emissão do Termo de Recebimento Provisório.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			jun/20
Unidade Beneficiada:	CRICIÚMA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	110/2019	Reforma para adequação do preventivo contra incêndios	
Data da Ordem de Serviço:	02/07/2019	Empresa Responsável:	Viadupla Construções
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	30/10/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	30/10/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$574.735,82	Valor liberado do CFF:	R\$464.360,16
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$574.735,82	Valores totais liberados:	R\$464.360,16
Valores à liberar:	R\$110.375,66	% Executado (sobre o valor final):	80,80%
Área construída:	7.480,84 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		jun/20	
Unidade Beneficiada:	ITUPORANGA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	118/2019	Reforma para adequação do preventivo contra incêndios	
Data da Ordem de Serviço:	10/07/2019	Empresa Responsável:	Projepower Constr. Empr.
Prazo contratual (dias):	60	Prazo de execução original:	08/09/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	08/09/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$74.431,77	Valor liberado do CFF:	R\$74.431,77
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$4.335,85	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	5,83%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$78.767,62	Valores totais liberados:	R\$74.431,77
Valores à liberar:	R\$4.335,85	% Executado (sobre o valor final):	94,50%
Área construída:	809,91 m ²	Desenvolvimento:	Aguardando vistoria

Situação da Obra:

Aguardando vistoria do CBMSC



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jun/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	ITAJAÍ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	115/2019	Fornecimento e instalação de novos elevadores	
Data da Ordem de Serviço:	29/07/2019	Empresa Responsável:	Systec Serv. Man. Elev. Ltda
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	23/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	23/07/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$477.738,65	Valor liberado do CFF:	R\$210.054,78
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$477.738,65	Valores totais liberados:	R\$210.054,78
Valores à liberar:	R\$267.683,87	% Executado (sobre o valor final):	43,97%
Área construída:	7.480,84 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jun/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	IMBITUBA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	131/2019	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	17/10/2019	Empresa Responsável:	Head Engenharia Ltda EPP
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	01/10/2022
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	01/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$21.598.789,41	Valor liberado do CFF:	R\$1.052.064,89
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$21.598.789,41	Valores totais liberados:	R\$1.052.064,89
Valores à liberar:	R\$20.546.724,52	% Executado (sobre o valor final):	4,87%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		jun/20	
Unidade Beneficiada:	SEARA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	142/2019	Reforma parcial	
Data da Ordem de Serviço:	03/12/2019	Empresa Responsável:	Lupa Construções Ltda
Prazo contratual (dias):	240	Prazo de execução original:	30/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrog.:	29/08/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$859.714,26	Valor liberado do CFF:	R\$708.735,79
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$19.916,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	2,32%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$879.630,26	Valores totais liberados:	R\$708.735,79
Valores à liberar:	R\$170.894,47	% Executado (sobre o valor final):	80,57%
Área construída:	1016,84 m ²	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jun/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	URUBICI	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	188/2019	Reforma da cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	17/01/2020	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	16/05/2020
Prorrogação de prazo (dias):	62	Prazo de execução com prorrog.:	17/07/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$317.747,13	Valor liberado do CFF:	R\$148.782,89
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$18.672,33	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$493,40	Valor descontado (supressões):	R\$493,40
% de aditivos de acréscimo:	5,88%	% de aditivos de supressão:	0,16%
Valor total final da obra:	R\$335.926,06	Valores totais liberados:	R\$148.289,49
Valores à liberar:	R\$187.636,57	% Executado (sobre o valor final):	44,14%
Área construída:	724,98 m ²	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jun/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	TUBARÃO	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	211/2019	Climatização das áreas comuns.	
Data da Ordem de Serviço:	27/01/2020	Empresa Responsável:	Termsul Eng. e Serv. Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	26/04/2020
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	25/06/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$423.327,53	Valor liberado do CFF:	R\$371.738,31
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$41.251,64	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	9,74%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$464.579,17	Valores totais liberados:	R\$371.738,31
Valores à liberar:	R\$92.840,86	% Executado (sobre o valor final):	80,02%
Área construída:	5213,69 m ²	Desenvolvimento:	Aguardando documentação.

Situação da Obra:

Obra concluída e aguardando documentação para emissão do Termo de Recebimento Provisório.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD **jun/20**

Unidade Beneficiada:	TJSC - Torre II	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	180/2018	Reforma da Torre II para remoção de brises, etc	
Data da Ordem de Serviço:	20/12/2018	Empresa Responsável:	Gefisa Const Incorpor Ltda
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	19/05/2019
Prorrogação de prazo (dias):	120	Prazo de execução com prorrog.:	16/09/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$862.332,64	Valor liberado do CFF:	R\$862.332,64
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$862.332,64	Valores totais liberados:	R\$862.332,64
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	13.100,00 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 28/10/2019

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 28/10/2019



Fiscalização com auxílio de profissionais da DMTJ

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA		jun/20	
Unidade Beneficiada:	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	76/2019	Construção de muro de contenção e cercamento	
Data da Ordem de Serviço:	24/04/2019	Empresa Responsável:	Formatto Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	21/10/2019
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	20/12/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$680.144,59	Valor liberado do CFF:	R\$680.144,59
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$7.968,28	Valor liberado de acréscimos:	R\$7.968,28
Valor de aditivos de supressões:	R\$5.946,33	Valor descontado (supressões):	R\$5.946,33
% de aditivos de acréscimo:	1,17%	% de aditivos de supressão:	0,87%
Valor total final da obra:	R\$682.166,54	Valores totais liberados:	R\$682.166,54
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	5693,66 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 02/12/2019

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 02/12/2019 e definitivamente em 14/04/2020.



Fiscalização com auxílio de profissionais da DPRO

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	jun/20
---	---------------

Unidade Beneficiada:	NAVEGANTES	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	098/2019	Conclusão da obra do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	16/05/2019	Empresa Responsável:	JM Gato Constr. Incorp. Ltda
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	12/11/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	12/11/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$2.160.205,26	Valor liberado do CFF:	R\$2.160.205,26
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$2.160.205,26	Valores totais liberados:	R\$2.160.205,26
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 12/11/2019

Situação da Obra:

O Contrato 098/2019 trata da conclusão da obra de construção do novo Fórum de Navegantes que foi iniciada pela empresa Concretel Construções através do Contrato 060/2014 (rescindido). Obra recebida provisoriamente em 12/11/2019 e definitivamente em 10/02/2020.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	jun/20
---	---------------

Unidade Beneficiada:	CONCÓRDIA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	160/2018	Reforma dos brises da fachada da edificação	
Data da Ordem de Serviço:	24/07/2019	Empresa Responsável:	AZ Construções
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	21/12/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	21/12/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$276.770,81	Valor liberado do CFF:	R\$276.770,81
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$132.938,43	Valor liberado de acréscimos:	R\$132.938,43
Valor de aditivos de supressões:	R\$33.806,83	Valor descontado (supressões):	R\$33.806,83
% de aditivos de acréscimo:	48,03%	% de aditivos de supressão:	12,21%
Valor total final da obra:	R\$375.902,41	Valores totais liberados:	R\$375.902,41
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	5.363,53 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 15/01/2020

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 15/01/2020 e definitivamente em 23/04/2020.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	jun/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	FRAIBURGO	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	111/2019	Reforma da cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	11/07/2019	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	08/11/2019
Prorrogação de prazo (dias):	120	Prazo de execução com prorrog.:	07/03/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$376.739,26	Valor liberado do CFF:	R\$376.739,26
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$60.455,81	Valor liberado de acréscimos:	R\$60.455,81
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	16,05%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$437.195,07	Valores totais liberados:	R\$437.195,07
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1.421,32 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 06/02/2020

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	jun/20
---	---------------

Unidade Beneficiada:	PONTE SERRADA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	51/2019	Reforma e ampliação para acessibilidade	
Data da Ordem de Serviço:	25/04/2019	Empresa Responsável:	Lupa Construções Ltda
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	22/10/2019
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	20/01/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$594.252,14	Valor liberado do CFF:	R\$594.252,14
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$64.104,40	Valor liberado de acréscimos:	R\$64.104,40
Valor de aditivos de supressões:	R\$33.173,83	Valor descontado (supressões):	R\$33.173,83
% de aditivos de acréscimo:	10,79%	% de aditivos de supressão:	5,58%
Valor total final da obra:	R\$625.182,71	Valores totais liberados:	R\$625.182,71
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	340,00 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 17/02/2020

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 17/02/2020 e definitivamente em 23/06/2020.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	jun/20
---	---------------

Unidade Beneficiada:	INDAIAL	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	145/2019	Reforma da cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	11/09/2019	Empresa Responsável:	Bortolon Arq. E Incorp. Ltda
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	09/01/2020
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrog.:	08/02/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$286.883,22	Valor liberado do CFF:	R\$286.883,22
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$26.682,54	Valor liberado de acréscimos:	R\$26.682,54
Valor de aditivos de supressões:	R\$23.490,68	Valor descontado (supressões):	R\$23.490,68
% de aditivos de acréscimo:	9,30%	% de aditivos de supressão:	8,19%
Valor total final da obra:	R\$290.075,08	Valores totais liberados:	R\$290.075,08
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1.370,67 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 08/02/2020

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 08/02/2020 e definitivamente em 13/05/2020.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD **jun/20**

Unidade Beneficiada:	CAPITAL - RID SILVA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	147/2019	Instalação de plataforma elevatória	
Data da Ordem de Serviço:	09/12/2019	Empresa Responsável:	Lupa Construções Ltda
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	07/05/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	07/05/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$100.093,58	Valor liberado do CFF:	R\$100.093,58
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$100.093,58	Valores totais liberados:	R\$100.093,58
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1016,84 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 05/05/2020

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 05/05/2020.




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD **jun/20**

Unidade Beneficiada:	BLUMENAU - F. UNIVER.	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	190/2018	Reforma e Ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	12/12/2018	Empresa Responsável:	Açu Constr. e Incorpor.
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	07/12/2019
Prorrogação de prazo (dias):	120	Prazo de execução com prorrog.:	05/04/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$1.100.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$1.100.000,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$238.141,89	Valor liberado de acréscimos:	R\$238.141,89
Valor de aditivos de supressões:	R\$21.552,45	Valor descontado (supressões):	R\$21.552,45
% de aditivos de acréscimo:	21,65%	% de aditivos de supressão:	1,96%
Valor total final da obra:	R\$1.316.589,44	Valores totais liberados:	R\$1.316.589,44
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	2916,00 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 27/04/2020

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 27/04/2020. Considerada no prazo em função da paralização do Covid.

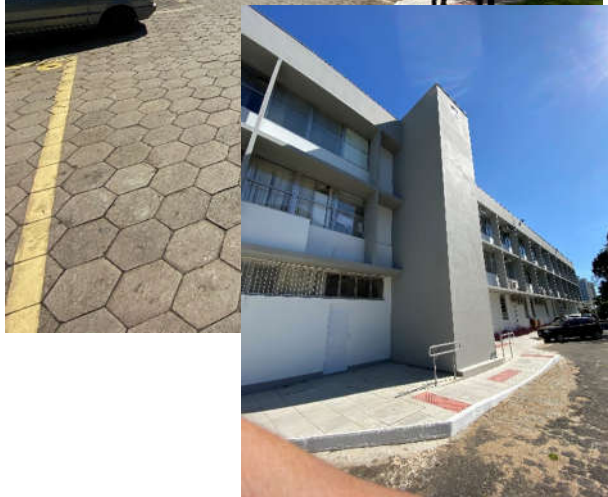

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	jun/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CAÇADOR	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	183/2019	Instalação de rede de fibra ótica	
Data da Ordem de Serviço:	07/01/2020	Empresa Responsável:	Integrasul T. Inf. E Com. Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	06/04/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	06/04/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$393.214,86	Valor liberado do CFF:	R\$393.214,86
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$393.214,86	Valores totais liberados:	R\$393.214,86
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1624,48 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 06/04/2020

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 06/04/2020.





Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD **jun/20**

Unidade Beneficiada:	IBIRAMA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	169/2019	Reforma da cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	18/11/2019	Empresa Responsável:	SCHAFFER & PIAZZA
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	17/03/2020
Prorrogação de prazo (dias):	75	Prazo de execução com prorrog.:	31/05/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$334.932,79	Valor liberado do CFF:	R\$334.932,79
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$3.703,99	Valor liberado de acréscimos:	R\$3.703,99
Valor de aditivos de supressões:	R\$18.108,38	Valor descontado (supressões):	R\$18.108,38
% de aditivos de acréscimo:	1,11%	% de aditivos de supressão:	5,41%
Valor total final da obra:	R\$320.528,40	Valores totais liberados:	R\$320.528,40
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1360,37 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 31/05/2020.

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 31/05/2020.

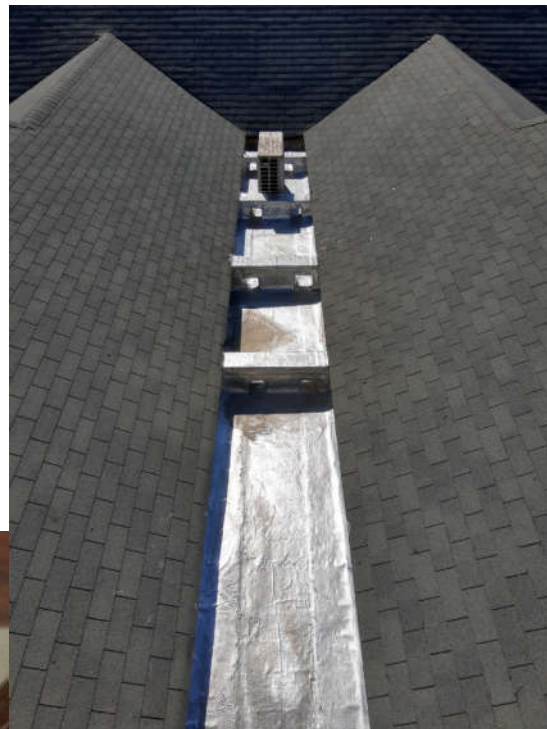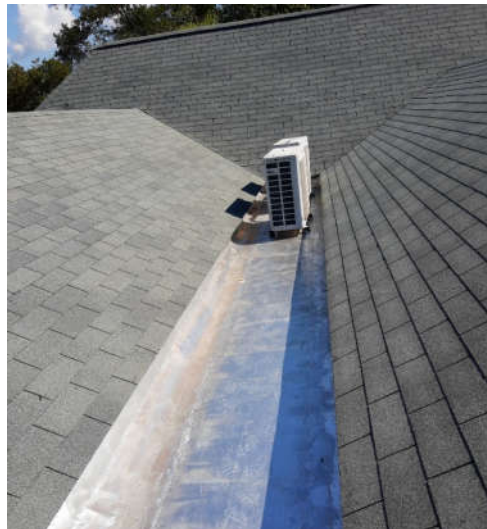

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2020	jun/20
---	---------------

Obras iniciadas: 3
 Obras concluídas (TRP): 6
 Obras concluídas com TRD: 5
 Obras paralisadas/rescindidas: 0
 Obras em andamento: 12
 Nº de obras no ano: 23

Valores Liberados:		
Janeiro	R\$	1.842.739,69
Fevereiro	R\$	1.856.934,40
Março	R\$	3.014.588,72
Abril	R\$	1.110.969,05
Maio	R\$	1.637.180,27
Junho	R\$	2.886.015,39
Julho	R\$	-
Agosto	R\$	-
Setembro	R\$	-
Outubro	R\$	-
Novembro	R\$	-
Dezembro	R\$	-
Total	R\$	12.348.427,52



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Cristiane Batista Tatavitto

Diogo Coelho Rocha

Herlei José Cantú

Rafael Gonzaga Lima

Wilson Spernau Júnior

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Data de atualização: 07/07/2020

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
