

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		mar/20	
Unidade Beneficiada:	TIMBÓ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2018	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	28/05/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	R\$7.492.807,70
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$17.228.423,28	Valores totais liberados:	R\$7.492.807,70
Valores à liberar:	R\$9.735.615,58	% Executado (sobre o valor final):	43,49%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		mar/20	
Unidade Beneficiada:	RIO DO SUL	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	136/2018	Retomada da construção do novo prédio do Fórum	
Data de Início da Obra:	08/10/2018	Empresa Responsável:	Estrutura Engenharia
Prazo contratual (dias):	660	Prazo de execução original:	29/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	29/07/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$18.876.331,19	Valor liberado do CFF:	R\$11.725.195,51
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.350.747,09	Valor liberado de acréscimos:	R\$1.330.662,65
Valor de aditivos de supressões:	R\$2.202.365,53	Valor descontado (supressões):	R\$635.252,90
% de aditivos de acréscimo:	12,45%	% de aditivos de supressão:	11,67%
Valor total final da obra:	R\$19.024.712,75	Valores totais liberados:	R\$12.420.605,26
Valores à liberar:	R\$6.604.107,49	% Executado (sobre o valor final):	65,29%
Área construída:	10.443,73 m ²	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			mar/20	
Unidade Beneficiada:	BLUMENAU - F. UNIVER.	Tipo de Obra:		
Contrato nº:	190/2018	Reforma e Ampliação		
Data da Ordem de Serviço:	12/12/2018	Empresa Responsável:	Açu Constr. e Incorpor.	
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	07/12/2019	
Prorrogação de prazo (dias):	120	Prazo de execução com prorrog.:	05/04/2020	
Valor do CFF original da obra:	R\$1.100.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$1.090.739,63	
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$238.141,89	Valor liberado de acréscimos:	R\$178.166,34	
Valor de aditivos de supressões:	R\$21.552,45	Valor descontado (supressões):	R\$21.552,45	
% de aditivos de acréscimo:	21,65%	% de aditivos de supressão:	1,96%	
Valor total final da obra:	R\$1.316.589,44	Valores totais liberados:	R\$1.247.353,52	
Valores à liberar:	R\$69.235,92	% Executado (sobre o valor final):	94,74%	
Área construída:	2916,00 m ²	Desenvolvimento:	Em dia.	

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		mar/20	
Unidade Beneficiada:	ANCHIETA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	210/2018	Reforma e ampliação (acessibilidade e cercamento)	
Data da Ordem de Serviço:	29/01/2019	Empresa Responsável:	Tratare Construções
Prazo contratual (dias):	240	Prazo de execução original:	26/09/2019
Prorrogação de prazo (dias):	178	Prazo de execução com prorrog.:	22/03/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$672.041,16	Valor liberado do CFF:	R\$569.902,96
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$100.723,47	Valor liberado de acréscimos:	R\$99.957,78
Valor de aditivos de supressões:	R\$85.082,41	Valor descontado (supressões):	R\$5.865,51
% de aditivos de acréscimo:	14,99%	% de aditivos de supressão:	12,66%
Valor total final da obra:	R\$687.682,22	Valores totais liberados:	R\$663.995,23
Valores à liberar:	R\$23.686,99	% Executado (sobre o valor final):	96,56%
Área construída:	392,60 m ²	Desenvolvimento:	Em dia.


Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		mar/20	
Unidade Beneficiada:	BLUMENAU	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	55/2019	Reforma global e ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	25/04/2019	Empresa Responsável:	Head Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	1200	Prazo de execução original:	07/08/2022
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	07/08/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$13.931.394,83	Valor liberado do CFF:	R\$1.147.662,41
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$90.859,76	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$20.130,85	Valor descontado (supressões):	R\$3.246,74
% de aditivos de acréscimo:	0,65%	% de aditivos de supressão:	0,14%
Valor total final da obra:	R\$14.002.123,74	Valores totais liberados:	R\$1.144.415,67
Valores à liberar:	R\$12.857.708,07	% Executado (sobre o valor final):	8,17%
Área construída:	10121,23 m²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:

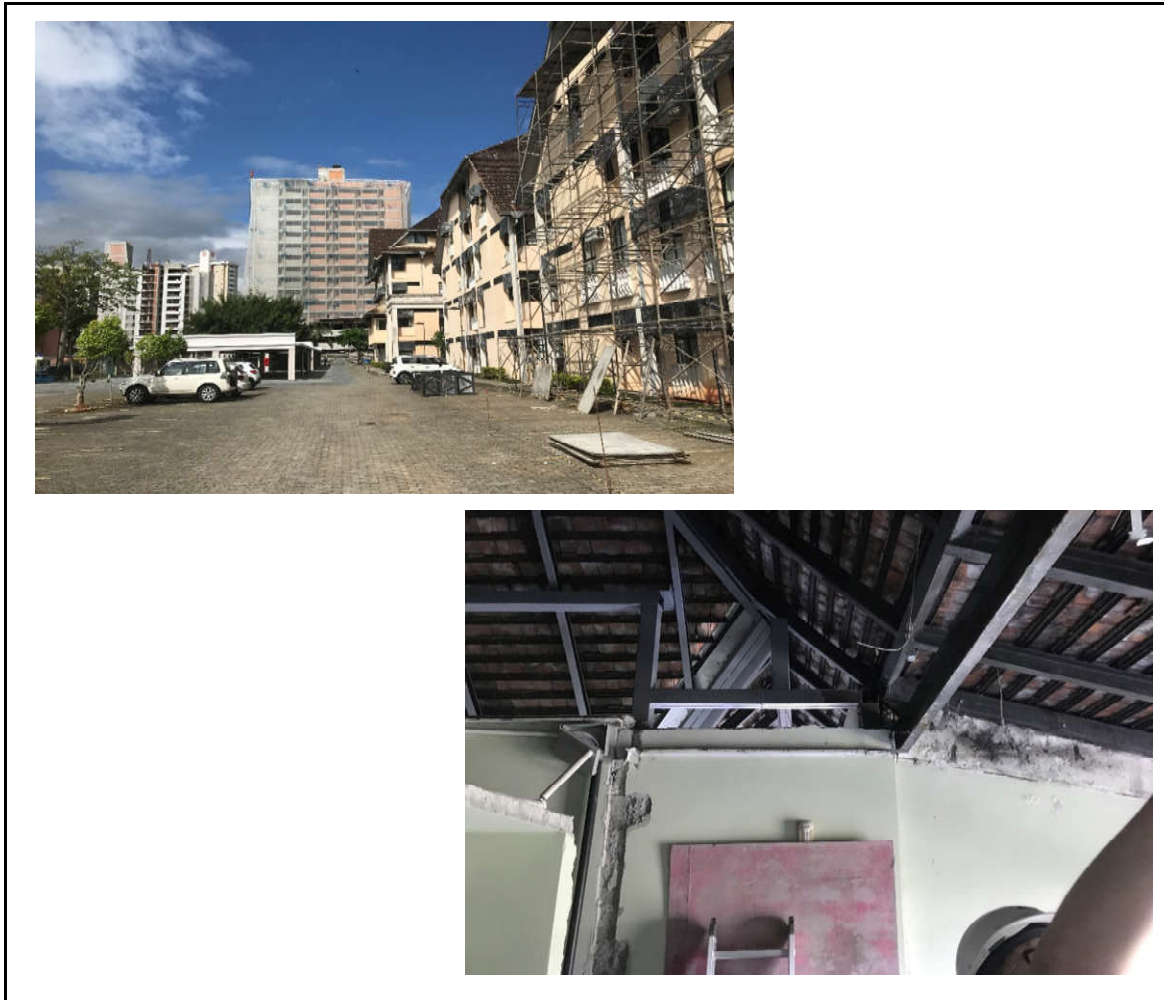

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CANOINHAS	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	105/2019	Complementação do sistema de calefação	
Data da Ordem de Serviço:	05/07/2019	Empresa Responsável:	Giacomet Termo Metalúrgica
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	01/01/2020
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	31/03/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$721.943,23	Valor liberado do CFF:	R\$480.259,42
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$87.676,83	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	12,14%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$809.620,06	Valores totais liberados:	R\$480.259,42
Valores à liberar:	R\$329.360,64	% Executado (sobre o valor final):	59,32%
Área construída:	7.549,47 m ²	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			mar/20
Unidade Beneficiada:	CRICIÚMA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	110/2019	Reforma para adequação do preventivo contra incêndios	
Data da Ordem de Serviço:	02/07/2019	Empresa Responsável:	Viadupla Construções
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	30/10/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	30/10/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$574.735,82	Valor liberado do CFF:	R\$230.836,38
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$574.735,82	Valores totais liberados:	R\$230.836,38
Valores à liberar:	R\$343.899,44	% Executado (sobre o valor final):	40,16%
Área construída:	7.480,84 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	ITUPORANGA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	118/2019	Reforma para adequação do preventivo contra incêndios	
Data da Ordem de Serviço:	10/07/2019	Empresa Responsável:	Projepower Constr. Empr.
Prazo contratual (dias):	60	Prazo de execução original:	08/09/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	08/09/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$74.431,77	Valor liberado do CFF:	R\$74.431,77
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$4.335,85	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	5,83%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$78.767,62	Valores totais liberados:	R\$74.431,77
Valores à liberar:	R\$4.335,85	% Executado (sobre o valor final):	94,50%
Área construída:	809,91 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra: Aguardando vistoria do CBMSC



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	ITAJAÍ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	115/2019	Fornecimento e instalação de novos elevadores	
Data da Ordem de Serviço:	29/07/2019	Empresa Responsável:	Systec Serv. Man. Elev. Ltda
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	23/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	23/07/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$477.738,65	Valor liberado do CFF:	R\$174.457,39
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$477.738,65	Valores totais liberados:	R\$174.457,39
Valores à liberar:	R\$303.281,26	% Executado (sobre o valor final):	36,52%
Área construída:	7.480,84 m ²	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	INDAIAL	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	145/2019	Reforma da cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	11/09/2019	Empresa Responsável:	Bortolon Arq. E Incorp. Ltda
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	09/01/2020
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrog.:	08/02/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$286.883,22	Valor liberado do CFF:	R\$244.449,09
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$26.682,54	Valor liberado de acréscimos:	R\$26.682,54
Valor de aditivos de supressões:	R\$23.490,68	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	9,30%	% de aditivos de supressão:	8,19%
Valor total final da obra:	R\$290.075,08	Valores totais liberados:	R\$271.131,63
Valores à liberar:	R\$18.943,45	% Executado (sobre o valor final):	93,47%
Área construída:	1.370,67 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	IMBITUBA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	131/2019	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	17/10/2019	Empresa Responsável:	Head Engenharia Ltda EPP
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	01/10/2022
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	01/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$21.598.789,41	Valor liberado do CFF:	R\$447.260,24
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$21.598.789,41	Valores totais liberados:	R\$447.260,24
Valores à liberar:	R\$21.151.529,17	% Executado (sobre o valor final):	2,07%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	IBIRAMA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	169/2019	Reforma da cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	18/11/2019	Empresa Responsável:	SCHAFFER & PIAZZA
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	17/03/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	17/03/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$334.932,79	Valor liberado do CFF:	R\$143.148,96
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$334.932,79	Valores totais liberados:	R\$143.148,96
Valores à liberar:	R\$191.783,83	% Executado (sobre o valor final):	42,74%
Área construída:	1360,37 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	SEARA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	142/2019	Reforma parcial	
Data da Ordem de Serviço:	03/12/2019	Empresa Responsável:	Lupa Construções Ltda
Prazo contratual (dias):	240	Prazo de execução original:	30/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	30/07/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$859.714,26	Valor liberado do CFF:	R\$246.257,71
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$859.714,26	Valores totais liberados:	R\$246.257,71
Valores à liberar:	R\$613.456,55	% Executado (sobre o valor final):	28,64%
Área construída:	1016,84 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CAPITAL - RID SILVA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	147/2019	Instalação de plataforma elevatória	
Data da Ordem de Serviço:	09/12/2019	Empresa Responsável:	Lupa Construções Ltda
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	07/05/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	07/05/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$100.093,58	Valor liberado do CFF:	R\$68.142,58
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$100.093,58	Valores totais liberados:	R\$68.142,58
Valores à liberar:	R\$31.951,00	% Executado (sobre o valor final):	68,08%
Área construída:	1016,84 m ²	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		mar/20	
Unidade Beneficiada:	CAÇADOR	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	183/2019	Instalação de rede de fibra ótica	
Data da Ordem de Serviço:	07/01/2020	Empresa Responsável:	Integrasul T. Inf. E Com. Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	06/04/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	06/04/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$393.214,86	Valor liberado do CFF:	R\$333.585,74
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$393.214,86	Valores totais liberados:	R\$333.585,74
Valores à liberar:	R\$59.629,12	% Executado (sobre o valor final):	84,84%
Área construída:	1624,48 m ²	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	URUBICI	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	188/2019	Reforma da cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	17/01/2020	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	16/05/2020
Prorrogação de prazo (dias):	32	Prazo de execução com prorrog.:	17/06/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$317.747,13	Valor liberado do CFF:	R\$107.318,97
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$317.747,13	Valores totais liberados:	R\$107.318,97
Valores à liberar:	R\$210.428,16	% Executado (sobre o valor final):	33,77%
Área construída:	724,98 m ²	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	TUBARÃO	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	211/2019	Reforma da cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	27/01/2020	Empresa Responsável:	Termsul Eng. e Serv. Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	26/04/2020
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	26/04/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$423.327,53	Valor liberado do CFF:	R\$270.748,19
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$423.327,53	Valores totais liberados:	R\$270.748,19
Valores à liberar:	R\$152.579,34	% Executado (sobre o valor final):	63,96%
Área construída:	5213,69 m ²	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	mar/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	TJSC - Torre II	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	180/2018	Reforma da Torre II para remoção de brises, etc	
Data da Ordem de Serviço:	20/12/2018	Empresa Responsável:	Gefisa Const Incorpor Ltda
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	19/05/2019
Prorrogação de prazo (dias):	120	Prazo de execução com prorrog.:	16/09/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$862.332,64	Valor liberado do CFF:	R\$862.332,64
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$862.332,64	Valores totais liberados:	R\$862.332,64
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	13.100,00 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 28/10/2019

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 28/10/2019



Fiscalização com auxílio de profissionais da DMTJ

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD **mar/20**

Unidade Beneficiada:	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	76/2019	Construção de muro de contenção e cercamento	
Data da Ordem de Serviço:	24/04/2019	Empresa Responsável:	Formatto Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	21/10/2019
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	20/12/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$680.144,59	Valor liberado do CFF:	R\$680.144,59
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$7.968,28	Valor liberado de acréscimos:	R\$7.968,28
Valor de aditivos de supressões:	R\$5.946,33	Valor descontado (supressões):	R\$5.946,33
% de aditivos de acréscimo:	1,17%	% de aditivos de supressão:	0,87%
Valor total final da obra:	R\$682.166,54	Valores totais liberados:	R\$682.166,54
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	5693,66 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 02/12/2019

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 02/12/2019.



Fiscalização com auxílio de profissionais da DPRO

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	mar/20
---	---------------

Unidade Beneficiada:	NAVEGANTES	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	098/2019	Conclusão da obra do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	16/05/2019	Empresa Responsável:	JM Gato Constr. Incorp. Ltda
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	12/11/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	12/11/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$2.160.205,26	Valor liberado do CFF:	R\$2.160.205,26
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$2.160.205,26	Valores totais liberados:	R\$2.160.205,26
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 12/11/2019

Situação da Obra:

O Contrato 098/2019 trata da conclusão da obra de construção do novo Fórum de Navegantes que foi iniciada pela empresa Concretel Construções através do Contrato 060/2014 (rescindido). Obra recebida provisoriamente em 12/11/2019 e definitivamente em 10/02/2020.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	mar/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CONCÓRDIA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	160/2018	Reforma dos brises da fachada da edificação	
Data da Ordem de Serviço:	24/07/2019	Empresa Responsável:	AZ Construções
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	21/12/2019
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	21/12/2019
Valor do CFF original da obra:	R\$276.770,81	Valor liberado do CFF:	R\$276.770,81
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$132.938,43	Valor liberado de acréscimos:	R\$132.938,43
Valor de aditivos de supressões:	R\$33.806,83	Valor descontado (supressões):	R\$33.806,83
% de aditivos de acréscimo:	48,03%	% de aditivos de supressão:	12,21%
Valor total final da obra:	R\$375.902,41	Valores totais liberados:	R\$375.902,41
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	5.363,53 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 15/01/2020

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 15/01/2020



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	mar/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	FRAIBURGO	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	111/2019	Reforma da cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	11/07/2019	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	08/11/2019
Prorrogação de prazo (dias):	120	Prazo de execução com prorrog.:	07/03/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$376.739,26	Valor liberado do CFF:	R\$376.739,26
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$60.455,81	Valor liberado de acréscimos:	R\$60.455,81
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	16,05%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$437.195,07	Valores totais liberados:	R\$437.195,07
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1.421,32 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 06/02/2020

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	mar/20
--	---------------

Unidade Beneficiada:	PONTE SERRADA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	51/2019	Reforma e ampliação para acessibilidade	
Data da Ordem de Serviço:	25/04/2019	Empresa Responsável:	Lupa Construções Ltda
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	22/10/2019
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	20/01/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$594.252,14	Valor liberado do CFF:	R\$594.252,14
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$64.104,40	Valor liberado de acréscimos:	R\$64.104,40
Valor de aditivos de supressões:	R\$33.173,83	Valor descontado (supressões):	R\$33.173,83
% de aditivos de acréscimo:	10,79%	% de aditivos de supressão:	5,58%
Valor total final da obra:	R\$625.182,71	Valores totais liberados:	R\$625.182,71
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	340,00 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 17/02/2020

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 17/02/2020.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2020	mar/20
---	---------------

Obras iniciadas: 3
 Obras concluídas (TRP): 5
 Obras concluídas com TRD: 1
 Obras paralisadas/rescindidas: 0
 Obras em andamento: 17
 Nº de obras no ano: 23

Valores Liberados:	
Janeiro	R\$ 1.842.739,69
Fevereiro	R\$ 1.856.934,40
Março	R\$ 2.769.184,12
Abril	R\$ -
Maio	R\$ -
Junho	R\$ -
Julho	R\$ -
Agosto	R\$ -
Setembro	R\$ -
Outubro	R\$ -
Novembro	R\$ -
Dezembro	R\$ -
Total	R\$ 6.468.858,21



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Cristiane Batista Tatavitto

Diogo Coelho Rocha

Herlei José Cantú

Rafael Gonzaga Lima

Wilson Spernau Júnior

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Data de atualização: 06/04/2020

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
