

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |                  |                                    | out/20                   |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Unidade Beneficiada:                                  | <b>TIMBÓ</b>     | Tipo de Obra:                      |                          |
| Contrato nº:                                          | <b>050/2018</b>  | Construção do novo prédio do Fórum |                          |
| Data da Ordem de Serviço:                             | 13/06/2018       | Empresa Responsável:               | Endeal Eng e Construções |
| Prazo contratual (dias):                              | 1080             | Prazo de execução original:        | 28/05/2021               |
| Prorrogação de prazo (dias):                          | 0                | Prazo de execução com prorrogação: | 28/05/2021               |
| Valor do CFF original da obra:                        | R\$17.228.423,28 | Valor liberado do CFF:             | R\$9.035.356,85          |
| Valor de aditivos de acréscimo:                       | R\$157.059,61    | Valor liberado de acréscimos:      | R\$0,00                  |
| Valor de aditivos de supressões:                      | R\$165.713,66    | Valor descontado (supressões):     | R\$0,00                  |
| % de aditivos de acréscimo:                           | 0,91%            | % de aditivos de supressão:        | 0,96%                    |
| Valor total final da obra:                            | R\$17.219.769,23 | Valores totais liberados:          | R\$9.035.356,85          |
| Valores à liberar:                                    | R\$8.184.412,38  | % Executado (sobre o valor final): | 52,47%                   |
| Área construída:                                      | 6.857,59 m²      | Desenvolvimento:                   | Em atraso.               |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | out/20 |
|-------------------------------------------------------|--------|
|-------------------------------------------------------|--------|

|                                  |                  |                                    |                      |
|----------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>BLUMENAU</b>  | Tipo de Obra:                      |                      |
| Contrato nº:                     | <b>55/2019</b>   | Reforma global e ampliação         |                      |
| Data da Ordem de Serviço:        | 25/04/2019       | Empresa Responsável:               | Head Engenharia Ltda |
| Prazo contratual (dias):         | 1200             | Prazo de execução original:        | 07/08/2022           |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 0                | Prazo de execução com prorrog.:    | 07/08/2022           |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$13.931.394,83 | Valor liberado do CFF:             | R\$1.839.486,18      |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$278.752,14    | Valor liberado de acréscimos:      | R\$64.421,20         |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$104.215,61    | Valor descontado (supressões):     | R\$28.626,01         |
| % de aditivos de acréscimo:      | 2,00%            | % de aditivos de supressão:        | 0,75%                |
| Valor total final da obra:       | R\$14.105.931,36 | Valores totais liberados:          | R\$1.875.281,37      |
| Valores à liberar:               | R\$12.230.649,99 | % Executado (sobre o valor final): | 13,29%               |
| Área construída:                 | 10121,23 m²      | Desenvolvimento:                   | Em atraso.           |

Situação da Obra:




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | out/20 |
|-------------------------------------------------------|--------|
|-------------------------------------------------------|--------|

|                                  |                  |                                    |                          |
|----------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>IMBITUBA</b>  | Tipo de Obra:                      |                          |
| Contrato nº:                     | <b>131/2019</b>  | Construção do novo prédio do Fórum |                          |
| Data da Ordem de Serviço:        | 17/10/2019       | Empresa Responsável:               | Head Engenharia Ltda EPP |
| Prazo contratual (dias):         | 1080             | Prazo de execução original:        | 01/10/2022               |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 0                | Prazo de execução com prorrog.:    | 01/10/2022               |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$21.598.789,41 | Valor liberado do CFF:             | R\$1.571.228,30          |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$2.881,47      | Valor liberado de acréscimos:      | R\$0,00                  |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$179.549,50    | Valor descontado (supressões):     | R\$0,00                  |
| % de aditivos de acréscimo:      | 0,01%            | % de aditivos de supressão:        | 0,83%                    |
| Valor total final da obra:       | R\$21.422.121,38 | Valores totais liberados:          | R\$1.571.228,30          |
| Valores à liberar:               | R\$19.850.893,08 | % Executado (sobre o valor final): | 7,33%                    |
| Área construída:                 | 6.857,59 m²      | Desenvolvimento:                   | Em atraso.               |

Situação da Obra:

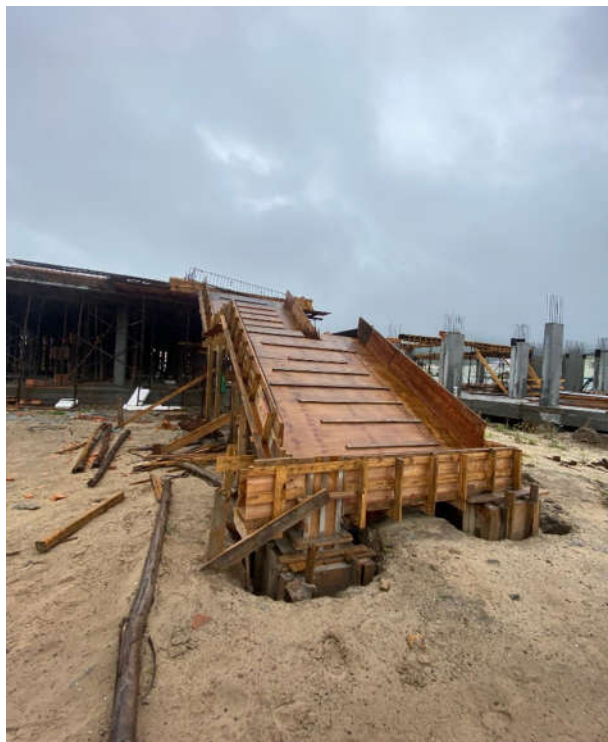

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |                 |                                             | out/20                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Beneficiada:                                  | <b>CAÇADOR</b>  | Tipo de Obra:                               |                           |
| Contrato nº:                                          | <b>023/2020</b> | Reforma parcial (acessibilidade, ppci, etc) |                           |
| Data da Ordem de Serviço:                             | 11/08/2020      | Empresa Responsável:                        | Ciclo Engen. e Construção |
| Prazo contratual (dias):                              | 300             | Prazo de execução original:                 | 07/06/2021                |
| Prorrogação de prazo (dias):                          | 0               | Prazo de execução com prorrog.:             | 07/06/2021                |
| Valor do CFF original da obra:                        | R\$1.273.470,65 | Valor liberado do CFF:                      | R\$97.911,31              |
| Valor de aditivos de acréscimo:                       | R\$0,00         | Valor liberado de acréscimos:               | R\$0,00                   |
| Valor de aditivos de supressões:                      | R\$0,00         | Valor descontado (supressões):              | R\$0,00                   |
| % de aditivos de acréscimo:                           | 0,00%           | % de aditivos de supressão:                 | 0,00%                     |
| Valor total final da obra:                            | R\$1.273.470,65 | Valores totais liberados:                   | R\$97.911,31              |
| Valores à liberar:                                    | R\$1.175.559,34 | % Executado (sobre o valor final):          | 7,69%                     |
| Área construída:                                      | 1624,48 m²      | Desenvolvimento:                            | Em dia                    |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.



|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b> | <b>out/20</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                 |                                        |                       |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>LAGES</b>    | Tipo de Obra:                          |                       |
| Contrato nº:                     | <b>020/2020</b> | Reforma parcial (cobertura, ppci, etc) |                       |
| Data da Ordem de Serviço:        | 08/09/2020      | Empresa Responsável:                   | Salver Const. Incorp. |
| Prazo contratual (dias):         | 450             | Prazo de execução original:            | 02/12/2021            |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 0               | Prazo de execução com prorrogação:     | 02/12/2021            |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$3.213.805,64 |                                        | R\$31.940,21          |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$0,00         | Valor liberado de acréscimos:          | R\$0,00               |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00         | Valor descontado (supressões):         | R\$0,00               |
| % de aditivos de acréscimo:      | 0,00%           | % de aditivos de supressão:            | 0,00%                 |
| Valor total final da obra:       | R\$3.213.805,64 | Valores totais liberados:              | R\$31.940,21          |
| Valores à liberar:               | R\$3.181.865,43 | % Executado (sobre o valor final):     | 0,99%                 |
| Área construída:                 | 5.162,21 m²     | Desenvolvimento:                       | Em atraso.            |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | out/20 |
|-------------------------------------------------------|--------|
|-------------------------------------------------------|--------|

|                                  |                  |                                          |                           |
|----------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>JOINVILLE</b> | Tipo de Obra:                            |                           |
| Contrato nº:                     | <b>006/2020</b>  | Reforma parcial (cobertura, brises, etc) |                           |
| Data da Ordem de Serviço:        | 14/10/2020       | Empresa Responsável:                     | Strehl Sol. em Engenharia |
| Prazo contratual (dias):         | 420              | Prazo de execução original:              | 08/12/2021                |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 0                | Prazo de execução com prorrogação:       | 08/12/2021                |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$1.646.374,66  |                                          | R\$0,00                   |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$0,00          | Valor liberado de acréscimos:            | R\$0,00                   |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00          | Valor descontado (supressões):           | R\$0,00                   |
| % de aditivos de acréscimo:      | 0,00%            | % de aditivos de supressão:              | 0,00%                     |
| Valor total final da obra:       | R\$1.646.374,66  | Valores totais liberados:                | R\$0,00                   |
| Valores à liberar:               | R\$1.646.374,66  | % Executado (sobre o valor final):       | 0,00%                     |
| Área construída:                 | 9.422,75 m²      | Desenvolvimento:                         | Em dia.                   |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b> | <b>out/20</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                        |                                                 |                            |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>TJSC - Torre II</b> | Tipo de Obra:                                   |                            |
| Contrato nº:                     | <b>180/2018</b>        | Reforma da Torre II para remoção de brises, etc |                            |
| Data da Ordem de Serviço:        | 20/12/2018             | Empresa Responsável:                            | Gefisa Const Incorpor Ltda |
| Prazo contratual (dias):         | 150                    | Prazo de execução original:                     | 19/05/2019                 |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 120                    | Prazo de execução com prorrogação:              | 16/09/2019                 |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$862.332,64          | Valor liberado do CFF:                          | R\$862.332,64              |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$0,00                | Valor liberado de acréscimos:                   | R\$0,00                    |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00                | Valor descontado (supressões):                  | R\$0,00                    |
| % de aditivos de acréscimo:      | 0,00%                  | % de aditivos de supressão:                     | 0,00%                      |
| Valor total final da obra:       | R\$862.332,64          | Valores totais liberados:                       | R\$862.332,64              |
| Valores à liberar:               | R\$0,00                | % Executado (sobre o valor final):              | 100,00%                    |
| Área construída:                 | 13.100,00 m²           | Desenvolvimento:                                | Concluída em 28/10/2019    |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 28/10/2019 e definitivamente em 05/08/2020.*




*Fiscalização com auxílio de profissionais da DMTJ*

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA |                           |                                              | out/20                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Unidade Beneficiada:                               | <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> | Tipo de Obra:                                |                          |
| Contrato nº:                                       | <b>76/2019</b>            | Construção de muro de contenção e cercamento |                          |
| Data da Ordem de Serviço:                          | 24/04/2019                | Empresa Responsável:                         | Formatto Engenharia Ltda |
| Prazo contratual (dias):                           | 180                       | Prazo de execução original:                  | 21/10/2019               |
| Prorrogação de prazo (dias):                       | 60                        | Prazo de execução com prorrog.:              | 20/12/2019               |
| Valor do CFF original da obra:                     | R\$680.144,59             | Valor liberado do CFF:                       | R\$680.144,59            |
| Valor de aditivos de acréscimo:                    | R\$7.968,28               | Valor liberado de acréscimos:                | R\$7.968,28              |
| Valor de aditivos de supressões:                   | R\$5.946,33               | Valor descontado (supressões):               | R\$5.946,33              |
| % de aditivos de acréscimo:                        | 1,17%                     | % de aditivos de supressão:                  | 0,87%                    |
| Valor total final da obra:                         | R\$682.166,54             | Valores totais liberados:                    | R\$682.166,54            |
| Valores à liberar:                                 | R\$0,00                   | % Executado (sobre o valor final):           | 100,00%                  |
| Área construída:                                   | 5693,66 m²                | Desenvolvimento:                             | Concluída em 02/12/2019  |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 02/12/2019 e definitivamente em 14/04/2020.*

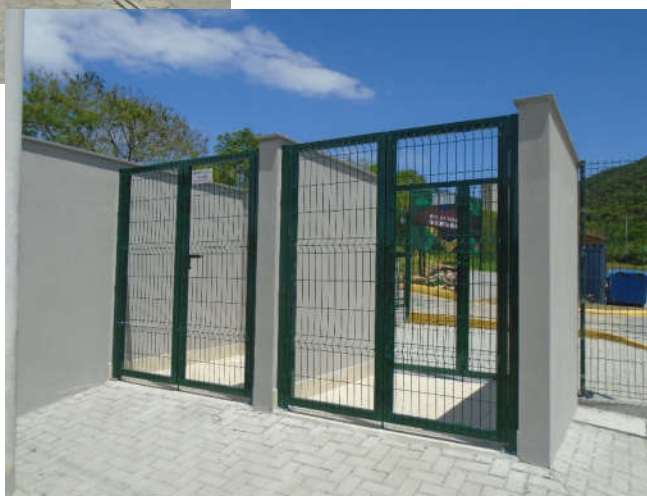

*Fiscalização com auxílio de profissionais da DPRO*

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.



|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b> | <b>out/20</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                   |                                           |                              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>NAVEGANTES</b> | Tipo de Obra:                             |                              |
| Contrato nº:                     | <b>098/2019</b>   | Conclusão da obra do novo prédio do Fórum |                              |
| Data da Ordem de Serviço:        | 16/05/2019        | Empresa Responsável:                      | JM Gato Constr. Incorp. Ltda |
| Prazo contratual (dias):         | 180               | Prazo de execução original:               | 12/11/2019                   |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 0                 | Prazo de execução com prorrogação:        | 12/11/2019                   |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$2.160.205,26   | Valor liberado do CFF:                    | R\$2.160.205,26              |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$0,00           | Valor liberado de acréscimos:             | R\$0,00                      |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00           | Valor descontado (supressões):            | R\$0,00                      |
| % de aditivos de acréscimo:      | 0,00%             | % de aditivos de supressão:               | 0,00%                        |
| Valor total final da obra:       | R\$2.160.205,26   | Valores totais liberados:                 | R\$2.160.205,26              |
| Valores à liberar:               | R\$0,00           | % Executado (sobre o valor final):        | 100,00%                      |
| Área construída:                 | 6.857,59 m²       | Desenvolvimento:                          | Concluída em 12/11/2019      |

Situação da Obra:

*O Contrato 098/2019 trata da conclusão da obra de construção do novo Fórum de Navegantes que foi iniciada pela empresa Concretel Construções através do Contrato 060/2014 (rescindido). Obra recebida provisoriamente em 12/11/2019 e definitivamente em 10/02/2020.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b> | <b>out/20</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                  |                                             |                         |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>CONCÓRDIA</b> | Tipo de Obra:                               |                         |
| Contrato nº:                     | <b>160/2018</b>  | Reforma dos brises da fachada da edificação |                         |
| Data da Ordem de Serviço:        | 24/07/2019       | Empresa Responsável:                        | AZ Construções          |
| Prazo contratual (dias):         | 150              | Prazo de execução original:                 | 21/12/2019              |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 0                | Prazo de execução com prorrog.:             | 21/12/2019              |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$276.770,81    | Valor liberado do CFF:                      | R\$276.770,81           |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$132.938,43    | Valor liberado de acréscimos:               | R\$132.938,43           |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$33.806,83     | Valor descontado (supressões):              | R\$33.806,83            |
| % de aditivos de acréscimo:      | 48,03%           | % de aditivos de supressão:                 | 12,21%                  |
| Valor total final da obra:       | R\$375.902,41    | Valores totais liberados:                   | R\$375.902,41           |
| Valores à liberar:               | R\$0,00          | % Executado (sobre o valor final):          | 100,00%                 |
| Área construída:                 | 5.363,53 m²      | Desenvolvimento:                            | Concluída em 15/01/2020 |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 15/01/2020 e definitivamente em 23/04/2020.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b> | <b>out/20</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                  |                                    |                           |
|----------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>FRAIBURGO</b> | Tipo de Obra:                      |                           |
| Contrato nº:                     | <b>111/2019</b>  | Reforma da cobertura               |                           |
| Data da Ordem de Serviço:        | 11/07/2019       | Empresa Responsável:               | Strehl Sol. em Engenharia |
| Prazo contratual (dias):         | 120              | Prazo de execução original:        | 08/11/2019                |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 120              | Prazo de execução com prorrog.:    | 07/03/2020                |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$376.739,26    | Valor liberado do CFF:             | R\$376.739,26             |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$60.455,81     | Valor liberado de acréscimos:      | R\$60.455,81              |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00          | Valor descontado (supressões):     | R\$0,00                   |
| % de aditivos de acréscimo:      | 16,05%           | % de aditivos de supressão:        | 0,00%                     |
| Valor total final da obra:       | R\$437.195,07    | Valores totais liberados:          | R\$437.195,07             |
| Valores à liberar:               | R\$0,00          | % Executado (sobre o valor final): | 100,00%                   |
| Área construída:                 | 1.421,32 m²      | Desenvolvimento:                   | Concluída em 06/02/2020   |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 06/02/2020 e definitivamente em 27/07/2020.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b> | <b>out/20</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                       |                                         |                         |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>PONTE SERRADA</b>  | Tipo de Obra:                           |                         |
| Contrato nº:                     | <b>51/2019</b>        | Reforma e ampliação para acessibilidade |                         |
| Data da Ordem de Serviço:        | 25/04/2019            | Empresa Responsável:                    | Lupa Construções Ltda   |
| Prazo contratual (dias):         | 180                   | Prazo de execução original:             | 22/10/2019              |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 90                    | Prazo de execução com prorrog.:         | 20/01/2020              |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$594.252,14         | Valor liberado do CFF:                  | R\$594.252,14           |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$64.104,40          | Valor liberado de acréscimos:           | R\$64.104,40            |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$33.173,83          | Valor descontado (supressões):          | R\$33.173,83            |
| % de aditivos de acréscimo:      | 10,79%                | % de aditivos de supressão:             | 5,58%                   |
| Valor total final da obra:       | R\$625.182,71         | Valores totais liberados:               | R\$625.182,71           |
| Valores à liberar:               | R\$0,00               | % Executado (sobre o valor final):      | 100,00%                 |
| Área construída:                 | 340,00 m <sup>2</sup> | Desenvolvimento:                        | Concluída em 17/02/2020 |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 17/02/2020 e definitivamente em 23/06/2020.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.




|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b> | <b>out/20</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                 |                                    |                              |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>INDAIAL</b>  | Tipo de Obra:                      |                              |
| Contrato nº:                     | <b>145/2019</b> | Reforma da cobertura               |                              |
| Data da Ordem de Serviço:        | 11/09/2019      | Empresa Responsável:               | Bortolon Arq. E Incorp. Ltda |
| Prazo contratual (dias):         | 120             | Prazo de execução original:        | 09/01/2020                   |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 30              | Prazo de execução com prorrogação: | 08/02/2020                   |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$286.883,22   | Valor liberado do CFF:             | R\$286.883,22                |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$26.682,54    | Valor liberado de acréscimos:      | R\$26.682,54                 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$23.490,68    | Valor descontado (supressões):     | R\$23.490,68                 |
| % de aditivos de acréscimo:      | 9,30%           | % de aditivos de supressão:        | 8,19%                        |
| Valor total final da obra:       | R\$290.075,08   | Valores totais liberados:          | R\$290.075,08                |
| Valores à liberar:               | R\$0,00         | % Executado (sobre o valor final): | 100,00%                      |
| Área construída:                 | 1.370,67 m²     | Desenvolvimento:                   | Concluída em 08/02/2020      |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 08/02/2020 e definitivamente em 13/05/2020.*

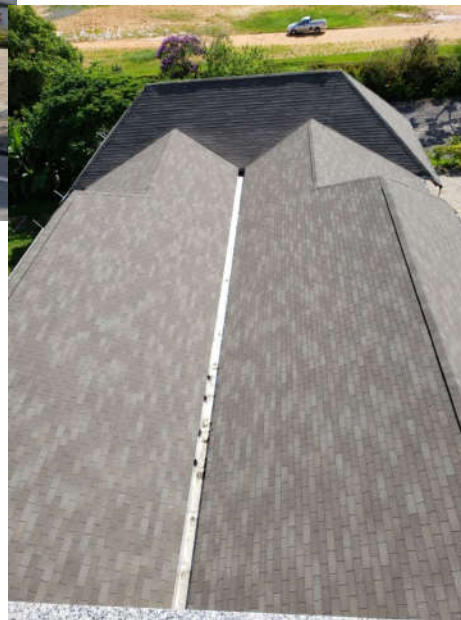

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA |                            |                                     | out/20                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Unidade Beneficiada:                               | <b>CAPITAL - RID SILVA</b> | Tipo de Obra:                       |                         |
| Contrato nº:                                       | <b>147/2019</b>            | Instalação de plataforma elevatória |                         |
| Data da Ordem de Serviço:                          | 09/12/2019                 | Empresa Responsável:                | Lupa Construções Ltda   |
| Prazo contratual (dias):                           | 150                        | Prazo de execução original:         | 07/05/2020              |
| Prorrogação de prazo (dias):                       | 0                          | Prazo de execução com prorrog.:     | 07/05/2020              |
| Valor do CFF original da obra:                     | R\$100.093,58              | Valor liberado do CFF:              | R\$100.093,58           |
| Valor de aditivos de acréscimo:                    | R\$0,00                    | Valor liberado de acréscimos:       | R\$0,00                 |
| Valor de aditivos de supressões:                   | R\$0,00                    | Valor descontado (supressões):      | R\$0,00                 |
| % de aditivos de acréscimo:                        | 0,00%                      | % de aditivos de supressão:         | 0,00%                   |
| Valor total final da obra:                         | R\$100.093,58              | Valores totais liberados:           | R\$100.093,58           |
| Valores à liberar:                                 | R\$0,00                    | % Executado (sobre o valor final):  | 100,00%                 |
| Área construída:                                   | 1016,84 m²                 | Desenvolvimento:                    | Concluída em 05/05/2020 |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 05/05/2020 e definitivamente em 14/08/2020*





Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b> | <b>out/20</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                              |                                    |                         |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>BLUMENAU - F. UNIVER.</b> | Tipo de Obra:                      |                         |
| Contrato nº:                     | <b>190/2018</b>              | Reforma e Ampliação                |                         |
| Data da Ordem de Serviço:        | 12/12/2018                   | Empresa Responsável:               | Açu Constr. e Incorpor. |
| Prazo contratual (dias):         | 360                          | Prazo de execução original:        | 07/12/2019              |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 120                          | Prazo de execução com prorrogação: | 05/04/2020              |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$1.100.000,00              | Valor liberado do CFF:             | R\$1.100.000,00         |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$238.141,89                | Valor liberado de acréscimos:      | R\$238.141,89           |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$21.552,45                 | Valor descontado (supressões):     | R\$21.552,45            |
| % de aditivos de acréscimo:      | 21,65%                       | % de aditivos de supressão:        | 1,96%                   |
| Valor total final da obra:       | R\$1.316.589,44              | Valores totais liberados:          | R\$1.316.589,44         |
| Valores à liberar:               | R\$0,00                      | % Executado (sobre o valor final): | 100,00%                 |
| Área construída:                 | 2916,00 m²                   | Desenvolvimento:                   | Concluída em 27/04/2020 |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 27/04/2020. Considerada no prazo em função da paralização do Covid.  
Recebida definitivamente em 26/07/2020.*

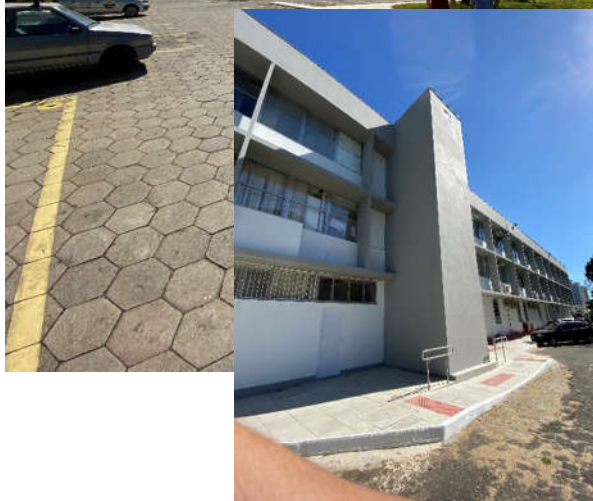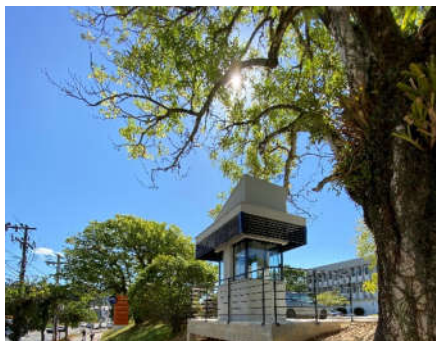

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.



|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b> | <b>out/20</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                 |                                    |                                |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>CAÇADOR</b>  | Tipo de Obra:                      |                                |
| Contrato nº:                     | <b>183/2019</b> | Instalação de rede de fibra ótica  |                                |
| Data da Ordem de Serviço:        | 07/01/2020      | Empresa Responsável:               | Integrasul T. Inf. E Com. Ltda |
| Prazo contratual (dias):         | 90              | Prazo de execução original:        | 06/04/2020                     |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 0               | Prazo de execução com prorrogação: | 06/04/2020                     |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$393.214,86   | Valor liberado do CFF:             | R\$393.214,86                  |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$0,00         | Valor liberado de acréscimos:      | R\$0,00                        |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00         | Valor descontado (supressões):     | R\$0,00                        |
| % de aditivos de acréscimo:      | 0,00%           | % de aditivos de supressão:        | 0,00%                          |
| Valor total final da obra:       | R\$393.214,86   | Valores totais liberados:          | R\$393.214,86                  |
| Valores à liberar:               | R\$0,00         | % Executado (sobre o valor final): | 100,00%                        |
| Área construída:                 | 1624,48 m²      | Desenvolvimento:                   | Concluída em 06/04/2020        |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 06/04/2020 e definitivamente em 06/07/2020*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.




|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b> | <b>out/20</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                 |                                    |                          |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>IBIRAMA</b>  | Tipo de Obra:                      |                          |
| Contrato nº:                     | <b>169/2019</b> | Reforma da cobertura               |                          |
| Data da Ordem de Serviço:        | 18/11/2019      | Empresa Responsável:               | SCHAFER & PIAZZA         |
| Prazo contratual (dias):         | 120             | Prazo de execução original:        | 17/03/2020               |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 75              | Prazo de execução com prorrogação: | 31/05/2020               |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$334.932,79   | Valor liberado do CFF:             | R\$334.932,79            |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$3.703,99     | Valor liberado de acréscimos:      | R\$3.703,99              |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$18.108,38    | Valor descontado (supressões):     | R\$18.108,38             |
| % de aditivos de acréscimo:      | 1,11%           | % de aditivos de supressão:        | 5,41%                    |
| Valor total final da obra:       | R\$320.528,40   | Valores totais liberados:          | R\$320.528,40            |
| Valores à liberar:               | R\$0,00         | % Executado (sobre o valor final): | 100,00%                  |
| Área construída:                 | 1360,37 m²      | Desenvolvimento:                   | Concluída em 31/05/2020. |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 31/05/2020 e definitivamente em 05/10/2020.*

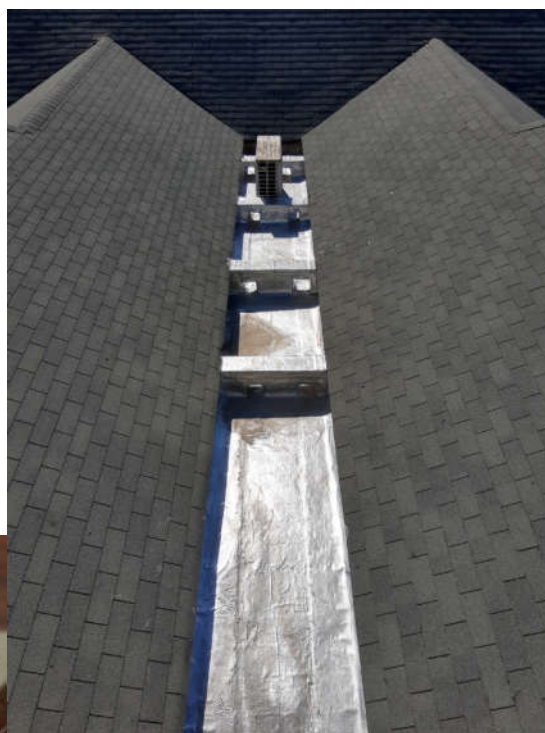

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA |                 |                                                   | out/20                  |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Unidade Beneficiada:                               | <b>ANCHIETA</b> | Tipo de Obra:                                     |                         |
| Contrato nº:                                       | <b>210/2018</b> | Reforma e ampliação (acessibilidade e cercamento) |                         |
| Data da Ordem de Serviço:                          | 29/01/2019      | Empresa Responsável:                              | Tratare Construções     |
| Prazo contratual (dias):                           | 240             | Prazo de execução original:                       | 26/09/2019              |
| Prorrogação de prazo (dias):                       | 178             | Prazo de execução com prorrogação:                | 22/03/2020              |
| Valor do CFF original da obra:                     | R\$672.041,16   | Valor liberado do CFF:                            | R\$672.041,16           |
| Valor de aditivos de acréscimo:                    | R\$100.723,47   | Valor liberado de acréscimos:                     | R\$100.723,47           |
| Valor de aditivos de supressões:                   | R\$85.082,41    | Valor descontado (supressões):                    | R\$85.082,41            |
| % de aditivos de acréscimo:                        | 14,99%          | % de aditivos de supressão:                       | 12,66%                  |
| Valor total final da obra:                         | R\$687.682,22   | Valores totais liberados:                         | R\$687.682,22           |
| Valores à liberar:                                 | R\$0,00         | % Executado (sobre o valor final):                | 100,00%                 |
| Área construída:                                   | 392,60 m²       | Desenvolvimento:                                  | Concluída em 06/07/2020 |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 06/07/2020 e definitivamente em 19/10/2020.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD</b> | <b>out/20</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |               |                                        |                            |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | CANOINHAS     | Tipo de Obra:                          |                            |
| Contrato nº:                     | 105/2019      | Complementação do sistema de calefação |                            |
| Data da Ordem de Serviço:        | 05/07/2019    | Empresa Responsável:                   | Giacomet Termo Metalúrgica |
| Prazo contratual (dias):         | 180           | Prazo de execução original:            | 01/01/2020                 |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 180           | Prazo de execução com prorrog.:        | 29/06/2020                 |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$721.943,23 | Valor liberado do CFF:                 | R\$721.943,23              |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$87.676,83  | Valor liberado de acréscimos:          | R\$87.676,83               |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00       | Valor descontado (supressões):         | R\$0,00                    |
| % de aditivos de acréscimo:      | 12,14%        | % de aditivos de supressão:            | 0,00%                      |
| Valor total final da obra:       | R\$809.620,06 | Valores totais liberados:              | R\$809.620,06              |
| Valores à liberar:               | R\$0,00       | % Executado (sobre o valor final):     | 100,00%                    |
| Área construída:                 | 7.549,47 m²   | Desenvolvimento:                       | Concluída em 19/06/2020    |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 19/06/2020*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD</b> | <b>out/20</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                 |                                    |                           |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>TUBARÃO</b>  | Tipo de Obra:                      |                           |
| Contrato nº:                     | <b>211/2019</b> | Climatização das áreas comuns.     |                           |
| Data da Ordem de Serviço:        | 27/01/2020      | Empresa Responsável:               | Termsul Eng. e Serv. Ltda |
| Prazo contratual (dias):         | 90              | Prazo de execução original:        | 26/04/2020                |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 60              | Prazo de execução com prorrog.:    | 25/06/2020                |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$432.327,53   | Valor liberado do CFF:             | R\$432.327,53             |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$41.251,64    | Valor liberado de acréscimos:      | R\$41.251,64              |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00         | Valor descontado (supressões):     | R\$0,00                   |
| % de aditivos de acréscimo:      | 9,54%           | % de aditivos de supressão:        | 0,00%                     |
| Valor total final da obra:       | R\$473.579,17   | Valores totais liberados:          | R\$473.579,17             |
| Valores à liberar:               | R\$0,00         | % Executado (sobre o valor final): | 100,00%                   |
| Área construída:                 | 5213,69 m²      | Desenvolvimento:                   | Concluída em 25/06/2020   |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 25/06/2020*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.



|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD</b> | <b>out/20</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                 |                                    |                           |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>URUBICI</b>  | Tipo de Obra:                      |                           |
| Contrato nº:                     | <b>188/2019</b> | Reforma da cobertura               |                           |
| Data da Ordem de Serviço:        | 17/01/2020      | Empresa Responsável:               | Strehl Sol. em Engenharia |
| Prazo contratual (dias):         | 120             | Prazo de execução original:        | 16/05/2020                |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 62              | Prazo de execução com prorrog.:    | 17/07/2020                |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$317.747,13   | Valor liberado do CFF:             | R\$317.747,13             |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$18.672,33    | Valor liberado de acréscimos:      | R\$18.672,33              |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$493,40       | Valor descontado (supressões):     | R\$493,40                 |
| % de aditivos de acréscimo:      | 5,88%           | % de aditivos de supressão:        | 0,16%                     |
| Valor total final da obra:       | R\$335.926,06   | Valores totais liberados:          | R\$335.926,06             |
| Valores à liberar:               | R\$0,00         | % Executado (sobre o valor final): | 100,00%                   |
| Área construída:                 | 724,98 m²       | Desenvolvimento:                   | Concluída em 17/07/2020   |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 17/07/2020.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD</b> | <b>out/20</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                 |                                               |                              |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>ITAJAÍ</b>   | Tipo de Obra:                                 |                              |
| Contrato nº:                     | <b>115/2019</b> | Fornecimento e instalação de novos elevadores |                              |
| Data da Ordem de Serviço:        | 29/07/2019      | Empresa Responsável:                          | Systec Serv. Man. Elev. Ltda |
| Prazo contratual (dias):         | 360             | Prazo de execução original:                   | 23/07/2020                   |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 0               | Prazo de execução com prorrogação:            | 23/07/2020                   |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$477.738,65   | Valor liberado do CFF:                        | R\$477.738,65                |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$0,00         | Valor liberado de acréscimos:                 | R\$0,00                      |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$43.296,68    | Valor descontado (supressões):                | R\$43.296,68                 |
| % de aditivos de acréscimo:      | 0,00%           | % de aditivos de supressão:                   | 9,06%                        |
| Valor total final da obra:       | R\$434.441,97   | Valores totais liberados:                     | R\$434.441,97                |
| Valores à liberar:               | R\$0,00         | % Executado (sobre o valor final):            | 100,00%                      |
| Área construída:                 | 7.480,84 m²     | Desenvolvimento:                              | Concluída em 23/07/2020      |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 23/07/2020.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD</b> | <b>out/20</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                   |                                                       |                          |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>ITUPORANGA</b> | Tipo de Obra:                                         |                          |
| Contrato nº:                     | <b>118/2019</b>   | Reforma para adequação do preventivo contra incêndios |                          |
| Data da Ordem de Serviço:        | 10/07/2019        | Empresa Responsável:                                  | Projepower Constr. Empr. |
| Prazo contratual (dias):         | 60                | Prazo de execução original:                           | 08/09/2019               |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 0                 | Prazo de execução com prorrog.:                       | 08/09/2019               |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$74.431,77      | Valor liberado do CFF:                                | R\$74.431,77             |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$4.335,85       | Valor liberado de acréscimos:                         | R\$4.335,85              |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00           | Valor descontado (supressões):                        | R\$0,00                  |
| % de aditivos de acréscimo:      | 5,83%             | % de aditivos de supressão:                           | 0,00%                    |
| Valor total final da obra:       | R\$78.767,62      | Valores totais liberados:                             | R\$78.767,62             |
| Valores à liberar:               | R\$0,00           | % Executado (sobre o valor final):                    | 100,00%                  |
| Área construída:                 | 809,91 m²         | Desenvolvimento:                                      | Concluída em 22/09/2020  |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 22/09/2020.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD**

**out/20**

|                                  |                 |                                    |                         |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>SEARA</b>    | Tipo de Obra:                      |                         |
| Contrato nº:                     | <b>142/2019</b> | Reforma parcial                    |                         |
| Data da Ordem de Serviço:        | 03/12/2019      | Empresa Responsável:               | Lupa Construções Ltda   |
| Prazo contratual (dias):         | 240             | Prazo de execução original:        | 30/07/2020              |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 30              | Prazo de execução com prorrogação: | 29/08/2020              |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$859.714,26   | Valor liberado do CFF:             | R\$859.714,26           |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$49.565,41    | Valor liberado de acréscimos:      | R\$49.565,41            |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$15.149,46    | Valor descontado (supressões):     | R\$15.149,46            |
| % de aditivos de acréscimo:      | 5,77%           | % de aditivos de supressão:        | 1,76%                   |
| Valor total final da obra:       | R\$894.130,21   | Valores totais liberados:          | R\$894.130,21           |
| Valores à liberar:               | R\$0,00         | % Executado (sobre o valor final): | 100,00%                 |
| Área construída:                 | 1016,84 m²      | Desenvolvimento:                   | Concluída em 29/08/2020 |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 29/08/2020.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.



|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD</b> | <b>out/20</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                   |                                                |                         |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>RIO DO SUL</b> | Tipo de Obra:                                  |                         |
| Contrato nº:                     | <b>136/2018</b>   | Retomada da construção do novo prédio do Fórum |                         |
| Data de Início da Obra:          | 08/10/2018        | Empresa Responsável:                           | Estrutura Engenharia    |
| Prazo contratual (dias):         | 660               | Prazo de execução original:                    | 29/07/2020              |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 90                | Prazo de execução com prorrogação:             | 27/10/2020              |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$18.876.331,19  | Valor liberado do CFF:                         | R\$18.876.331,19        |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$3.576.672,85   | Valor liberado de acréscimos:                  | R\$3.576.672,85         |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$3.035.722,36   | Valor descontado (supressões):                 | R\$3.035.722,36         |
| % de aditivos de acréscimo:      | 18,95%            | % de aditivos de supressão:                    | 16,08%                  |
| Valor total final da obra:       | R\$19.417.281,68  | Valores totais liberados:                      | R\$19.417.281,68        |
| Valores à liberar:               | R\$0,00           | % Executado (sobre o valor final):             | 100,00%                 |
| Área construída:                 | 10.443,73 m²      | Desenvolvimento:                               | Concluída em 27/10/2020 |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 27/10/2020.*




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA - RESCISÃO</b> | <b>out/20</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                 |                                                       |                      |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>CRICIÚMA</b> | Tipo de Obra:                                         |                      |
| Contrato nº:                     | <b>110/2019</b> | Reforma para adequação do preventivo contra incêndios |                      |
| Data da Ordem de Serviço:        | 02/07/2019      | Empresa Responsável:                                  | Viadupla Construções |
| Prazo contratual (dias):         | 120             | Prazo de execução original:                           | 30/10/2019           |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 0               | Prazo de execução com prorrogação:                    | 30/10/2019           |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$574.735,82   | Valor liberado do CFF:                                | R\$464.360,16        |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$0,00         | Valor liberado de acréscimos:                         | R\$0,00              |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00         | Valor descontado (supressões):                        | R\$0,00              |
| % de aditivos de acréscimo:      | 0,00%           | % de aditivos de supressão:                           | 0,00%                |
| Valor total final da obra:       | R\$574.735,82   | Valores totais liberados:                             | R\$464.360,16        |
| Valores à liberar:               | R\$110.375,66   | % Executado (sobre o valor final):                    | 80,80%               |
| Área construída:                 | 7.480,84 m²     | Desenvolvimento:                                      | Paralisada           |

Situação da Obra:

*Obra paralisada e em processo de rescisão, por inadimplemento da contratada.*

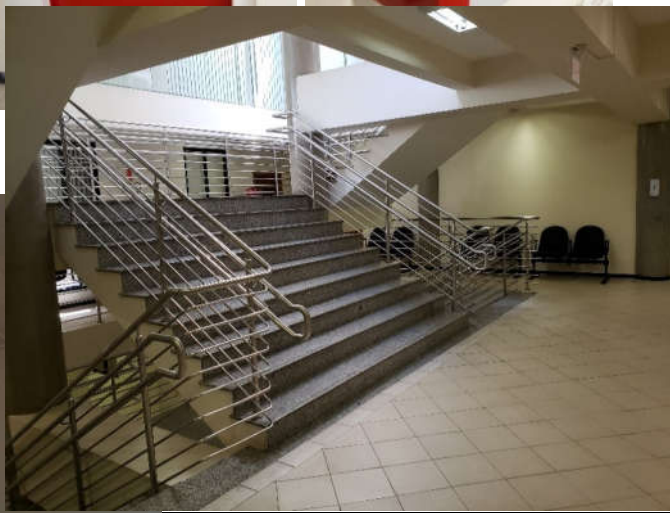

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2020</b> | <b>out/20</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

Obras iniciadas: 6  
 Obras concluídas (TRP): 7  
 Obras concluídas com TRD: 12  
 Obras paralisadas/rescindidas: 1  
 Obras em andamento: 6  
 Nº de obras no ano: 26

| Valores Liberados: |     |               |
|--------------------|-----|---------------|
| Janeiro            | R\$ | 1.842.739,69  |
| Fevereiro          | R\$ | 1.856.934,40  |
| Março              | R\$ | 3.014.588,72  |
| Abril              | R\$ | 1.110.969,05  |
| Maio               | R\$ | 1.637.180,27  |
| Junho              | R\$ | 3.075.482,00  |
| Julho              | R\$ | 2.612.371,35  |
| Agosto             | R\$ | 1.486.130,47  |
| Setembro           | R\$ | 1.412.179,82  |
| Outubro            | R\$ | 1.194.353,73  |
| Novembro           | R\$ | -             |
| Dezembro           | R\$ | -             |
| Total              | R\$ | 19.242.929,50 |



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

*André da Silva*

*Cristiane Batista Tatavitto*

*Diogo Coelho Rocha*

*Fábio Rogério Haupenthal*

*Rafael Gonzaga Lima*

*Wilson Spernau Júnior*

Engenheiros Eletricistas:

*Nilton Albieri Ferreira*

*Rodrigo André Machado*

Engenheiro Mecânico:

*Robson da Silva*

**Data de atualização:** 03/11/2020

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
