

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		jul/21	
Unidade Beneficiada:	<b>TIMBÓ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>050/2018</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	300	Prazo de execução com prorrog.:	24/03/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	R\$11.357.037,22
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$218.231,60	Valor liberado de acréscimos:	R\$148.468,53
Valor de aditivos de supressões:	R\$234.243,34	Valor descontado (supressões):	R\$234.243,34
% de aditivos de acréscimo:	1,27%	% de aditivos de supressão:	1,36%
Valor total final da obra:	R\$17.212.411,54	Valores totais liberados:	R\$11.271.262,41
Valores à liberar:	R\$5.941.149,13	% Executado (sobre o valor final):	65,48%
Área construída:	6.857,59 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>jul/21</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>CAÇADOR</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>023/2020</b>	Reforma parcial (acessibilidade, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	11/08/2020	Empresa Responsável:	Ciclo Engen. e Construção
Prazo contratual (dias):	300	Prazo de execução original:	07/06/2021
Prorrogação de prazo (dias):	120	Prazo de execução com prorrog.:	05/10/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$1.273.470,65	Valor liberado do CFF:	R\$758.510,83
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$93.433,98	Valor liberado de acréscimos:	R\$82.573,60
Valor de aditivos de supressões:	R\$31.049,74	Valor descontado (supressões):	R\$31.049,74
% de aditivos de acréscimo:	7,34%	% de aditivos de supressão:	2,44%
Valor total final da obra:	R\$1.335.854,89	Valores totais liberados:	R\$810.034,69
Valores à liberar:	R\$525.820,20	% Executado (sobre o valor final):	60,64%
Área construída:	1624,48 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		jul/21	
Unidade Beneficiada:	<b>LAGES</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>020/2020</b>	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	08/09/2020	Empresa Responsável:	Salver Const. Incorp.
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	02/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	<b>31</b>	Prazo de execução com prorrog.:	02/01/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.213.805,64	Valor liberado do CFF:	<b>R\$1.368.849,44</b>
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$3.213.805,64	Valores totais liberados:	R\$1.368.849,44
Valores à liberar:	R\$1.844.956,20	% Executado (sobre o valor final):	42,59%
Área construída:	5.162,21 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	<b>Em dia</b>

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.



<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>jul/21</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>JOINVILLE</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>006/2020</b>	Reforma parcial (cobertura, brises, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	14/10/2020	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	420	Prazo de execução original:	08/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	08/12/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$1.646.374,66	Valor liberado do CFF:	R\$1.198.612,06
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.646.374,66	Valores totais liberados:	R\$1.198.612,06
Valores à liberar:	R\$447.762,60	% Executado (sobre o valor final):	72,80%
Área construída:	9.422,75 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>jul/21</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>CRICIÚMA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>012/2021</b>	Reforma parcial (Complementação do PPCI)	
Data da Ordem de Serviço:	02/03/2021	Empresa Responsável:	Proeste
Prazo contratual (dias):	60	Prazo de execução original:	01/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	118	Prazo de execução com prorrog.:	27/08/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$169.916,73	Valor liberado do CFF:	R\$120.065,18
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$21.267,95	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	12,52%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$191.184,68	Valores totais liberados:	R\$120.065,18
Valores à liberar:	R\$71.119,50	% Executado (sobre o valor final):	62,80%
Área construída:	7.480,84 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		jul/21	
Unidade Beneficiada:	<b>TUBARÃO</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>49/2021</b>	Reforma parcial (Cercamento)	
Data da Ordem de Serviço:	24/06/2021	Empresa Responsável:	COSS ENGENHARIA
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	22/10/2021
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	22/10/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$492.559,80	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$492.559,80	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$492.559,80	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	5213,70 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.



<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>jul/21</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>HERVAL D'OESTE</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>60/2021</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	08/07/2021	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	28/06/2023
Prorrogação de prazo (dias):	<b>0</b>	Prazo de execução com prorrogação:	28/06/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$11.465.196,19	Valor liberado do CFF:	<b>R\$0,00</b>
Valor de aditivos de acréscimo:	<b>R\$0,00</b>	Valor liberado de acréscimos:	<b>R\$0,00</b>
Valor de aditivos de supressões:	<b>R\$0,00</b>	Valor descontado (supressões):	<b>R\$0,00</b>
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$11.465.196,19	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$11.465.196,19	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	3390,81 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	<b>Em dia</b>

Situação da Obra:

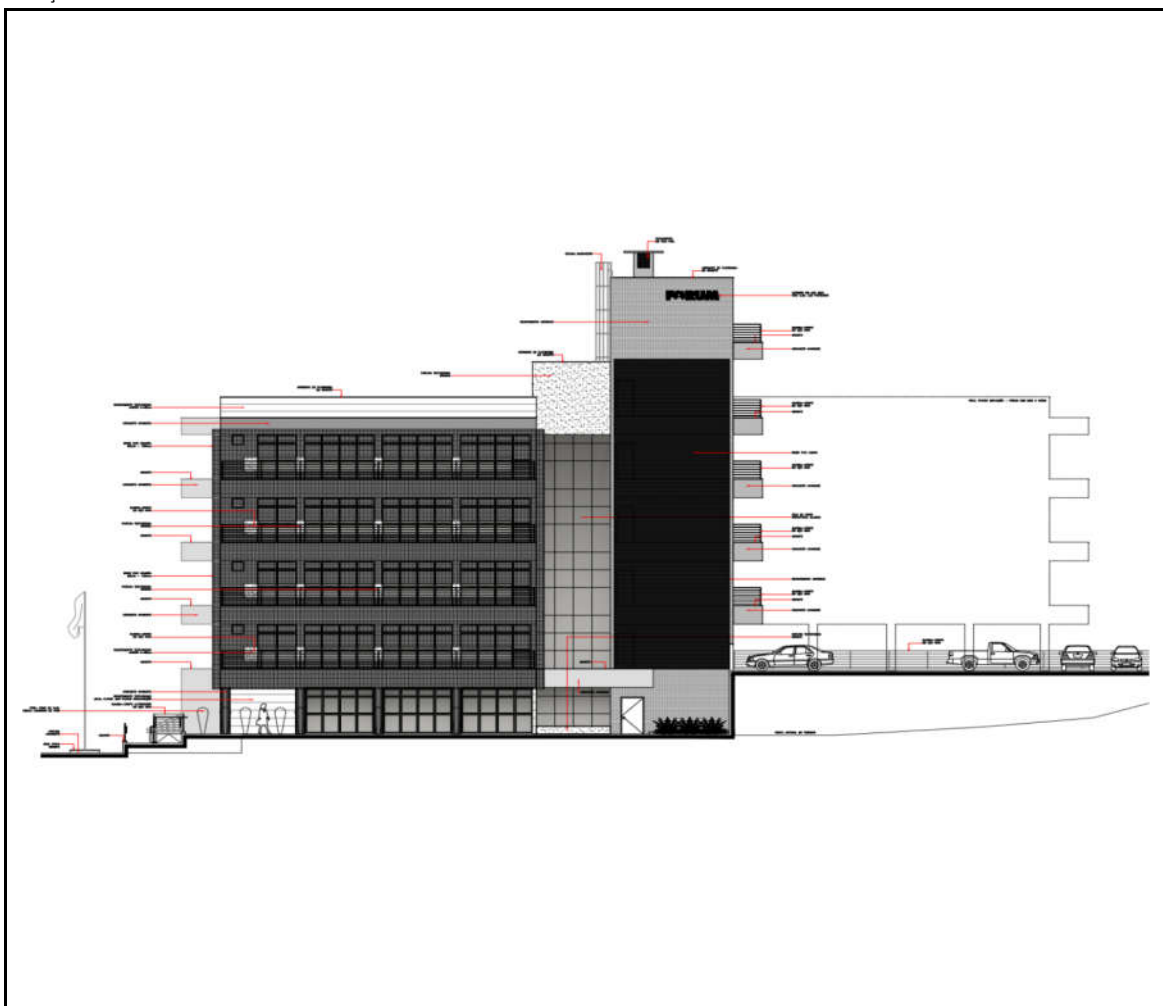

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>jul/21</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>CANOINHAS</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>105/2019</b>	Complementação do sistema de calefação	
Data da Ordem de Serviço:	05/07/2019	Empresa Responsável:	Giacomet Termo Metalúrgica
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	01/01/2020
Prorrogação de prazo (dias):	180	Prazo de execução com prorrog.:	29/06/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$721.943,23	Valor liberado do CFF:	R\$721.943,23
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$87.676,83	Valor liberado de acréscimos:	R\$87.676,83
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	12,14%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$809.620,06	Valores totais liberados:	R\$809.620,06
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	7.549,47 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 19/06/2020

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 19/06/2020 e definitivamente em 13/04/2021.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.



<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>jul/21</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>SEARA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>142/2019</b>	Reforma parcial	
Data da Ordem de Serviço:	03/12/2019	Empresa Responsável:	Lupa Construções Ltda
Prazo contratual (dias):	240	Prazo de execução original:	30/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	<b>30</b>	Prazo de execução com prorrog.:	29/08/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$859.714,26	Valor liberado do CFF:	R\$859.714,26
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$49.565,41	Valor liberado de acréscimos:	R\$49.565,41
Valor de aditivos de supressões:	R\$15.149,46	Valor descontado (supressões):	R\$15.149,46
% de aditivos de acréscimo:	5,77%	% de aditivos de supressão:	1,76%
Valor total final da obra:	R\$894.130,21	Valores totais liberados:	R\$894.130,21
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1016,84 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 29/08/2020

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 29/08/2020 e definitivamente em 13/05/2021.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD</b>	<b>jul/21</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>RIO DO SUL</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>136/2018</b>	Retomada da construção do novo prédio do Fórum	
Data de Início da Obra:	08/10/2018	Empresa Responsável:	Estrutura Engenharia
Prazo contratual (dias):	660	Prazo de execução original:	29/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	27/10/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$18.876.331,19	Valor liberado do CFF:	R\$18.876.331,19
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$3.576.672,85	Valor liberado de acréscimos:	R\$3.576.672,85
Valor de aditivos de supressões:	R\$3.035.722,36	Valor descontado (supressões):	R\$3.035.722,36
% de aditivos de acréscimo:	18,95%	% de aditivos de supressão:	16,08%
Valor total final da obra:	R\$19.417.281,68	Valores totais liberados:	R\$19.417.281,68
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	10.443,73 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 27/10/2020

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 27/10/2020.*




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD** **jul/21**

Unidade Beneficiada:	<b>SANTO AMARO DA IMPER.</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>121/2020</b>	Reforma parcial (PPCI)	
Data da Ordem de Serviço:	25/01/2021	Empresa Responsável:	Proeste
Prazo contratual (dias):	60	Prazo de execução original:	26/03/2021
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrogação:	25/04/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$89.937,63	Valor liberado do CFF:	R\$89.937,63
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$89.937,63	Valores totais liberados:	R\$89.937,63
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	761,25 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 19/04/2021

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 19/04/2021.*

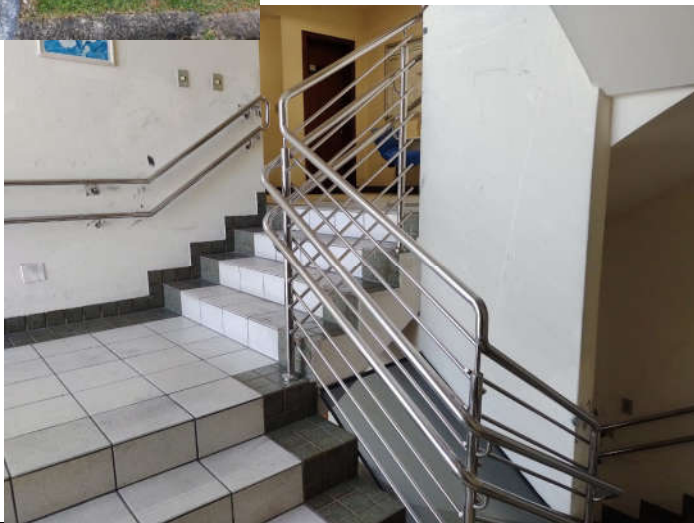

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD** **jul/21**

Unidade Beneficiada:	<b>CAMPOS NOVOS</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>101/2020</b>	Reforma parcial (PPCI)	
Data da Ordem de Serviço:	11/01/2021	Empresa Responsável:	Lupa Construções Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	11/04/2021
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	11/04/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$127.000,85	Valor liberado do CFF:	R\$127.000,85
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$127.000,85	Valores totais liberados:	R\$127.000,85
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1090,00 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 11/05/2021

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 11/05/2021.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.



**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD** **jul/21**

Unidade Beneficiada:	<b>SANTA CECÍLIA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>115/2020</b>	Reforma parcial (PPCI)	
Data da Ordem de Serviço:	27/01/2021	Empresa Responsável:	Proeste
Prazo contratual (dias):	60	Prazo de execução original:	28/03/2021
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	27/05/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$80.724,68	Valor liberado do CFF:	R\$80.724,68
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$637,02	Valor descontado (supressões):	R\$637,02
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,79%
Valor total final da obra:	R\$80.087,66	Valores totais liberados:	R\$80.087,66
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1.009,15 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 27/05/2021

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 27/05/2021.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2021</b>	<b>jul/21</b>
---	---------------

Obras iniciadas: 6  
 Obras concluídas (TRP): 4  
 Obras concluídas com TRD: 2  
 Obras paralisadas/rescindidas: 0  
 Obras em andamento: 7  
 Nº de obras no ano: 13

Valores Liberados:	
Janeiro	R\$ 483.805,31
Fevereiro	R\$ 647.266,69
Março	R\$ 724.251,69
Abril	R\$ 535.974,94
Maió	R\$ 1.190.552,29
Junho	R\$ 584.007,84
Julho	R\$ 460.931,47
Agosto	R\$ -
Setembro	R\$ -
Outubro	R\$ -
Novembro	R\$ -
Dezembro	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.626.790,23</b>



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

*André da Silva*

*Cristiane Batista Tatavitto*

*Diogo Coelho Rocha*

*Fábio Rogério Haupenthal*

*Wilson Spornau Júnior*

Engenheiros Eletricistas:

*Nilton Albieri Ferreira*

*Rodrigo André Machado*

Engenheiro Mecânico:

*Robson da Silva*

**Data de atualização: 02/08/2021**

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
