

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		abr/21	
Unidade Beneficiada:	<b>TIMBÓ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>050/2018</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	150	Prazo de execução com prorrog.:	25/10/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	R\$11.186.186,89
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$218.231,60	Valor liberado de acréscimos:	R\$141.198,78
Valor de aditivos de supressões:	R\$234.243,34	Valor descontado (supressões):	R\$234.243,34
% de aditivos de acréscimo:	1,27%	% de aditivos de supressão:	1,36%
Valor total final da obra:	R\$17.212.411,54	Valores totais liberados:	R\$11.093.142,33
Valores à liberar:	R\$6.119.269,21	% Executado (sobre o valor final):	64,45%
Área construída:	6.857,59 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.


Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		abr/21	
Unidade Beneficiada:	<b>CAÇADOR</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>023/2020</b>	Reforma parcial (acessibilidade, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	11/08/2020	Empresa Responsável:	Ciclo Engen. e Construção
Prazo contratual (dias):	300	Prazo de execução original:	07/06/2021
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrog.:	07/07/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$1.273.470,65	Valor liberado do CFF:	R\$618.653,12
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$82.573,60	Valor liberado de acréscimos:	R\$38.263,98
Valor de aditivos de supressões:	R\$31.049,74	Valor descontado (supressões):	R\$31.049,74
% de aditivos de acréscimo:	6,48%	% de aditivos de supressão:	2,44%
Valor total final da obra:	R\$1.324.994,51	Valores totais liberados:	R\$625.867,36
Valores à liberar:	R\$699.127,15	% Executado (sobre o valor final):	47,24%
Área construída:	1624,48 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:

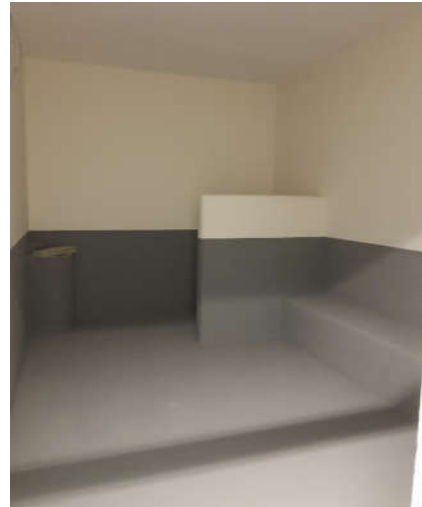

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>abr/21</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>LAGES</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>020/2020</b>	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	08/09/2020	Empresa Responsável:	Salver Const. Incorp.
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	02/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrog.:	01/01/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.213.805,64	Valor liberado do CFF:	R\$337.230,70
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$3.213.805,64	Valores totais liberados:	R\$337.230,70
Valores à liberar:	R\$2.876.574,94	% Executado (sobre o valor final):	10,49%
Área construída:	5.162,21 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>abr/21</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>JOINVILLE</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>006/2020</b>	Reforma parcial (cobertura, brises, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	14/10/2020	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	420	Prazo de execução original:	08/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	08/12/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$1.646.374,66	Valor liberado do CFF:	R\$682.945,45
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.646.374,66	Valores totais liberados:	R\$682.945,45
Valores à liberar:	R\$963.429,21	% Executado (sobre o valor final):	41,48%
Área construída:	9.422,75 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>abr/21</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>CAMPOS NOVOS</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>101/2020</b>	Reforma parcial (PPCI)	
Data da Ordem de Serviço:	11/01/2021	Empresa Responsável:	Lupa Construções Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	11/04/2021
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	11/04/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$127.000,85	Valor liberado do CFF:	R\$79.142,31
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$127.000,85	Valores totais liberados:	R\$79.142,31
Valores à liberar:	R\$47.858,54	% Executado (sobre o valor final):	62,32%
Área construída:	1090,00 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>abr/21</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>SANTA CECÍLIA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>115/2020</b>	Reforma parcial (PPCI)	
Data da Ordem de Serviço:	27/01/2021	Empresa Responsável:	Proeste
Prazo contratual (dias):	60	Prazo de execução original:	28/03/2021
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	27/05/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$80.724,68	Valor liberado do CFF:	R\$31.502,61
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$80.724,68	Valores totais liberados:	R\$31.502,61
Valores à liberar:	R\$49.222,07	% Executado (sobre o valor final):	39,02%
Área construída:	1.009,15 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>abr/21</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>CRICIÚMA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>012/2021</b>	Reforma parcial (Complementação do PPCI)	
Data da Ordem de Serviço:	02/03/2021	Empresa Responsável:	Proeste
Prazo contratual (dias):	60	Prazo de execução original:	01/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	30/06/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$169.916,73	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$169.916,73	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$169.916,73	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	7.480,84 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>abr/21</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>CANOINHAS</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>105/2019</b>	Complementação do sistema de calefação	
Data da Ordem de Serviço:	05/07/2019	Empresa Responsável:	Giacomet Termo Metalúrgica
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	01/01/2020
Prorrogação de prazo (dias):	180	Prazo de execução com prorrog.:	29/06/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$721.943,23	Valor liberado do CFF:	R\$721.943,23
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$87.676,83	Valor liberado de acréscimos:	R\$87.676,83
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	12,14%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$809.620,06	Valores totais liberados:	R\$809.620,06
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	7.549,47 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 19/06/2020

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 19/06/2020 e definitivamente em 13/04/2021.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.



**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD** **abr/21**

Unidade Beneficiada:	<b>SEARA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>142/2019</b>	Reforma parcial	
Data da Ordem de Serviço:	03/12/2019	Empresa Responsável:	Lupa Construções Ltda
Prazo contratual (dias):	240	Prazo de execução original:	30/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrog.:	29/08/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$859.714,26	Valor liberado do CFF:	R\$859.714,26
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$49.565,41	Valor liberado de acréscimos:	R\$49.565,41
Valor de aditivos de supressões:	R\$15.149,46	Valor descontado (supressões):	R\$15.149,46
% de aditivos de acréscimo:	5,77%	% de aditivos de supressão:	1,76%
Valor total final da obra:	R\$894.130,21	Valores totais liberados:	R\$894.130,21
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1016,84 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 29/08/2020

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 29/08/2020.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD</b>	<b>abr/21</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>RIO DO SUL</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>136/2018</b>	Retomada da construção do novo prédio do Fórum	
Data de Início da Obra:	08/10/2018	Empresa Responsável:	Estrutura Engenharia
Prazo contratual (dias):	660	Prazo de execução original:	29/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	27/10/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$18.876.331,19	Valor liberado do CFF:	R\$18.876.331,19
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$3.576.672,85	Valor liberado de acréscimos:	R\$3.576.672,85
Valor de aditivos de supressões:	R\$3.035.722,36	Valor descontado (supressões):	R\$3.035.722,36
% de aditivos de acréscimo:	18,95%	% de aditivos de supressão:	16,08%
Valor total final da obra:	R\$19.417.281,68	Valores totais liberados:	R\$19.417.281,68
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	10.443,73 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 27/10/2020

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 27/10/2020.*




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD** **abr/21**

Unidade Beneficiada:	<b>SANTO AMARO DA IMPER.</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>121/2020</b>	Reforma parcial (PPCI)	
Data da Ordem de Serviço:	25/01/2021	Empresa Responsável:	Proeste
Prazo contratual (dias):	60	Prazo de execução original:	26/03/2021
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrog.:	25/04/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$89.937,63	Valor liberado do CFF:	R\$89.937,63
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$89.937,63	Valores totais liberados:	R\$89.937,63
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	761,25 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 19/04/2021

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 19/04/2021.*

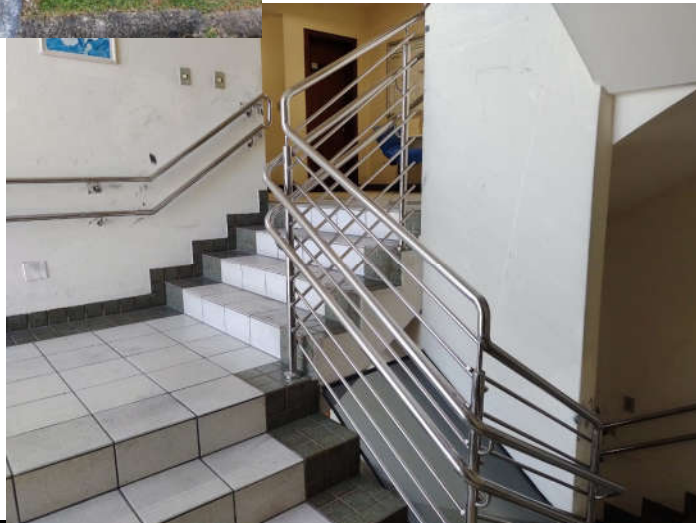

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2021</b>	<b>abr/21</b>
---	---------------

Obras iniciadas: 4  
 Obras concluídas (TRP): 3  
 Obras concluídas com TRD: 1  
 Obras paralisadas/rescindidas: 0  
 Obras em andamento: 7  
 Nº de obras no ano: 11

Valores Liberados:	
Janeiro	R\$ 483.805,31
Fevereiro	R\$ 647.266,69
Março	R\$ 724.251,69
Abril	R\$ 535.974,94
Maio	R\$ -
Junho	R\$ -
Julho	R\$ -
Agosto	R\$ -
Setembro	R\$ -
Outubro	R\$ -
Novembro	R\$ -
Dezembro	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.391.298,63</b>



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

*André da Silva*

*Cristiane Batista Tatavitto*

*Diogo Coelho Rocha*

*Fábio Rogério Haupenthal*

*Wilson Spernau Júnior*

Engenheiros Eletricistas:

*Nilton Albieri Ferreira*

*Rodrigo André Machado*

Engenheiro Mecânico:

*Robson da Silva*

**Data de atualização: 05/05/2021**

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
