

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |                  |                                    | fev/21                   |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Unidade Beneficiada:                                  | <b>TIMBÓ</b>     | Tipo de Obra:                      |                          |
| Contrato nº:                                          | <b>050/2018</b>  | Construção do novo prédio do Fórum |                          |
| Data da Ordem de Serviço:                             | 13/06/2018       | Empresa Responsável:               | Endeal Eng e Construções |
| Prazo contratual (dias):                              | 1080             | Prazo de execução original:        | 28/05/2021               |
| Prorrogação de prazo (dias):                          | 150              | Prazo de execução com prorrogação: | 25/10/2021               |
| Valor do CFF original da obra:                        | R\$17.228.423,28 | Valor liberado do CFF:             | R\$10.492.770,88         |
| Valor de aditivos de acréscimo:                       | R\$218.231,60    | Valor liberado de acréscimos:      | R\$109.186,66            |
| Valor de aditivos de supressões:                      | R\$234.243,34    | Valor descontado (supressões):     | R\$234.243,34            |
| % de aditivos de acréscimo:                           | 1,27%            | % de aditivos de supressão:        | 1,36%                    |
| Valor total final da obra:                            | R\$17.212.411,54 | Valores totais liberados:          | R\$10.367.714,20         |
| Valores à liberar:                                    | R\$6.844.697,34  | % Executado (sobre o valor final): | 60,23%                   |
| Área construída:                                      | 6.857,59 m²      | Desenvolvimento:                   | Em atraso.               |


Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |                 |                                             | fev/21                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Beneficiada:                                  | <b>CAÇADOR</b>  | Tipo de Obra:                               |                           |
| Contrato nº:                                          | <b>023/2020</b> | Reforma parcial (acessibilidade, ppqi, etc) |                           |
| Data da Ordem de Serviço:                             | 11/08/2020      | Empresa Responsável:                        | Ciclo Engen. e Construção |
| Prazo contratual (dias):                              | 300             | Prazo de execução original:                 | 07/06/2021                |
| Prorrogação de prazo (dias):                          | 30              | Prazo de execução com prorrogação:          | 07/07/2021                |
| Valor do CFF original da obra:                        | R\$1.273.470,65 | Valor liberado do CFF:                      | R\$320.692,28             |
| Valor de aditivos de acréscimo:                       | R\$46.265,48    | Valor liberado de acréscimos:               | R\$0,00                   |
| Valor de aditivos de supressões:                      | R\$31.049,74    | Valor descontado (supressões):              | R\$0,00                   |
| % de aditivos de acréscimo:                           | 3,63%           | % de aditivos de supressão:                 | 2,44%                     |
| Valor total final da obra:                            | R\$1.288.686,39 | Valores totais liberados:                   | R\$320.692,28             |
| Valores à liberar:                                    | R\$967.994,11   | % Executado (sobre o valor final):          | 24,89%                    |
| Área construída:                                      | 1624,48 m²      | Desenvolvimento:                            | Em atraso                 |

Situação da Obra:

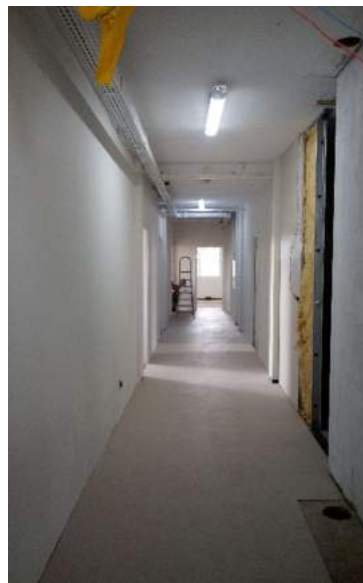

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b> | <b>fev/21</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                 |                                        |                       |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>LAGES</b>    | Tipo de Obra:                          |                       |
| Contrato nº:                     | <b>020/2020</b> | Reforma parcial (cobertura, ppci, etc) |                       |
| Data da Ordem de Serviço:        | 08/09/2020      | Empresa Responsável:                   | Salver Const. Incorp. |
| Prazo contratual (dias):         | 450             | Prazo de execução original:            | 02/12/2021            |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 0               | Prazo de execução com prorrogação:     | 02/12/2021            |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$3.213.805,64 | Valor liberado do CFF:                 | R\$131.022,12         |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$0,00         | Valor liberado de acréscimos:          | R\$0,00               |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00         | Valor descontado (supressões):         | R\$0,00               |
| % de aditivos de acréscimo:      | 0,00%           | % de aditivos de supressão:            | 0,00%                 |
| Valor total final da obra:       | R\$3.213.805,64 | Valores totais liberados:              | R\$131.022,12         |
| Valores à liberar:               | R\$3.082.783,52 | % Executado (sobre o valor final):     | 4,08%                 |
| Área construída:                 | 5.162,21 m²     | Desenvolvimento:                       | Em atraso.            |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b> | <b>fev/21</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                  |                                          |                           |
|----------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>JOINVILLE</b> | Tipo de Obra:                            |                           |
| Contrato nº:                     | <b>006/2020</b>  | Reforma parcial (cobertura, brises, etc) |                           |
| Data da Ordem de Serviço:        | 14/10/2020       | Empresa Responsável:                     | Strehl Sol. em Engenharia |
| Prazo contratual (dias):         | 420              | Prazo de execução original:              | 08/12/2021                |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 0                | Prazo de execução com prorrog.:          | 08/12/2021                |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$1.646.374,66  | Valor liberado do CFF:                   | R\$411.003,79             |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$0,00          | Valor liberado de acréscimos:            | R\$0,00                   |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00          | Valor descontado (supressões):           | R\$0,00                   |
| % de aditivos de acréscimo:      | 0,00%            | % de aditivos de supressão:              | 0,00%                     |
| Valor total final da obra:       | R\$1.646.374,66  | Valores totais liberados:                | R\$411.003,79             |
| Valores à liberar:               | R\$1.235.370,87  | % Executado (sobre o valor final):       | 24,96%                    |
| Área construída:                 | 9.422,75 m²      | Desenvolvimento:                         | Em dia.                   |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b> | <b>fev/21</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                     |                                    |                       |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>CAMPOS NOVOS</b> | Tipo de Obra:                      |                       |
| Contrato nº:                     | <b>101/2020</b>     | Reforma parcial (PPCI)             |                       |
| Data da Ordem de Serviço:        | 11/01/2021          | Empresa Responsável:               | Lupa Construções Ltda |
| Prazo contratual (dias):         | 90                  | Prazo de execução original:        | 11/04/2021            |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 0                   | Prazo de execução com prorrogação: | 11/04/2021            |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$127.000,85       | Valor liberado do CFF:             | R\$15.401,68          |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$0,00             | Valor liberado de acréscimos:      | R\$0,00               |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00             | Valor descontado (supressões):     | R\$0,00               |
| % de aditivos de acréscimo:      | 0,00%               | % de aditivos de supressão:        | 0,00%                 |
| Valor total final da obra:       | R\$127.000,85       | Valores totais liberados:          | R\$15.401,68          |
| Valores à liberar:               | R\$111.599,17       | % Executado (sobre o valor final): | 12,13%                |
| Área construída:                 | 1090,00 m²          | Desenvolvimento:                   | Em dia.               |

Situação da Obra:




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b> | <b>fev/21</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                              |                                    |              |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>SANTO AMARO DA IMPER.</b> | Tipo de Obra:                      |              |
| Contrato nº:                     | <b>121/2020</b>              | Reforma parcial (PPCI)             |              |
| Data da Ordem de Serviço:        | 25/01/2021                   | Empresa Responsável:               | Proeste      |
| Prazo contratual (dias):         | 60                           | Prazo de execução original:        | 26/03/2021   |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 0                            | Prazo de execução com prorrog.:    | 26/03/2021   |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$89.937,63                 | Valor liberado do CFF:             | R\$30.545,15 |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$0,00                      | Valor liberado de acréscimos:      | R\$0,00      |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00                      | Valor descontado (supressões):     | R\$0,00      |
| % de aditivos de acréscimo:      | 0,00%                        | % de aditivos de supressão:        | 0,00%        |
| Valor total final da obra:       | R\$89.937,63                 | Valores totais liberados:          | R\$30.545,15 |
| Valores à liberar:               | R\$59.392,48                 | % Executado (sobre o valor final): | 33,96%       |
| Área construída:                 | 761,25 m²                    | Desenvolvimento:                   | Em dia.      |

Situação da Obra:

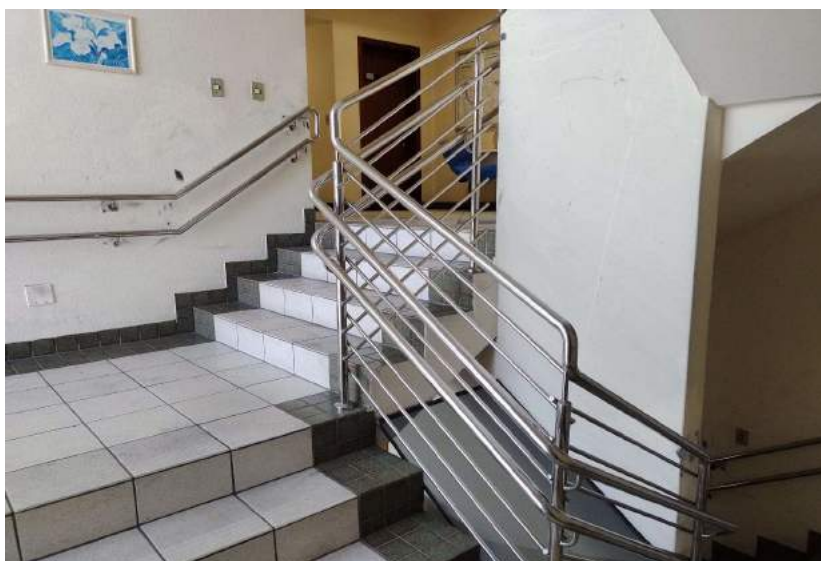

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b> | <b>fev/21</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                         |                                    |              |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>SANTA CECÍLIA</b>    | Tipo de Obra:                      |              |
| Contrato nº:                     | <b>115/2020</b>         | Reforma parcial (PPCI)             |              |
| Data da Ordem de Serviço:        | 27/01/2021              | Empresa Responsável:               | Proeste      |
| Prazo contratual (dias):         | 60                      | Prazo de execução original:        | 28/03/2021   |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 0                       | Prazo de execução com prorrogação: | 28/03/2021   |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$80.724,68            | Valor liberado do CFF:             | R\$31.502,61 |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$0,00                 | Valor liberado de acréscimos:      | R\$0,00      |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00                 | Valor descontado (supressões):     | R\$0,00      |
| % de aditivos de acréscimo:      | 0,00%                   | % de aditivos de supressão:        | 0,00%        |
| Valor total final da obra:       | R\$80.724,68            | Valores totais liberados:          | R\$31.502,61 |
| Valores à liberar:               | R\$49.222,07            | % Executado (sobre o valor final): | 39,02%       |
| Área construída:                 | 1.009,15 m <sup>2</sup> | Desenvolvimento:                   | Em dia.      |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD</b> | <b>fev/21</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                  |                  |                                        |                            |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>CANOINHAS</b> | Tipo de Obra:                          |                            |
| Contrato nº:                     | <b>105/2019</b>  | Complementação do sistema de calefação |                            |
| Data da Ordem de Serviço:        | 05/07/2019       | Empresa Responsável:                   | Giacomet Termo Metalúrgica |
| Prazo contratual (dias):         | 180              | Prazo de execução original:            | 01/01/2020                 |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 180              | Prazo de execução com prorrogação:     | 29/06/2020                 |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$721.943,23    | Valor liberado do CFF:                 | R\$721.943,23              |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$87.676,83     | Valor liberado de acréscimos:          | R\$87.676,83               |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00          | Valor descontado (supressões):         | R\$0,00                    |
| % de aditivos de acréscimo:      | 12,14%           | % de aditivos de supressão:            | 0,00%                      |
| Valor total final da obra:       | R\$809.620,06    | Valores totais liberados:              | R\$809.620,06              |
| Valores à liberar:               | R\$0,00          | % Executado (sobre o valor final):     | 100,00%                    |
| Área construída:                 | 7.549,47 m²      | Desenvolvimento:                       | Concluída em 19/06/2020    |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 19/06/2020*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD**

**fev/21**

|                                  |                 |                                    |                         |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>SEARA</b>    | Tipo de Obra:                      |                         |
| Contrato nº:                     | <b>142/2019</b> | Reforma parcial                    |                         |
| Data da Ordem de Serviço:        | 03/12/2019      | Empresa Responsável:               | Lupa Construções Ltda   |
| Prazo contratual (dias):         | 240             | Prazo de execução original:        | 30/07/2020              |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 30              | Prazo de execução com prorrogação: | 29/08/2020              |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$859.714,26   | Valor liberado do CFF:             | R\$859.714,26           |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$49.565,41    | Valor liberado de acréscimos:      | R\$49.565,41            |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$15.149,46    | Valor descontado (supressões):     | R\$15.149,46            |
| % de aditivos de acréscimo:      | 5,77%           | % de aditivos de supressão:        | 1,76%                   |
| Valor total final da obra:       | R\$894.130,21   | Valores totais liberados:          | R\$894.130,21           |
| Valores à liberar:               | R\$0,00         | % Executado (sobre o valor final): | 100,00%                 |
| Área construída:                 | 1016,84 m²      | Desenvolvimento:                   | Concluída em 29/08/2020 |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 29/08/2020.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD**

**fev/21**

|                                  |                   |                                                |                         |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Unidade Beneficiada:             | <b>RIO DO SUL</b> | Tipo de Obra:                                  |                         |
| Contrato nº:                     | <b>136/2018</b>   | Retomada da construção do novo prédio do Fórum |                         |
| Data de Início da Obra:          | 08/10/2018        | Empresa Responsável:                           | Estrutura Engenharia    |
| Prazo contratual (dias):         | 660               | Prazo de execução original:                    | 29/07/2020              |
| Prorrogação de prazo (dias):     | 90                | Prazo de execução com prorrogação:             | 27/10/2020              |
| Valor do CFF original da obra:   | R\$18.876.331,19  | Valor liberado do CFF:                         | R\$18.876.331,19        |
| Valor de aditivos de acréscimo:  | R\$3.576.672,85   | Valor liberado de acréscimos:                  | R\$3.576.672,85         |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$3.035.722,36   | Valor descontado (supressões):                 | R\$3.035.722,36         |
| % de aditivos de acréscimo:      | 18,95%            | % de aditivos de supressão:                    | 16,08%                  |
| Valor total final da obra:       | R\$19.417.281,68  | Valores totais liberados:                      | R\$19.417.281,68        |
| Valores à liberar:               | R\$0,00           | % Executado (sobre o valor final):             | 100,00%                 |
| Área construída:                 | 10.443,73 m²      | Desenvolvimento:                               | Concluída em 27/10/2020 |

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 27/10/2020.*



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2021**
**fev/21**

Obras iniciadas: 3  
Obras concluídas (TRP): 3  
Obras concluídas com TRD: 0  
Obras paralisadas/rescindidas: 0  
Obras em andamento: 7  
Nº de obras no ano: 10

| Valores Liberados: |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| Janeiro            | R\$ | 483.805,31   |
| Fevereiro          | R\$ | 631.864,61   |
| Março              | R\$ | -            |
| Abril              | R\$ | -            |
| Maio               | R\$ | -            |
| Junho              | R\$ | -            |
| Julho              | R\$ | -            |
| Agosto             | R\$ | -            |
| Setembro           | R\$ | -            |
| Outubro            | R\$ | -            |
| Novembro           | R\$ | -            |
| Dezembro           | R\$ | -            |
| Total              | R\$ | 1.115.669,92 |



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

*André da Silva*

*Cristiane Batista Tatavitto*

*Diogo Coelho Rocha*

*Fábio Rogério Haupenthal*

*Wilson Spornau Júnior*

Engenheiros Eletricistas:

*Nilton Albieri Ferreira*

*Rodrigo André Machado*

Engenheiro Mecânico:

*Robson da Silva*

**Data de atualização: 04/03/2021**

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
