

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | | jan/21 | |
|---|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Unidade Beneficiada: | TIMBÓ | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 050/2018 | Construção do novo prédio do Fórum | |
| Data da Ordem de Serviço: | 13/06/2018 | Empresa Responsável: | Endeal Eng e Construções |
| Prazo contratual (dias): | 1080 | Prazo de execução original: | 28/05/2021 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 150 | Prazo de execução com prorrog.: | 25/10/2021 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$17.228.423,28 | Valor liberado do CFF: | R\$10.090.528,13 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$218.231,60 | Valor liberado de acréscimos: | R\$109.186,66 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$234.243,34 | Valor descontado (supressões): | R\$234.243,34 |
| % de aditivos de acréscimo: | 1,27% | % de aditivos de supressão: | 1,36% |
| Valor total final da obra: | R\$17.212.411,54 | Valores totais liberados: | R\$9.965.471,45 |
| Valores à liberar: | R\$7.246.940,09 | % Executado (sobre o valor final): | 57,90% |
| Área construída: | 6.857,59 m ² | Desenvolvimento: | Em atraso. |

Situação da Obra:




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | jan/21 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|---|---------------------------|
| Unidade Beneficiada: | CAÇADOR | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 023/2020 | Reforma parcial (acessibilidade, ppqi, etc) | |
| Data da Ordem de Serviço: | 11/08/2020 | Empresa Responsável: | Ciclo Engen. e Construção |
| Prazo contratual (dias): | 300 | Prazo de execução original: | 07/06/2021 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 30 | Prazo de execução com prorrog.: | 07/07/2021 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$1.273.470,65 | Valor liberado do CFF: | R\$320.692,28 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$1.273.470,65 | Valores totais liberados: | R\$320.692,28 |
| Valores à liberar: | R\$952.778,37 | % Executado (sobre o valor final): | 25,18% |
| Área construída: | 1624,48 m ² | Desenvolvimento: | Em atraso |

Situação da Obra:

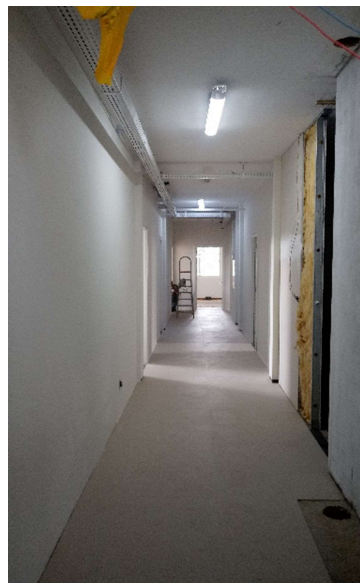

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | jan/21 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| Unidade Beneficiada: | LAGES | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 020/2020 | Reforma parcial (cobertura, ppci, etc) | |
| Data da Ordem de Serviço: | 08/09/2020 | Empresa Responsável: | Salver Const. Incorp. |
| Prazo contratual (dias): | 450 | Prazo de execução original: | 02/12/2021 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 02/12/2021 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$3.213.805,64 | | R\$131.022,12 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$3.213.805,64 | Valores totais liberados: | R\$131.022,12 |
| Valores à liberar: | R\$3.082.783,52 | % Executado (sobre o valor final): | 4,08% |
| Área construída: | 5.162,21 m ² | Desenvolvimento: | Em dia. |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | jan/21 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| Unidade Beneficiada: | JOINVILLE | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 006/2020 | Reforma parcial (cobertura, brises, etc) | |
| Data da Ordem de Serviço: | 14/10/2020 | Empresa Responsável: | Strehl Sol. em Engenharia |
| Prazo contratual (dias): | 420 | Prazo de execução original: | 08/12/2021 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 08/12/2021 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$1.646.374,66 | | R\$279.445,06 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$1.646.374,66 | Valores totais liberados: | R\$279.445,06 |
| Valores à liberar: | R\$1.366.929,60 | % Executado (sobre o valor final): | 16,97% |
| Área construída: | 9.422,75 m ² | Desenvolvimento: | Em dia. |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | jan/21 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Unidade Beneficiada: | CAMPOS NOVOS | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 101/2020 | Reforma parcial (PPCI) | |
| Data da Ordem de Serviço: | 11/01/2021 | Empresa Responsável: | Lupa Construções Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 90 | Prazo de execução original: | 11/04/2021 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 11/04/2021 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$127.000,85 | | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$127.000,85 | Valores totais liberados: | R\$0,00 |
| Valores à liberar: | R\$127.000,85 | % Executado (sobre o valor final): | 0,00% |
| Área construída: | 1090,00 m ² | Desenvolvimento: | Em dia. |

Situação da Obra:




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | jan/21 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|
| Unidade Beneficiada: | SANTO AMARO DA IMPER. | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 121/2020 | Reforma parcial (PPCI) | |
| Data da Ordem de Serviço: | 25/01/2021 | Empresa Responsável: | Proeste |
| Prazo contratual (dias): | 60 | Prazo de execução original: | 26/03/2021 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 26/03/2021 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$89.937,63 | | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$89.937,63 | Valores totais liberados: | R\$0,00 |
| Valores à liberar: | R\$89.937,63 | % Executado (sobre o valor final): | 0,00% |
| Área construída: | 761,25 m ² | Desenvolvimento: | Em dia. |

Situação da Obra:

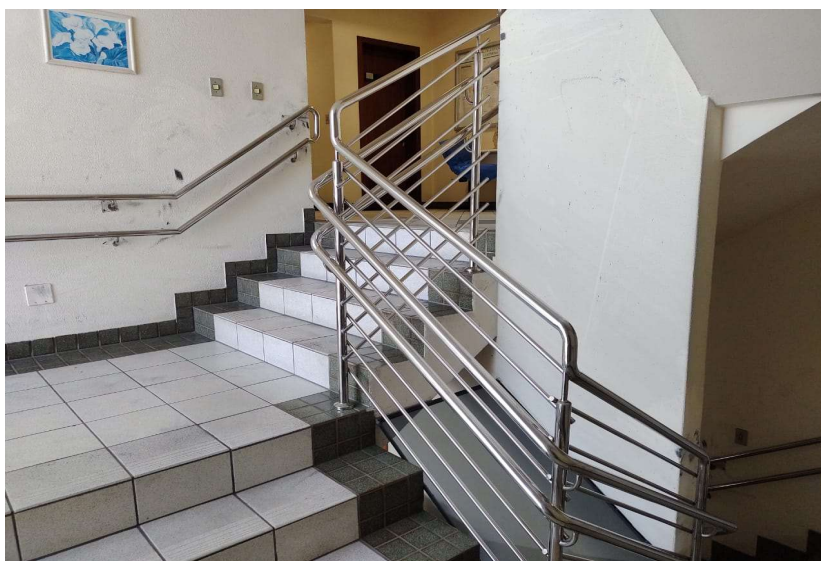

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | jan/21 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|
| Unidade Beneficiada: | SANTA CECÍLIA | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 115/2020 | Reforma parcial (PPCI) | |
| Data da Ordem de Serviço: | 27/01/2021 | Empresa Responsável: | Proeste |
| Prazo contratual (dias): | 60 | Prazo de execução original: | 28/03/2021 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 28/03/2021 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$80.724,68 | | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$80.724,68 | Valores totais liberados: | R\$0,00 |
| Valores à liberar: | R\$80.724,68 | % Executado (sobre o valor final): | 0,00% |
| Área construída: | 1.009,15 m ² | Desenvolvimento: | Em dia. |

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD | jan/21 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|
| Unidade Beneficiada: | CANOINHAS | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 105/2019 | Complementação do sistema de calefação | |
| Data da Ordem de Serviço: | 05/07/2019 | Empresa Responsável: | Giacomet Termo Metalúrgica |
| Prazo contratual (dias): | 180 | Prazo de execução original: | 01/01/2020 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 180 | Prazo de execução com prorrog.: | 29/06/2020 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$721.943,23 | Valor liberado do CFF: | R\$721.943,23 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$87.676,83 | Valor liberado de acréscimos: | R\$87.676,83 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 12,14% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$809.620,06 | Valores totais liberados: | R\$809.620,06 |
| Valores à liberar: | R\$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |
| Área construída: | 7.549,47 m ² | Desenvolvimento: | Concluída em 19/06/2020 |

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 19/06/2020



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD **jan/21**

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Unidade Beneficiada: | SEARA | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 142/2019 | Reforma parcial | |
| Data da Ordem de Serviço: | 03/12/2019 | Empresa Responsável: | Lupa Construções Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 240 | Prazo de execução original: | 30/07/2020 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 30 | Prazo de execução com prorrog.: | 29/08/2020 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$859.714,26 | Valor liberado do CFF: | R\$859.714,26 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$49.565,41 | Valor liberado de acréscimos: | R\$49.565,41 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$15.149,46 | Valor descontado (supressões): | R\$15.149,46 |
| % de aditivos de acréscimo: | 5,77% | % de aditivos de supressão: | 1,76% |
| Valor total final da obra: | R\$894.130,21 | Valores totais liberados: | R\$894.130,21 |
| Valores à liberar: | R\$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |
| Área construída: | 1016,84 m ² | Desenvolvimento: | Concluída em 29/08/2020 |

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 29/08/2020.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD | jan/21 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| Unidade Beneficiada: | RIO DO SUL | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 136/2018 | Retomada da construção do novo prédio do Fórum | |
| Data de Início da Obra: | 08/10/2018 | Empresa Responsável: | Estrutura Engenharia |
| Prazo contratual (dias): | 660 | Prazo de execução original: | 29/07/2020 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 90 | Prazo de execução com prorrog.: | 27/10/2020 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$18.876.331,19 | Valor liberado do CFF: | R\$18.876.331,19 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$3.576.672,85 | Valor liberado de acréscimos: | R\$3.576.672,85 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$3.035.722,36 | Valor descontado (supressões): | R\$3.035.722,36 |
| % de aditivos de acréscimo: | 18,95% | % de aditivos de supressão: | 16,08% |
| Valor total final da obra: | R\$19.417.281,68 | Valores totais liberados: | R\$19.417.281,68 |
| Valores à liberar: | R\$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |
| Área construída: | 10.443,73 m ² | Desenvolvimento: | Concluída em 27/10/2020 |

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 27/10/2020.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2021
jan/21

| | |
|--------------------------------|----|
| Obras iniciadas: | 3 |
| Obras concluídas (TRP): | 3 |
| Obras concluídas com TRD: | 0 |
| Obras paralisadas/rescindidas: | 0 |
| Obras em andamento: | 7 |
| Nº de obras no ano: | 10 |

| Valores Liberados: | |
|--------------------|-----------------------|
| Janeiro | R\$ 368.878,87 |
| Fevereiro | R\$ - |
| Março | R\$ - |
| Abril | R\$ - |
| Maio | R\$ - |
| Junho | R\$ - |
| Julho | R\$ - |
| Agosto | R\$ - |
| Setembro | R\$ - |
| Outubro | R\$ - |
| Novembro | R\$ - |
| Dezembro | R\$ - |
| Total | R\$ 368.878,87 |



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Cristiane Batista Tatavitto

Diogo Coelho Rocha

Fábio Rogério Haupenthal

Wilson Spernau Júnior

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Data de atualização: 05/02/2021

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
