

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		nov/21	
Unidade Beneficiada:	TIMBÓ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2018	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	300	Prazo de execução com prorrog.:	24/03/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	R\$11.559.590,11
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$994.126,07	Valor liberado de acréscimos:	R\$148.468,53
Valor de aditivos de supressões:	R\$870.695,51	Valor descontado (supressões):	R\$234.243,34
% de aditivos de acréscimo:	5,77%	% de aditivos de supressão:	5,05%
Valor total final da obra:	R\$17.351.853,84	Valores totais liberados:	R\$11.473.815,30
Valores à liberar:	R\$5.878.038,54	% Executado (sobre o valor final):	66,12%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	nov/21
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CAÇADOR	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	023/2020	Reforma parcial (acessibilidade, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	11/08/2020	Empresa Responsável:	Ciclo Engen. e Construção
Prazo contratual (dias):	300	Prazo de execução original:	07/06/2021
Prorrogação de prazo (dias):	242	Prazo de execução com prorrog.:	04/02/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$1.273.470,65	Valor liberado do CFF:	R\$1.237.253,08
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$273.780,87	Valor liberado de acréscimos:	R\$162.720,81
Valor de aditivos de supressões:	R\$145.477,40	Valor descontado (supressões):	R\$145.477,80
% de aditivos de acréscimo:	21,50%	% de aditivos de supressão:	11,42%
Valor total final da obra:	R\$1.401.774,12	Valores totais liberados:	R\$1.254.496,09
Valores à liberar:	R\$147.278,03	% Executado (sobre o valor final):	89,49%
Área construída:	1624,48 m ²	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	nov/21
--	---------------

Unidade Beneficiada:	LAGES	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	020/2020	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	08/09/2020	Empresa Responsável:	Salver Const. Incorp.
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	02/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	121	Prazo de execução com prorrog.:	02/04/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.213.805,64	Valor liberado do CFF:	R\$1.997.270,33
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$119.680,63	Valor liberado de acréscimos:	R\$119.680,63
Valor de aditivos de supressões:	R\$108.163,96	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	3,72%	% de aditivos de supressão:	3,37%
Valor total final da obra:	R\$3.225.322,31	Valores totais liberados:	R\$2.116.950,96
Valores à liberar:	R\$1.108.371,35	% Executado (sobre o valor final):	65,64%
Área construída:	5.162,21 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	nov/21
--	---------------

Unidade Beneficiada:	JOINVILLE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	006/2020	Reforma parcial (cobertura, brises, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	14/10/2020	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	420	Prazo de execução original:	08/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	06/02/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$1.646.374,66	Valor liberado do CFF:	R\$1.525.466,87
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$148.087,43	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	8,99%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.794.462,09	Valores totais liberados:	R\$1.525.466,87
Valores à liberar:	R\$268.995,22	% Executado (sobre o valor final):	85,01%
Área construída:	9.422,75 m ²	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		nov/21	
Unidade Beneficiada:	TUBARÃO	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	49/2021	Reforma parcial (Cercamento)	
Data da Ordem de Serviço:	24/06/2021	Empresa Responsável:	COSS ENGENHARIA
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	22/10/2021
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	21/12/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$492.559,80	Valor liberado do CFF:	R\$154.052,47
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.261,17	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,46%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$494.820,97	Valores totais liberados:	R\$154.052,47
Valores à liberar:	R\$340.768,50	% Executado (sobre o valor final):	31,13%
Área construída:	5213,70 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	nov/21
--	---------------

Unidade Beneficiada:	HERVAL D'OESTE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	60/2021	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	08/07/2021	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	28/06/2023
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	28/06/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$11.465.196,19	Valor liberado do CFF:	R\$625.816,16
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$19.837,15	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,17%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$11.485.033,34	Valores totais liberados:	R\$625.816,16
Valores à liberar:	R\$10.859.217,18	% Executado (sobre o valor final):	5,45%
Área construída:	3390,81 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	nov/21
--	---------------

Unidade Beneficiada:	B. CAMBORIÚ - Vara Família	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	23/2021	Reforma Global	
Data da Ordem de Serviço:	03/09/2021	Empresa Responsável:	3D Const. Comércio Ltda
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	29/08/2022
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	29/08/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$4.874.210,15	Valor liberado do CFF:	R\$242.819,22
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$4.874.210,15	Valores totais liberados:	R\$242.819,22
Valores à liberar:	R\$4.631.390,93	% Executado (sobre o valor final):	4,98%
Área construída:	1.702,64 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	nov/21
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CAMPO ERÊ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	77/2021	Reforma Global e Ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	23/09/2021	Empresa Responsável:	Constr. Faon Ltda
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	17/12/2022
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	17/12/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.218.369,52	Valor liberado do CFF:	R\$57.696,13
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$3.218.369,52	Valores totais liberados:	R\$57.696,13
Valores à liberar:	R\$3.160.673,39	% Executado (sobre o valor final):	1,79%
Área construída:	763,42 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	nov/21
---	---------------

Unidade Beneficiada:	CANOINHAS	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	105/2019	Complementação do sistema de calefação	
Data da Ordem de Serviço:	05/07/2019	Empresa Responsável:	Giacomet Termo Metalúrgica
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	01/01/2020
Prorrogação de prazo (dias):	180	Prazo de execução com prorrog.:	29/06/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$721.943,23	Valor liberado do CFF:	R\$721.943,23
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$87.676,83	Valor liberado de acréscimos:	R\$87.676,83
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	12,14%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$809.620,06	Valores totais liberados:	R\$809.620,06
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	7.549,47 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 19/06/2020

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 19/06/2020 e definitivamente em 13/04/2021.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	nov/21
---	---------------

Unidade Beneficiada:	SEARA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	142/2019	Reforma parcial	
Data da Ordem de Serviço:	03/12/2019	Empresa Responsável:	Lupa Construções Ltda
Prazo contratual (dias):	240	Prazo de execução original:	30/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrog.:	29/08/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$859.714,26	Valor liberado do CFF:	R\$859.714,26
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$49.565,41	Valor liberado de acréscimos:	R\$49.565,41
Valor de aditivos de supressões:	R\$15.149,46	Valor descontado (supressões):	R\$15.149,46
% de aditivos de acréscimo:	5,77%	% de aditivos de supressão:	1,76%
Valor total final da obra:	R\$894.130,21	Valores totais liberados:	R\$894.130,21
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1016,84 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 29/08/2020

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 29/08/2020 e definitivamente em 13/05/2021.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	nov/21
--	---------------

Unidade Beneficiada:	RIO DO SUL	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	136/2018	Retomada da construção do novo prédio do Fórum	
Data de Início da Obra:	08/10/2018	Empresa Responsável:	Estrutura Engenharia
Prazo contratual (dias):	660	Prazo de execução original:	29/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	27/10/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$18.876.331,19	Valor liberado do CFF:	R\$18.876.331,19
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$3.576.672,85	Valor liberado de acréscimos:	R\$3.576.672,85
Valor de aditivos de supressões:	R\$3.035.722,36	Valor descontado (supressões):	R\$3.035.722,36
% de aditivos de acréscimo:	18,95%	% de aditivos de supressão:	16,08%
Valor total final da obra:	R\$19.417.281,68	Valores totais liberados:	R\$19.417.281,68
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	10.443,73 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 27/10/2020

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 27/10/2020.




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	nov/21
---	---------------

Unidade Beneficiada:	SANTO AMARO DA IMPER.	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	121/2020	Reforma parcial (PPCI)	
Data da Ordem de Serviço:	25/01/2021	Empresa Responsável:	Proeste
Prazo contratual (dias):	60	Prazo de execução original:	26/03/2021
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrog.:	25/04/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$89.937,63	Valor liberado do CFF:	R\$89.937,63
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$89.937,63	Valores totais liberados:	R\$89.937,63
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	761,25 m²	Desenvolvimento:	Concluída em 19/04/2021

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 19/04/2021 e definitivamente a 16/08/2021.

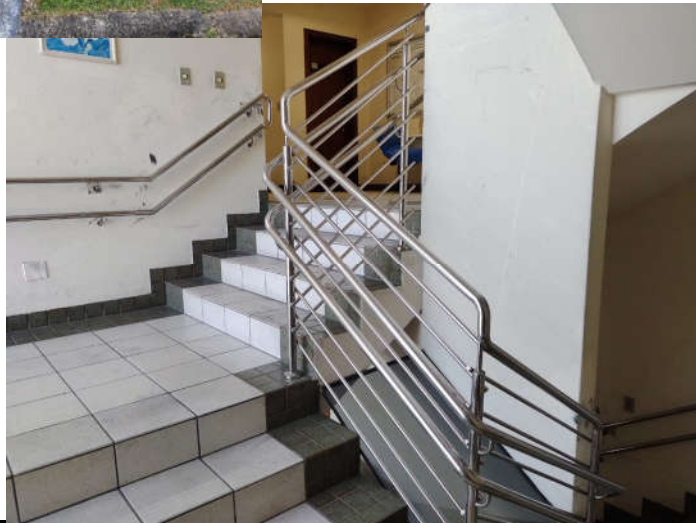

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	nov/21
---	---------------

Unidade Beneficiada:	CAMPOS NOVOS	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	101/2020	Reforma parcial (PPCI)	
Data da Ordem de Serviço:	11/01/2021	Empresa Responsável:	Lupa Construções Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	11/04/2021
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	11/04/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$127.000,85	Valor liberado do CFF:	R\$127.000,85
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$127.000,85	Valores totais liberados:	R\$127.000,85
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1090,00 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 11/05/2021

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 11/05/2021 e definitivamente em 10/08/2021.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	nov/21
---	---------------

Unidade Beneficiada:	SANTA CECÍLIA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	115/2020	Reforma parcial (PPCI)	
Data da Ordem de Serviço:	27/01/2021	Empresa Responsável:	Proeste
Prazo contratual (dias):	60	Prazo de execução original:	28/03/2021
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	27/05/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$80.724,68	Valor liberado do CFF:	R\$80.724,68
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$637,02	Valor descontado (supressões):	R\$637,02
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,79%
Valor total final da obra:	R\$80.087,66	Valores totais liberados:	R\$80.087,66
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1.009,15 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 27/05/2021

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 27/05/2021 e definitivamente em 05/11/2021.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	nov/21
---	---------------

Unidade Beneficiada:	CRICIÚMA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	012/2021	Reforma parcial (Complementação do PPCI)	
Data da Ordem de Serviço:	02/03/2021	Empresa Responsável:	Proeste
Prazo contratual (dias):	60	Prazo de execução original:	01/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	118	Prazo de execução com prorrog.:	27/08/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$169.916,73	Valor liberado do CFF:	R\$169.916,73
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$21.267,95	Valor liberado de acréscimos:	R\$21.267,95
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	12,52%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$191.184,68	Valores totais liberados:	R\$191.184,68
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	7.480,84 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 16/08/2021

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 16/08/2021 e definitivamente em 16/11/2021.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2021	nov/21
---	---------------

Obras iniciadas: 8
 Obras concluídas (TRP): 1
 Obras concluídas com TRD: 6
 Obras paralisadas/rescindidas: 0
 Obras em andamento: 8
 Nº de obras no ano: 15

Valores Liberados:		
Janeiro	R\$	483.805,31
Fevereiro	R\$	647.266,69
Março	R\$	724.251,69
Abril	R\$	535.974,94
Maiο	R\$	1.190.552,29
Junho	R\$	584.007,84
Julho	R\$	583.202,40
Agosto	R\$	1.093.652,48
Setembro	R\$	179.338,89
Outubro	R\$	834.455,77
Novembro	R\$	641.229,85
Dezembro	R\$	-
Total	R\$	7.497.738,15



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Cristiane Batista Tatavitto

Diogo Coelho Rocha

Fábio Rogério Haupenthal

Wilson Spornau Júnior

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Data de atualização: 03/12/2021

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
