

**RELATÓRIO DE OBRAS PARALISADAS - TJSC - DEA - DFISC - 2025**


**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDA**

**dez/25**

Unidade Beneficiada:	<b>JOINVILLE</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>051/2023</b>	Reforma parcial (glazing)	
Data da Ordem de Serviço:	30/11/2023	Empresa Responsável:	Belart Tec. Em Constr. Ltda
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	29/03/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	29/03/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$240.412,50	Valor liberado do CFF:	R\$166.389,55
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$240.412,50	Valores totais liberados:	R\$166.389,55
Valores à liberar:	R\$74.022,95	% Executado (sobre o valor final):	69,21%
Área construída:	9.422,75 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Rescindida

Situação da Obra:

*Obra paralisada em 25/06/2025 para fins de procedimento de rescisão por culpa da contratada.  
 Contrato rescindido em 19/11/2025*

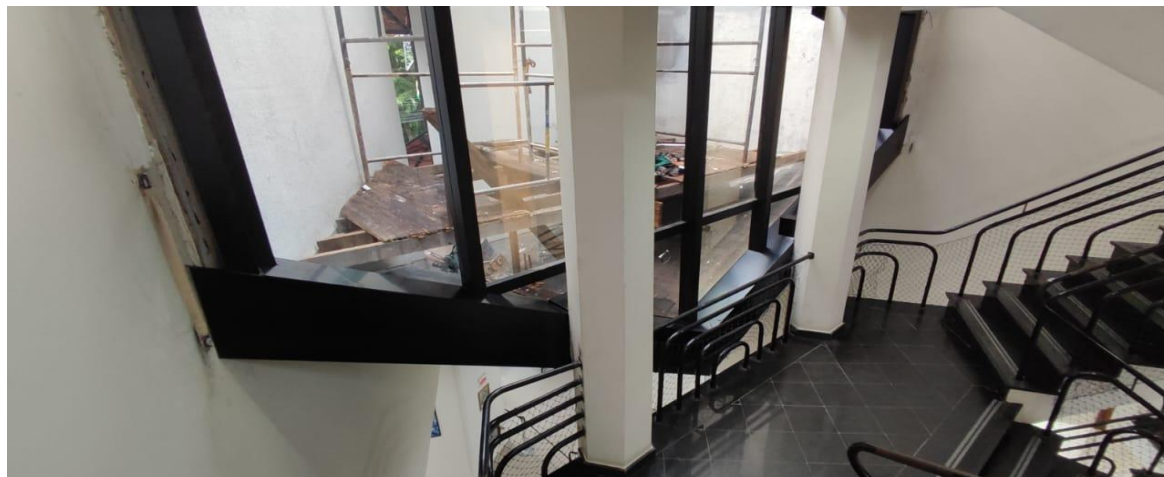

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbnCl6iYxMDEiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvljoiRyI6sImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjlp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA			dez/25	
Unidade Beneficiada:	<b>CAMPO ERÊ</b>	Tipo de Obra:		
Contrato nº:	<b>77/2021</b>	Reforma Global e Ampliação		
Data da Ordem de Serviço:	23/09/2021	Empresa Responsável:	Constr. Faon Ltda	
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	17/12/2022	
Prorrogação de prazo (dias):	<b>811</b>	Prazo de execução com prorrog.:	07/03/2025	
Valor do CFF original da obra:	R\$3.218.369,52	Valor liberado do CFF:	<b>R\$2.665.748,16</b>	
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$258.685,40	Valor liberado de acréscimos:	<b>R\$219.459,91</b>	
Valor de aditivos de supressões:	R\$116.345,03	Valor descontado (supressões):	<b>R\$116.345,03</b>	
% de aditivos de acréscimo:	8,04%	% de aditivos de supressão:	3,62%	
Valor total final da obra:	R\$3.360.709,89	Valores totais liberados:	<b>R\$2.768.863,04</b>	
Valores à liberar:	R\$591.846,85	% Executado (sobre o valor final):	82,39%	
Área construída:	763,42 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	<b>Em atraso</b>	

Situação da Obra:

*Paralisada em fase de rescisão por culpa exclusiva da contratada*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW11cm9Ub3RhbnCl6lU3NzMiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoiriYlsmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiixiwiidGlwbyl6IiAilCJtb3N0cmFMaW5rljp0cnVlfQ==>



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
de Santa Catarina

Diretoria-Geral Administrativa  
Diretoria de Engenharia e Arquitetura

---

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
