

**RELATÓRIO DE OBRAS PARALISADAS - TJSC - DEA - DFISC - 2026**

**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA**

**fev/26**

Unidade Beneficiada:	<b>SOMBRIO</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>022/2025</b>	Construção do novo Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	14/05/2025	Empresa Responsável:	CS Magon Construtora Ltda
Prazo contratual (dias):	1020	Prazo de execução original:	28/02/2028
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	28/02/2028
Valor do CFF original da obra:	R\$20.390.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$357.169,87
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$20.390.000,00	Valores totais liberados:	R\$357.169,87
Valores à liberar:	R\$20.032.830,13	% Executado (sobre o valor final):	1,75%
Área construída:	4.098,66 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Paralisada

Situação da Obra:

*Obra paralisada para revisão do projeto de fundação.*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc5liwiZXhlcmlcmNpY2lviMjAyNSlsm51bWVyb16ljiYln0=>


Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA</b>	<b>fev/26</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>SANTA ROSA DO SUL</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>017/2025</b>	Reforma global e ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	15/08/2025	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi Ltda
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	05/08/2027
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	05/08/2027
Valor do CFF original da obra:	R\$12.849.994,02	Valor liberado do CFF:	R\$1.112.230,03
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$12.849.994,02	Valores totais liberados:	R\$1.112.230,03
Valores à liberar:	R\$11.737.763,99	% Executado (sobre o valor final):	8,66%
Área construída:	2.200,77 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Paralisada

Situação da Obra:

*Obra paralisada para revisão do projeto de fundação.*

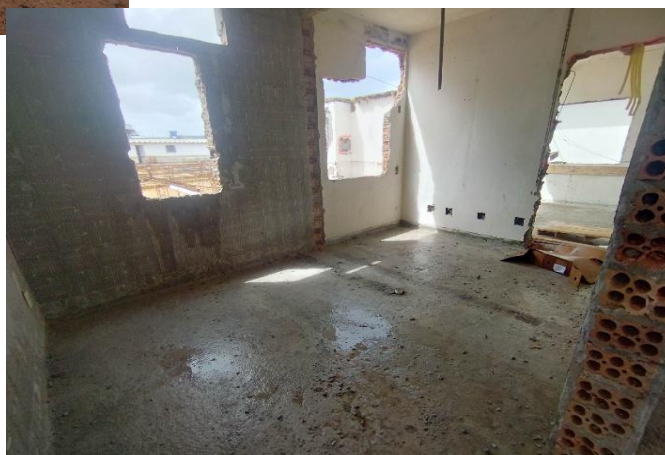

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjEzNzQsImV4ZXJjaWNpbYl6IjIwMjUjUilCJudW1lcm8iOjE3fQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.
