


RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA	mai/26
--	---------------

Unidade Beneficiada:	SANTA ROSA DO SUL	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	017/2025	Reforma global e ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	15/08/2025	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi Ltda
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	05/08/2027
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	05/08/2027
Valor do CFF original da obra:	R\$12.849.994,02	Valor liberado do CFF:	R\$1.112.230,03
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$12.849.994,02	Valores totais liberados:	R\$1.112.230,03
Valores à liberar:	R\$11.737.763,99	% Executado (sobre o valor final):	8,66%
Área construída:	2.200,77 m ²	Desenvolvimento:	Paralisada

Situação da Obra:

Obra paralisada para revisão do projeto de fundação. Previsão de retomada em 60 dias.

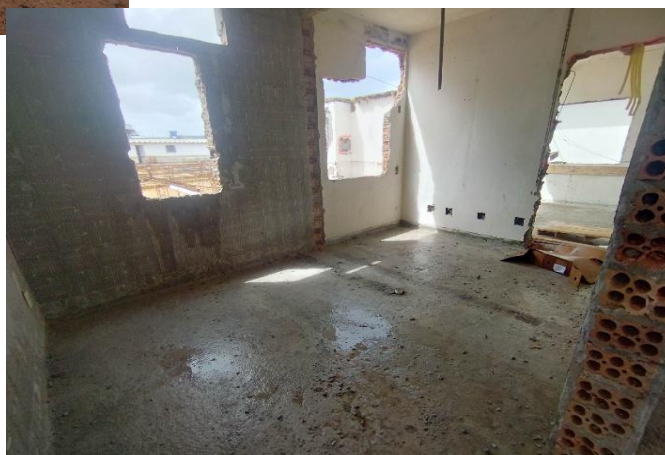

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjEzNzQsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjU1IjEudW1lcm8iOjE3fQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA	mai/26
--	---------------

Unidade Beneficiada:	ABELARDO LUZ	Tipo de Obra:	
----------------------	---------------------	---------------	--

Contrato nº:	027/2023	Construção do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	27/07/2023	Empresa Responsável:	Paleta Eng. e Constr. Ltda.
Prazo contratual (dias):	780	Prazo de execução original:	14/09/2025
Prorrogação de prazo (dias):	230	Prazo de execução com prorrog.:	02/05/2026
Valor do CFF original da obra:	R\$17.365.186,51	Valor liberado do CFF:	R\$7.334.520,75
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.207.195,34	Valor liberado de acréscimos:	R\$1.200.871,35
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.426.121,59	Valor descontado (supressões):	R\$1.426.121,59
% de aditivos de acréscimo:	6,95%	% de aditivos de supressão:	8,21%
Valor total final da obra:	R\$17.146.260,26	Valores totais liberados:	R\$7.109.270,51
Valores à liberar:	R\$10.036.989,75	% Executado (sobre o valor final):	41,46%
Área construída:	3023,05 m ²	Desenvolvimento:	Paralisada em 23/04/2026

Situação da Obra:

Obra paralisada em 23/04/2026 para rescisão contratual por inadimplementos da contratada. Estimativa de retomada após nova licitação em 180 dias. Rescisão tratada no SEI 0044931-49.2023.8.24.0710.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGliY2FvIjoiriYlslmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxiwidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIj0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

Data de atualização: 17/06/2026
