

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		mar/22	
Unidade Beneficiada:	TIMBÓ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2018	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	330	Prazo de execução com prorrog.:	23/04/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	R\$11.793.417,42
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.159.896,70	Valor liberado de acréscimos:	R\$396.289,21
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.093.820,22	Valor descontado (supressões):	R\$234.243,34
% de aditivos de acréscimo:	6,73%	% de aditivos de supressão:	6,35%
Valor total final da obra:	R\$17.294.499,76	Valores totais liberados:	R\$11.955.463,29
Valores à liberar:	R\$5.339.036,47	% Executado (sobre o valor final):	69,13%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		mar/22	
Unidade Beneficiada:	CAÇADOR	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	023/2020	Reforma parcial (acessibilidade, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	11/08/2020	Empresa Responsável:	Ciclo Engen. e Construção
Prazo contratual (dias):	300	Prazo de execução original:	07/06/2021
Prorrogação de prazo (dias):	242	Prazo de execução com prorrog.:	04/02/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$1.273.470,65	Valor liberado do CFF:	R\$1.237.253,08
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$273.780,87	Valor liberado de acréscimos:	R\$272.819,91
Valor de aditivos de supressões:	R\$146.616,38	Valor descontado (supressões):	R\$145.477,80
% de aditivos de acréscimo:	21,50%	% de aditivos de supressão:	11,51%
Valor total final da obra:	R\$1.400.635,14	Valores totais liberados:	R\$1.364.595,19
Valores à liberar:	R\$36.039,95	% Executado (sobre o valor final):	97,43%
Área construída:	1624,48 m ²	Desenvolvimento:	Aguardando vist. CBMSC

Situação da Obra:

Aguardando Vistoria do CBMSC



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/22
--	---------------

Unidade Beneficiada:	LAGES	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	020/2020	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	08/09/2020	Empresa Responsável:	Salver Const. Incorp.
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	02/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	183	Prazo de execução com prorrog.:	03/06/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.213.805,64	Valor liberado do CFF:	R\$2.213.588,84
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$617.835,89	Valor liberado de acréscimos:	R\$119.680,63
Valor de aditivos de supressões:	R\$113.109,60	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	19,22%	% de aditivos de supressão:	3,52%
Valor total final da obra:	R\$3.718.531,93	Valores totais liberados:	R\$2.333.269,47
Valores à liberar:	R\$1.385.262,46	% Executado (sobre o valor final):	62,75%
Área construída:	5.162,21 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/22
--	---------------

Unidade Beneficiada:	JOINVILLE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	006/2020	Reforma parcial (cobertura, brises, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	14/10/2020	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	420	Prazo de execução original:	08/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	180	Prazo de execução com prorrog.:	06/06/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$1.646.374,66	Valor liberado do CFF:	R\$1.525.466,87
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$148.087,43	Valor liberado de acréscimos:	R\$148.087,43
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	8,99%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.794.462,09	Valores totais liberados:	R\$1.673.554,30
Valores à liberar:	R\$120.907,79	% Executado (sobre o valor final):	93,26%
Área construída:	9.422,75 m ²	Desenvolvimento:	Em dia.

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			mar/22
Unidade Beneficiada:	TUBARÃO	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	49/2021	Reforma parcial (Cercamento)	
Data da Ordem de Serviço:	24/06/2021	Empresa Responsável:	COSS ENGENHARIA
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	22/10/2021
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	21/12/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$492.559,80	Valor liberado do CFF:	R\$154.052,47
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.261,17	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,46%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$494.820,97	Valores totais liberados:	R\$154.052,47
Valores à liberar:	R\$340.768,50	% Executado (sobre o valor final):	31,13%
Área construída:	5213,70 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:




Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/22
--	---------------

Unidade Beneficiada:	HERVAL D'OESTE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	60/2021	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	08/07/2021	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	28/06/2023
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	28/06/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$11.465.196,19	Valor liberado do CFF:	R\$1.328.292,48
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$82.242,87	Valor liberado de acréscimos:	R\$82.242,87
Valor de aditivos de supressões:	R\$642,80	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,72%	% de aditivos de supressão:	0,01%
Valor total final da obra:	R\$11.546.796,26	Valores totais liberados:	R\$1.410.535,35
Valores à liberar:	R\$10.136.260,91	% Executado (sobre o valor final):	12,22%
Área construída:	3390,81 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:

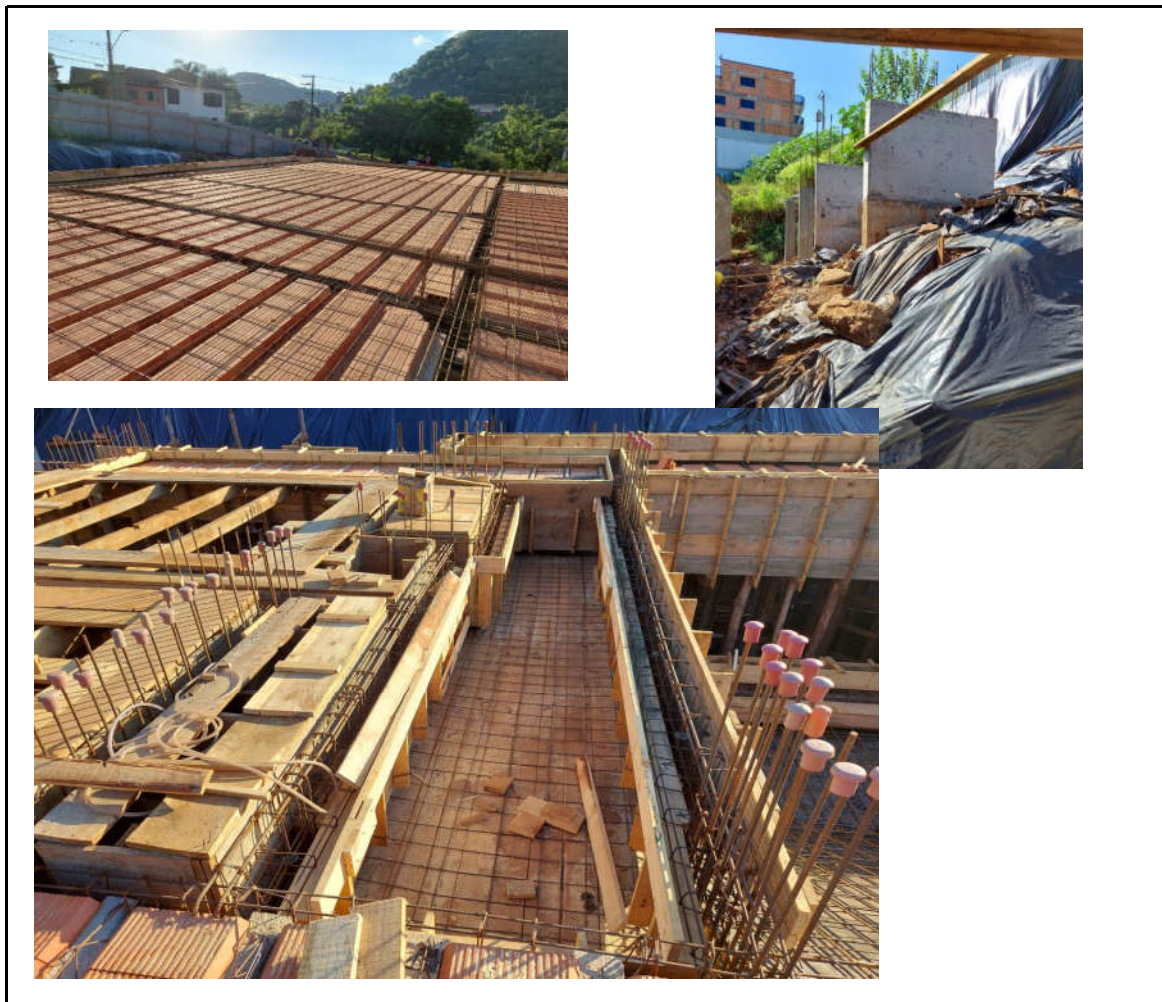

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/22
--	---------------

Unidade Beneficiada:	B. CAMBORIÚ - Vara Família	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	23/2021	Reforma Global	
Data da Ordem de Serviço:	03/09/2021	Empresa Responsável:	3D Const. Comércio Ltda
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	29/08/2022
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	29/08/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$4.874.210,15	Valor liberado do CFF:	R\$503.750,74
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$4.874.210,15	Valores totais liberados:	R\$503.750,74
Valores à liberar:	R\$4.370.459,41	% Executado (sobre o valor final):	10,34%
Área construída:	1.702,64 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/22
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CAMPO ERÊ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	77/2021	Reforma Global e Ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	23/09/2021	Empresa Responsável:	Constr. Faon Ltda
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	17/12/2022
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	17/12/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.218.369,52	Valor liberado do CFF:	R\$143.120,14
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$3.218.369,52	Valores totais liberados:	R\$143.120,14
Valores à liberar:	R\$3.075.249,38	% Executado (sobre o valor final):	4,45%
Área construída:	763,42 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso


Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		mar/22	
Unidade Beneficiada:	IMBITUBA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	002/2022	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	04/03/2022	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi
Prazo contratual (dias):	960	Prazo de execução original:	19/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	19/10/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$19.801.812,59	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$19.801.812,59	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$19.801.812,59	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	6.495,02 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:

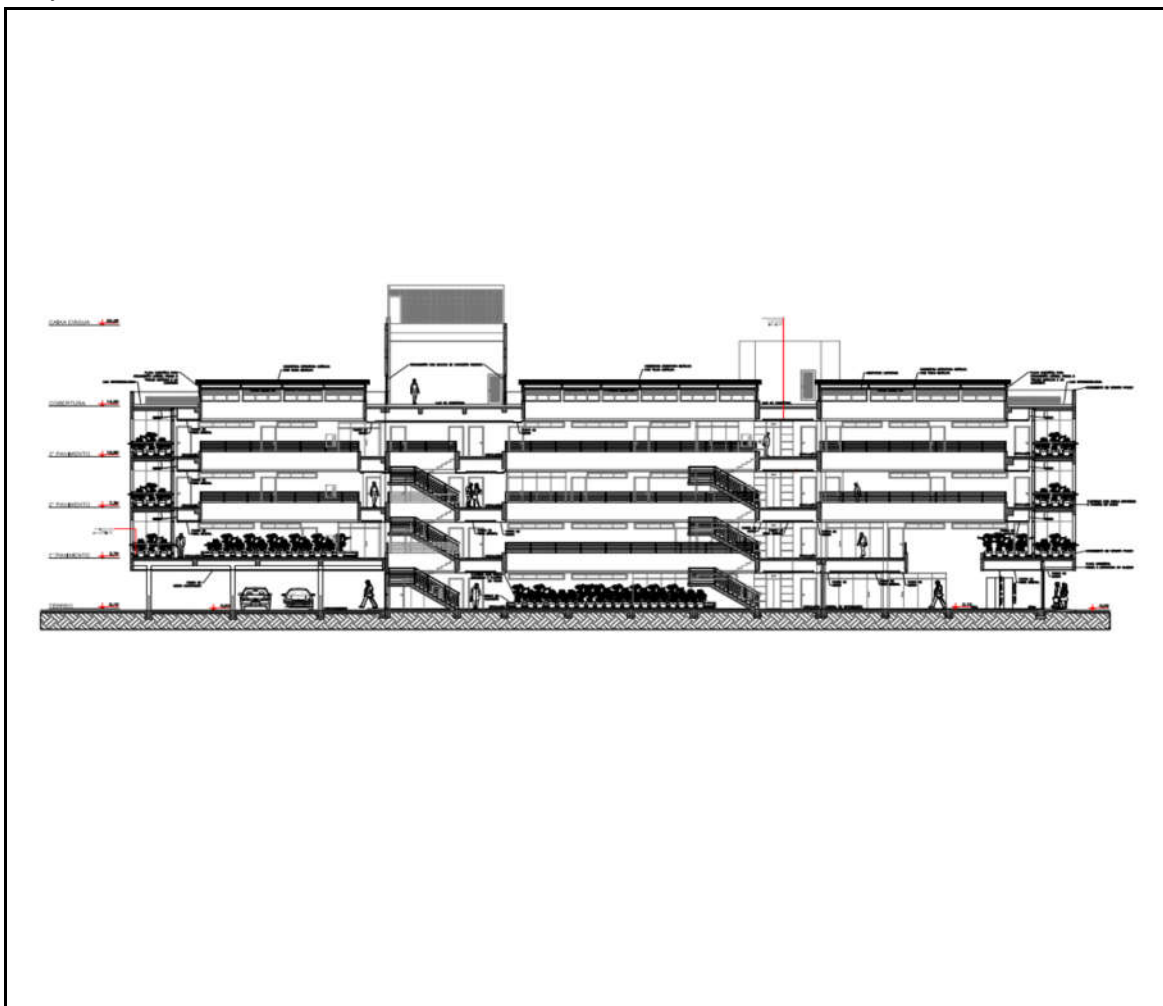

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/22
--	---------------

Unidade Beneficiada:	MONDAÍ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	005/2022	Reforma Parcial	
Data da Ordem de Serviço:	17/03/2022	Empresa Responsável:	Construtora Bem Te Vi
Prazo contratual (dias):	300	Prazo de execução original:	11/01/2023
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	11/01/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$2.930.871,34	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$2.930.871,34	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$2.930.871,34	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	989,66 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	mar/22
--	---------------

Unidade Beneficiada:	RIO DO SUL	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	136/2018	Retomada da construção do novo prédio do Fórum	
Data de Início da Obra:	08/10/2018	Empresa Responsável:	Estrutura Engenharia
Prazo contratual (dias):	660	Prazo de execução original:	29/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	27/10/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$18.876.331,19	Valor liberado do CFF:	R\$18.876.331,19
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$3.576.672,85	Valor liberado de acréscimos:	R\$3.576.672,85
Valor de aditivos de supressões:	R\$3.035.722,36	Valor descontado (supressões):	R\$3.035.722,36
% de aditivos de acréscimo:	18,95%	% de aditivos de supressão:	16,08%
Valor total final da obra:	R\$19.417.281,68	Valores totais liberados:	R\$19.417.281,68
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	10.443,73 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 27/10/2020

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 27/10/2020.



Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2021	mar/22
---	---------------

Obras iniciadas: 2
 Obras concluídas (TRP): 1
 Obras concluídas com TRD: 0
 Obras paralisadas/rescindidas: 0
 Obras em andamento: 10
 Nº de obras no ano: 11

Valores Liberados:	
Janeiro	R\$ 70.506,19
Fevereiro	R\$ 988.727,93
Março	R\$ 226.519,69
Abril	
Maio	
Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Total	R\$ 1.285.753,81



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Cristiane Batista Tatavitto

Diogo Coelho Rocha

Fábio Rogério Haupenthal

Wilson Spornau Júnior

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Data de atualização: 01/04/2022

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.
